

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027											
							3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027					
							Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz			
1	Einreichung Bauantrag	0%		109 t	Don 27.02.25	Mon 16.06.25												
2	Vergabe Rathaus Hörstel	0%		1765 t	Mon 09.12.19	Mon 08.03.27												
377	Bauausführung Rathaus Hörstel	0%		381 t	Mon 25.08.25	Mit 17.03.27												
378	Baustelleneinrichtung	0%		5 t	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25												
379	Erd- und Rohbauarbeiten	0%		146 t	Mon 01.09.25	Don 09.04.26												
380	Untergeschoss	0%		86 t	Mon 01.09.25	Die 13.01.26												
417	Erdgeschoss	0%		52 t	Don 11.12.25	Mon 09.03.26												
436	1. Obergeschoss	0%		29 t	Die 10.02.26	Mon 23.03.26												
451	2. Obergeschoss	0%		29 t	Mit 25.02.26	Mit 08.04.26												
466	3. Obergeschoss	0%		19 t	Don 12.03.26	Don 09.04.26												
475	Blitzschutzarbeiten	0%		1 t	Mon 06.10.25	Mon 06.10.25												
476	Räumen Baustelleneinrichtung	0%		8 t	Don 02.04.26	Mit 15.04.26												
477	Betonkosmetik	0%		15 t	Mit 24.02.27	Die 16.03.27												
478	Holzrahmenbau	0%		197 t	Fre 10.04.26	Fre 29.01.27												
479	Baustelleneinrichtung/ Vorbereitende Maßnahmen	0%		5 t	Fre 10.04.26	Don 16.04.26												
480	Erdgeschoss	0%		24 t	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26												
481	Stahlbau	0%		10 t	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26												
482	Holzrahmenbauwände stellen	0%		10 t	Mon 27.04.26	Mon 11.05.26												
483	BSP-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%		2 t	Die 12.05.26	Mit 13.05.26												
484	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%		2 t	Fre 15.05.26	Mon 18.05.26												
485	1. Obergeschoss	0%		11 t	Die 19.05.26	Mit 03.06.26												
486	Stahlbau	0%		7 t	Die 19.05.26	Don 28.05.26												
487	Holzrahmenbauwände stellen	0%		7 t	Die 19.05.26	Don 28.05.26												
488	BSP-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%		2 t	Fre 29.05.26	Mon 01.06.26												
489	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%		2 t	Die 02.06.26	Mit 03.06.26												
490	2. Obergeschoss	0%		12 t	Fre 05.06.26	Mon 22.06.26												
491	Stahlbau	0%		7 t	Fre 05.06.26	Mon 15.06.26												
492	Holzrahmenbauwände stellen	0%		7 t	Fre 05.06.26	Mon 15.06.26												
493	BSP-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%		3 t	Die 16.06.26	Don 18.06.26												
494	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%		2 t	Fre 19.06.26	Mon 22.06.26												
495	Blitzschutzarbeiten	0%		2 t	Fre 19.06.26	Mon 22.06.26												
496	3. Obergeschoss	0%		4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26												
497	Außenwände herstellen (Technikeinhausung)	0%		4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26												
498	Sparrendach herstellen	0%		4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26												
499	Dacharbeiten	0%		145 t	Mon 29.06.26	Fre 29.01.27												
500	Bereitstellen Einbauteile (Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug)	0%		0 t	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26												
501	Dampfsperre montieren	0%		3 t	Mon 29.06.26	Mit 01.07.26												
502	Montage Einbauteile / Aufsatzkränze etc.	0%		1 t	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26												
503	Blitzschutz Attika	0%		2 t	Don 02.07.26	Fre 03.07.26												
504	Dämmung Dach montieren	0%		4 t	Don 02.07.26	Die 07.07.26												
505	2-lagige Dachabdichtung herstellen	0%		4 t	Mit 08.07.26	Mon 13.07.26												
506	Attikageländer montieren	0%		2 t	Die 14.07.26	Mit 15.07.26												
507	Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren	0%		2 t	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26												
508	Unterkonstruktion PV-Anlage	0%		1 t	Die 14.07.26	Die 14.07.26												
509	Dachterrasse herstellen	0%		5 t	Die 28.07.26	Mon 03.08.26												
510	Substrat/ Kies aufbringen	0%		3 t	Mit 15.07.26	Fre 17.07.26												
511	Attika Verkleidung herstellen	0%		2 t	Don 16.07.26	Fre 17.07.26												
512	Montage PV Module	0%		7 t	Die 04.08.26	Mit 12.08.26												
513	Glasgeländer montieren	0%		2 t	Don 28.01.27	Fre 29.01.27												

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mit 29.07.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	i	Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027													
								3. Qtl, 2026	Jul			Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz
514		Gebäudehülle wetterfest	0%	0 t	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26		22.07													
515		Ausbauarbeiten	0%	188 t	Fre 12.06.26	Die 16.03.27															
516		Aufstellen Baustromverteiler - alle Etagen	0%	5 t	Don 16.07.26	Mit 22.07.26		16.07													
517		Grobinstallation Elektro in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26															
518		Grobinstallation Heizung in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26															
519		Grobinstallation Sanitär in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26															
520		Verschluss Holzrahmenbauwände	0%	6 t	Mit 24.06.26	Mit 01.07.26															
521		Ausbauarbeiten BT-A	0%	113 t	Mit 12.08.26	Fre 29.01.27															
522		Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t	Mit 12.08.26	Die 18.08.26															
523		Grobmontage ELT (Funktionserhalt unter Schüttung)	0%	3 t	Mit 19.08.26	Fre 21.08.26															
524		Schüttung herstellen	0%	5 t	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26															
525		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26															
526		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26															
527		Grobinstallation Heizung	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26															
528		Grobinstallation Lüftung	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26															
529		Grobinstallation Sanitär	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26															
530		Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26															
531		Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraum	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26															
532		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26															
533		Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t	Don 01.10.26	Mon 12.10.26															
534		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Fre 09.10.26	Don 15.10.26															
535		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Fre 16.10.26	Die 20.10.26															
536		Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26															
537		Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26															
538		Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26															
539		Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26															
540		Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26															
541		Gipskartonwände schließen	0%	8 t	Fre 23.10.26	Die 03.11.26															
542		Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t	Die 03.11.26	Mit 04.11.26															
543		Trockenbau Decken	0%	10 t	Don 05.11.26	Mit 18.11.26															
544		Fliesenarbeiten	0%	7 t	Don 19.11.26	Fre 27.11.26															
545		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 25.11.26	Die 01.12.26															
546		Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%	5 t	Mit 02.12.26	Die 08.12.26															
547		Bodenbelag Teppich/Lino	0%	8 t	Mit 09.12.26	Fre 18.12.26															
548		Innentüren	0%	7 t	Fre 18.12.26	Mon 11.01.27															
549		Mobile Trennwand	0%	7 t	Mon 04.01.27	Die 12.01.27															
550		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 12.01.27	Fre 15.01.27															
551		Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%	2 t	Mon 18.01.27	Die 19.01.27															
552		Feininstallation Sanitär	0%	3 t	Mon 18.01.27	Mit 20.01.27															
553		Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuch	0%	5 t	Don 14.01.27	Mit 20.01.27															
554		Feininstallation Heizung	0%	3 t	Don 14.01.27	Mon 18.01.27															
555		Feininstallation MSR	0%	3 t	Don 14.01.27	Mon 18.01.27															
556		Montage Systemtrennwände	0%	3 t	Don 14.01.27	Mon 18.01.27															
557		Deckensegel montieren	0%	5 t	Don 14.01.27	Mit 20.01.27															
558		Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%	1 t	Don 21.01.27	Don 21.01.27															
559		Tischlerarbeiten	0%	5 t	Fre 22.01.27	Don 28.01.27															
560		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27															
561		Ausbauarbeiten BT-B	0%	113 t	Mit 19.08.26	Fre 05.02.27															
562		Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t	Mit 19.08.26	Die 25.08.26															
563		Grobmontage ELT (Funktionserhalt unter Schüttung)	0%	3 t	Mit 26.08.26	Fre 28.08.26															
564		Schüttung herstellen	0%	5 t	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26															

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel
Datum: Mit 29.07.26

Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027											
							3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz
565	Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26					07.09								
566	Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26					21.09								
567	Grobinstallation Heizung	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
568	Grobinstallation Lüftung	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
569	Grobinstallation Sanitär	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
570	Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
571	Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraur	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
572	Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26					05.10								
573	Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t	Don 08.10.26	Mon 19.10.26					08.10								
574	Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Fre 16.10.26	Don 22.10.26					16.10								
575	Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Fre 23.10.26	Die 27.10.26					23.10								
576	Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 28.10.26	Fre 30.10.26					28.10								
577	Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 28.10.26	Fre 30.10.26					28.10								
578	Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26					02.11								
579	Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26					02.11								
580	Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26					02.11								
581	Gipskartonwände schließen	0%	8 t	Fre 30.10.26	Die 10.11.26					30.10								
582	Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t	Die 10.11.26	Mit 11.11.26					10.11								
583	Trockenbau Decken	0%	10 t	Don 12.11.26	Mit 25.11.26					12.11								
584	Fliesenarbeiten	0%	7 t	Don 26.11.26	Fre 04.12.26													
585	Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 02.12.26	Die 08.12.26													
586	Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%	5 t	Mit 09.12.26	Die 15.12.26													
587	Bodenbelag Teppich/Lino	0%	8 t	Mit 16.12.26	Fre 08.01.27													
588	Innentüren	0%	7 t	Fre 08.01.27	Mon 18.01.27													
589	Mobile Trennwand	0%	7 t	Mon 11.01.27	Die 19.01.27													
590	Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 19.01.27	Fre 22.01.27													
591	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%	2 t	Mon 25.01.27	Die 26.01.27													
592	Feininstallation Sanitär	0%	3 t	Mon 25.01.27	Mit 27.01.27													
593	Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuch	0%	5 t	Don 21.01.27	Mit 27.01.27													
594	Feininstallation Heizung	0%	3 t	Don 21.01.27	Mon 25.01.27													
595	Feininstallation MSR	0%	3 t	Don 21.01.27	Mon 25.01.27													
596	Montage Systemtrennwände	0%	3 t	Don 21.01.27	Mon 25.01.27													
597	Deckensegel montieren	0%	5 t	Don 21.01.27	Mit 27.01.27													
598	Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%	1 t	Don 28.01.27	Don 28.01.27													
599	Tischlerarbeiten	0%	5 t	Fre 29.01.27	Don 04.02.27													
600	Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27													
601	Ausbauarbeiten BT-C	0%	113 t	Mit 26.08.26	Fre 12.02.27													
602	Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t	Mit 26.08.26	Die 01.09.26					26.08								
603	Grobmontage ELT (Funktionserhalt unter Schüttung)	0%	3 t	Mit 02.09.26	Fre 04.09.26					02.09								
604	Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montiere	0%	2 t	Don 03.09.26	Fre 04.09.26					03.09								
605	Schüttung herstellen	0%	5 t	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26					07.09								
606	Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26					14.09								
607	Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26					28.09								
608	Grobinstallation Heizung	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26					05.10								
609	Grobinstallation Lüftung	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26					05.10								
610	Grobinstallation Sanitär	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26					05.10								
611	Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26					05.10								
612	Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraur	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26					05.10								
613	Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Mon 12.10.26	Mit 14.10.26					12.10								
614	Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t	Don 15.10.26	Mon 26.10.26					15.10								
615	Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Fre 23.10.26	Don 29.10.26					23.10								

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mit 29.07.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.		Vorgangsname	% eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027																	
							3. Qtl, 2026				4. Qtl, 2026				1. Qtl, 2027									
							Jul	Aug			Sep	Okt			Nov	Dez			Jan	Feb			Mrz	
616		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Fre 30.10.26	Die 03.11.26									30.10									
617		Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 04.11.26	Fre 06.11.26									04.11									
618		Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 04.11.26	Fre 06.11.26									04.11									
619		Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26									09.11									
620		Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26									09.11									
621		Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26									09.11									
622		Gipskartonwände schließen	0%	8 t	Fre 06.11.26	Die 17.11.26									06.11									
623		Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t	Die 17.11.26	Mit 18.11.26									17.11									
624		Trockenbau Decken	0%	10 t	Don 19.11.26	Mit 02.12.26									19.11									
625		Fliesenarbeiten	0%	7 t	Don 03.12.26	Fre 11.12.26										03.12								
626		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 09.12.26	Die 15.12.26										09.12								
627		Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%	5 t	Mit 16.12.26	Die 05.01.27										16.12								
628		Bodenbelag Teppich/Lino	0%	8 t	Mit 06.01.27	Fre 15.01.27											06.01							
629		Innentüren	0%	7 t	Fre 15.01.27	Mon 25.01.27											15.01							
630		Mobile Trennwand	0%	7 t	Mon 18.01.27	Die 26.01.27											18.01							
631		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t	Die 26.01.27	Fre 29.01.27											26.01							
632		Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%	2 t	Mon 01.02.27	Die 02.02.27											01.02							
633		Feininstallation Sanitär	0%	3 t	Mon 01.02.27	Mit 03.02.27											01.02							
634		Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuch	0%	5 t	Don 28.01.27	Mit 03.02.27											28.01							
635		Feininstallation Heizung	0%	3 t	Don 28.01.27	Mon 01.02.27											28.01							
636		Feininstallation MSR	0%	3 t	Don 28.01.27	Mon 01.02.27											28.01							
637		Montage Systemtrennwände	0%	3 t	Don 28.01.27	Mon 01.02.27											28.01							
638		Glasgeländer montieren	0%	2 t	Don 28.01.27	Fre 29.01.27											28.01							
639		Deckensegel montieren	0%	5 t	Don 28.01.27	Mit 03.02.27											28.01							
640		Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%	1 t	Don 04.02.27	Don 04.02.27											04.02							
641		Tischlerarbeiten	0%	5 t	Fre 05.02.27	Don 11.02.27											05.02							
642		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27											08.02							
643		Ausbauarbeiten BT-D	0%	113 t	Mit 02.09.26	Fre 19.02.27																		
644		Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t	Mit 02.09.26	Die 08.09.26									02.09									
645		Grobmontage ELT (Funktionserhalt unter Schüttung)	0%	3 t	Mit 09.09.26	Fre 11.09.26									09.09									
646		Schüttung herstellen	0%	5 t	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26									14.09									
647		Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26									21.09									
648		Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26									05.10									
649		Grobinstallation Heizung	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26									12.10									
650		Grobinstallation Lüftung	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26									12.10									
651		Grobinstallation Sanitär	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26									12.10									
652		Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26									12.10									
653		Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraur	0%	5 t	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26									12.10									
654		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Mon 19.10.26	Mit 21.10.26									19.10									
655		Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t	Don 22.10.26	Mon 02.11.26									22.10									
656		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Fre 30.10.26	Don 05.11.26									30.10									
657		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t	Fre 06.11.26	Die 10.11.26									06.11									
658		Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 11.11.26	Fre 13.11.26									11.11									
659		Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 11.11.26	Fre 13.11.26									11.11									
660		Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26									16.11									
661		Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26									16.11									
662		Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26									16.11									
663		Gipskartonwände schließen	0%	8 t	Fre 13.11.26	Die 24.11.26									13.11									
664		Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t	Die 24.11.26	Mit 25.11.26									24.11									
665		Trockenbau Decken	0%	10 t	Don 26.11.26	Mit 09.12.26									26.11									
666		Fliesenarbeiten	0%	7 t	Don 10.12.26	Fre 18.12.26										10.12								

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mit 29.07.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027											
							3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027					
							Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz			
667	Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%		5 t	Mit 16.12.26	Die 05.01.27						16.12						
668	Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%		5 t	Mit 06.01.27	Die 12.01.27							06.01					
669	Bodenbelag Teppich/Lino	0%		8 t	Mit 13.01.27	Fre 22.01.27							13.01					
670	Innentüren	0%		7 t	Fre 22.01.27	Mon 01.02.27							22.01					
671	Mobile Trennwand	0%		7 t	Mon 25.01.27	Die 02.02.27							25.01					
672	Malerarbeiten Endanstrich	0%		4 t	Die 02.02.27	Fre 05.02.27							02.02					
673	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%		2 t	Mon 08.02.27	Die 09.02.27							08.02					
674	Feininstallation Sanitär	0%		3 t	Mon 08.02.27	Mit 10.02.27							08.02					
675	Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuch	0%		5 t	Don 04.02.27	Mit 10.02.27							04.02					
676	Feininstallation Heizung	0%		3 t	Don 04.02.27	Mon 08.02.27							04.02					
677	Feininstallation MSR	0%		3 t	Don 04.02.27	Mon 08.02.27							04.02					
678	Montage Systemtrennwände	0%		3 t	Don 04.02.27	Mon 08.02.27							04.02					
679	Deckensegel montieren	0%		5 t	Don 04.02.27	Mit 10.02.27							04.02					
680	Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%		1 t	Don 11.02.27	Don 11.02.27							11.02					
681	Tischlerarbeiten	0%		5 t	Fre 12.02.27	Don 18.02.27							12.02					
682	Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%		5 t	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27							15.02					
683	Ausbauarbeiten BT-E	0%		113 t	Mit 09.09.26	Fre 26.02.27												
684	Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%		5 t	Mit 09.09.26	Die 15.09.26			09.09									
685	Grobinstallation Heizung	0%		5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26				19.10								
686	Grobinstallation Lüftung	0%		5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26				19.10								
687	Grobinstallation Sanitär	0%		5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26				19.10								
688	Grobmontage MSR (Teil 1)	0%		5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26				19.10								
689	Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraur	0%		5 t	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26				19.10								
690	Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%		3 t	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26				26.10								
691	Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%		8 t	Don 29.10.26	Mon 09.11.26				29.10								
692	Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%		5 t	Fre 06.11.26	Don 12.11.26				06.11								
693	Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%		3 t	Fre 13.11.26	Die 17.11.26				13.11								
694	Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%		3 t	Mit 18.11.26	Fre 20.11.26				18.11								
695	Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%		3 t	Mit 18.11.26	Fre 20.11.26				18.11								
696	Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich	0%		5 t	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26				23.11								
697	Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%		5 t	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26				23.11								
698	Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%		5 t	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26				23.11								
699	Gipskartonwände schließen	0%		8 t	Fre 20.11.26	Die 01.12.26				20.11								
700	Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%		2 t	Die 01.12.26	Mit 02.12.26				01.12								
701	Trockenbau Decken	0%		10 t	Don 03.12.26	Mit 16.12.26				03.12								
702	Fliesenarbeiten	0%		7 t	Don 17.12.26	Fre 08.01.27						17.12						
703	Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%		5 t	Mit 06.01.27	Die 12.01.27							06.01					
704	Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%		5 t	Mit 13.01.27	Die 19.01.27							13.01					
705	Bodenbelag Teppich/Lino	0%		8 t	Mit 20.01.27	Fre 29.01.27							20.01					
706	Innentüren	0%		7 t	Fre 29.01.27	Mon 08.02.27							29.01					
707	Mobile Trennwand	0%		7 t	Mon 01.02.27	Die 09.02.27							01.02					
708	Malerarbeiten Endanstrich	0%		4 t	Die 09.02.27	Fre 12.02.27							09.02					
709	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%		2 t	Mon 15.02.27	Die 16.02.27							15.02					
710	Feininstallation Sanitär	0%		3 t	Mon 15.02.27	Mit 17.02.27							15.02					
711	Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuch	0%		5 t	Don 11.02.27	Mit 17.02.27							11.02					
712	Feininstallation Heizung	0%		3 t	Don 11.02.27	Mon 15.02.27							11.02					
713	Feininstallation MSR	0%		3 t	Don 11.02.27	Mon 15.02.27							11.02					
714	Montage Systemtrennwände	0%		3 t	Don 11.02.27	Mon 15.02.27							11.02					
715	Deckensegel montieren	0%		5 t	Don 11.02.27	Mit 17.02.27							11.02					
716	Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%		1 t	Don 18.02.27	Don 18.02.27							18.02					
717	Tischlerarbeiten	0%		5 t	Fre 19.02.27	Don 25.02.27							19.02					

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mit 29.07.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			


Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	i	Vorgangsname	%	eschlos	Dauer	Anfang	Ende	2027													
								3. Qtl, 2026	Jul			Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz
718		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%		5 t	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27														
719		Ausbauarbeiten BT-F	0%	113 t		Mit 16.09.26	Fre 05.03.27														
720		Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t		Mit 16.09.26	Die 22.09.26						16.09								
721		Grobinstallation Heizung	0%	5 t		Mon 26.10.26	Fre 30.10.26								26.10						
722		Grobinstallation Lüftung	0%	5 t		Mon 26.10.26	Fre 30.10.26								26.10						
723		Grobinstallation Sanitär	0%	5 t		Mon 26.10.26	Fre 30.10.26								26.10						
724		Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t		Mon 26.10.26	Fre 30.10.26								26.10						
725		Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraur	0%	5 t		Mon 26.10.26	Fre 30.10.26								26.10						
726		Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t		Mon 02.11.26	Mit 04.11.26								02.11						
727		Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t		Don 05.11.26	Mon 16.11.26								05.11						
728		Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t		Fre 13.11.26	Don 19.11.26								13.11						
729		Hohlraumboden Heißeleitung spachteln	0%	3 t		Fre 20.11.26	Die 24.11.26								20.11						
730		Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t		Mit 25.11.26	Fre 27.11.26								25.11						
731		Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t		Mit 25.11.26	Fre 27.11.26								25.11						
732		Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich	0%	5 t		Mon 30.11.26	Fre 04.12.26								30.11						
733		Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t		Mon 30.11.26	Fre 04.12.26								30.11						
734		Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t		Mon 30.11.26	Fre 04.12.26								30.11						
735		Gipskartonwände schließen	0%	8 t		Fre 27.11.26	Die 08.12.26								27.11						
736		Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t		Die 08.12.26	Mit 09.12.26								08.12						
737		Trockenbau Decken	0%	10 t		Don 10.12.26	Mit 06.01.27								10.12						
738		Fliesenarbeiten	0%	7 t		Don 07.01.27	Fre 15.01.27												07.01		
739		Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t		Mit 13.01.27	Die 19.01.27												13.01		
740		Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%	5 t		Mit 20.01.27	Die 26.01.27												20.01		
741		Bodenbelag Teppich/Lino	0%	8 t		Mit 27.01.27	Fre 05.02.27												27.01		
742		Innentüren	0%	7 t		Fre 05.02.27	Mon 15.02.27												05.02		
743		Mobile Trennwand	0%	7 t		Mon 08.02.27	Die 16.02.27												08.02		
744		Malerarbeiten Endanstrich	0%	4 t		Die 16.02.27	Fre 19.02.27												16.02		
745		Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	0%	2 t		Mon 22.02.27	Die 23.02.27												22.02		
746		Feininstallation Sanitär	0%	3 t		Mon 22.02.27	Mit 24.02.27												22.02		
747		Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuchteneinbau)	0%	5 t		Don 18.02.27	Mit 24.02.27												18.02		
748		Feininstallation Heizung	0%	3 t		Don 18.02.27	Mon 22.02.27												18.02		
749		Feininstallation MSR	0%	3 t		Don 18.02.27	Mon 22.02.27												18.02		
750		Montage Systemtrennwände	0%	3 t		Don 18.02.27	Mon 22.02.27												18.02		
751		Deckensegel montieren	0%	5 t		Don 18.02.27	Mit 24.02.27												18.02		
752		Rohrrahmentür Türblatt montieren u. Inbetriebnahme	0%	1 t		Don 25.02.27	Don 25.02.27												25.02		
753		Tischlerarbeiten	0%	5 t		Fre 26.02.27	Don 04.03.27												26.02		
754		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t		Mon 01.03.27	Fre 05.03.27												01.03		
755		Ausbauarbeiten BT-G	0%	170 t		Mon 29.06.26	Fre 05.03.27														
756		Abdichtung Bodenplatte	0%	5 t		Mon 29.06.26	Fre 03.07.26														
757		Erstrich herstellen	0%	5 t		Mon 03.08.26	Fre 07.08.26						03.08								
758		Malerarbeiten Boden/ Wand Technik- / Lagerräume	0%	5 t		Mit 12.08.26	Die 18.08.26						12.08								
759		Grobinstallation Heizung	0%	5 t		Mit 19.08.26	Die 25.08.26						19.08								
760		Grobinstallation Lüftung	0%	5 t		Mit 19.08.26	Die 25.08.26						19.08								
761		Grobinstallation Sanitär	0%	5 t		Mit 19.08.26	Die 25.08.26						19.08								
762		Grobmontage MSR	0%	5 t		Mit 19.08.26	Die 25.08.26						19.08								
763		Grobmontage ELT	0%	5 t		Mit 19.08.26	Die 25.08.26						19.08								
764		Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t		Don 10.12.26	Fre 11.12.26												10.12		
765		Trockenbau Decken	0%	10 t		Mit 26.08.26	Die 08.09.26						26.08								
766		Fliesenarbeiten	0%	7 t		Mit 09.09.26	Don 17.09.26						09.09								
767		Parkett herstellen	0%	8 t		Mit 09.09.26	Fre 18.09.26						09.09								

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Mit 29.07.26	Vorgang		Rollup-Unterbrechung		ExterVorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Rollup-Meilenstein		In Arbeit		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Rollup in Arbeit		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Unterbrechung	
	Rollup-Vorgang		Projekt-Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende			

Terminplan Vergabe- und Bauausführung

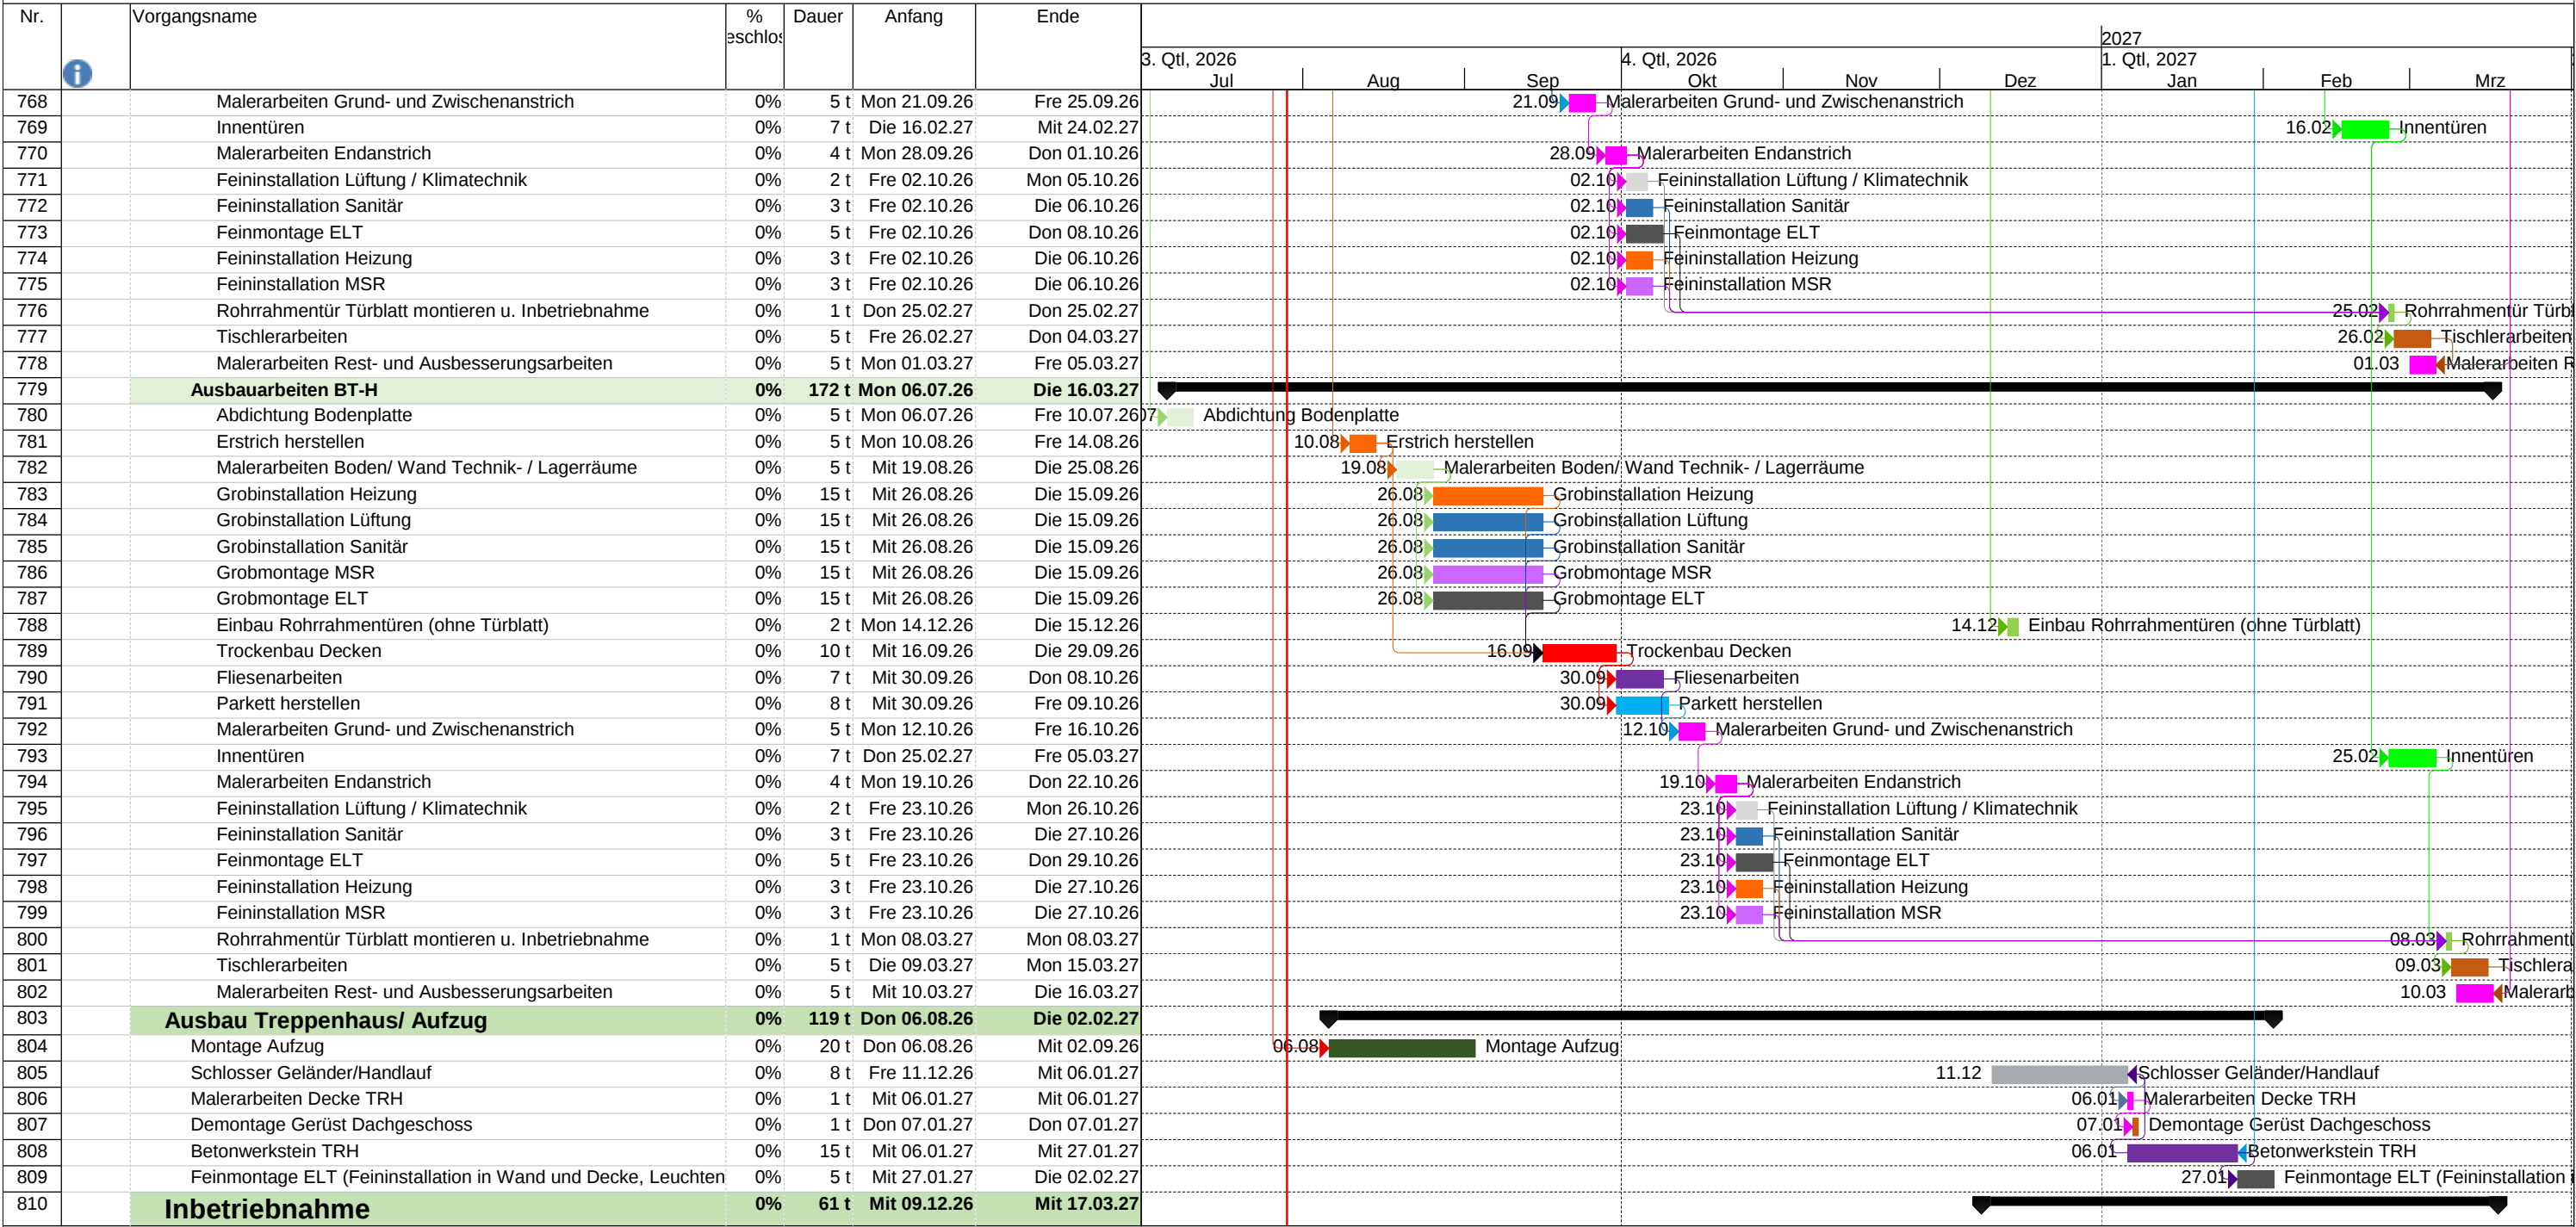

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel
Datum: Mit 29.07.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup-Vorgang

◆

Rollup-Unterbrechung

Rollup-Meilenstein

Rollup in Arbeit

Externe Vorgänge

Projekt-Sammelvorgang

◆

ExterVorgang

In Arbeit

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

◆

◆

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

◆

◆

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

In Arbeit

Unterbrechung

◆

↓
