




Terminplan Vergabe- und Bauausführung

Nr.	Vorgangsname	%	Dauer	Anfang	Ende	2027					
						1. Qtl, 2027	2. Qtl, 2027	3. Qtl, 2027	4. Qtl, 2027	1. Qtl, 2028	2. Qtl, 2028
1	Einreichung Bauantrag	0%	109 t	Don 27.02.25	Mon 16.06.25						
2	Vergabe Rathaus Hörstel	0%	1765 t	Mon 09.12.19	Mon 08.03.27						
377	Bauausführung Rathaus Hörstel	0%	381 t	Mon 25.08.25	Mit 17.03.27						
378	Baustelleneinrichtung	0%	5 t	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25						
379	Erd- und Rohbauarbeiten	0%	146 t	Mon 01.09.25	Don 09.04.26						
380	Untergeschoss	0%	86 t	Mon 01.09.25	Die 13.01.26						
417	Erdgeschoss	0%	52 t	Don 11.12.25	Mon 09.03.26						
436	1. Obergeschoss	0%	29 t	Die 10.02.26	Mon 23.03.26						
451	2. Obergeschoss	0%	29 t	Mit 25.02.26	Mit 08.04.26						
466	3. Obergeschoss	0%	19 t	Don 12.03.26	Don 09.04.26						
475	Blitzschutzarbeiten	0%	1 t	Mon 06.10.25	Mon 06.10.25						
476	Räumen Baustelleneinrichtung	0%	8 t	Don 02.04.26	Mit 15.04.26						
477	Betonkosmetik	0%	15 t	Mit 24.02.27	Die 16.03.27						
478	Holzrahmenbau	0%	197 t	Fre 10.04.26	Fre 29.01.27						
479	Baustelleneinrichtung/ Vorbereitende Maßnahmen	0%	5 t	Fre 10.04.26	Don 16.04.26						
480	Erdgeschoss	0%	24 t	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26						
481	Stahlbau	0%	10 t	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26						
482	Holzrahmenbauwände stellen	0%	10 t	Mon 27.04.26	Mon 11.05.26						
483	BSP-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%	2 t	Die 12.05.26	Mit 13.05.26						
484	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%	2 t	Fre 15.05.26	Mon 18.05.26						
485	1. Obergeschoss	0%	11 t	Die 19.05.26	Mit 03.06.26						
486	Stahlbau	0%	7 t	Die 19.05.26	Don 28.05.26						
487	Holzrahmenbauwände stellen	0%	7 t	Die 19.05.26	Don 28.05.26						
488	BSP-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%	2 t	Fre 29.05.26	Mon 01.06.26						
489	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%	2 t	Die 02.06.26	Mit 03.06.26						
490	2. Obergeschoss	0%	12 t	Fre 05.06.26	Mon 22.06.26						
491	Stahlbau	0%	7 t	Fre 05.06.26	Mon 15.06.26						
492	Holzrahmenbauwände stellen	0%	7 t	Fre 05.06.26	Mon 15.06.26						
493	BSH-Decke verlegen inkl. Witterungsschutz	0%	3 t	Die 16.06.26	Don 18.06.26						
494	Statische Anschlüsse und Restarbeiten	0%	2 t	Fre 19.06.26	Mon 22.06.26						
495	Blitzschutzarbeiten	0%	2 t	Fre 19.06.26	Mon 22.06.26						
496	3. Obergeschoss	0%	4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26						
497	Außenwände herstellen (Technikeinhausung)	0%	4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26						
498	Sparrendach herstellen	0%	4 t	Die 23.06.26	Fre 26.06.26						
499	Dacharbeiten	0%	145 t	Mon 29.06.26	Fre 29.01.27						
500	Bereitstellen Einbauteile (Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug)	0%	0 t	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26						
501	Dampfsperre montieren	0%	3 t	Mon 29.06.26	Mit 01.07.26						
502	Montage Einbauteile / Aufsatzkräne etc.	0%	1 t	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26						
503	Blitzschutz Attika	0%	2 t	Don 02.07.26	Fre 03.07.26						
504	Dämmung Dach montieren	0%	4 t	Don 02.07.26	Die 07.07.26						
505	2-lagige Dachabdichtung herstellen	0%	4 t	Mit 08.07.26	Mon 13.07.26						
506	Attikageländer montieren	0%	2 t	Die 14.07.26	Mit 15.07.26						
507	Unterkonstruktion + Klemmschuh Ganzglasgeländer montieren	0%	2 t	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26						
508	Unterkonstruktion PV-Anlage	0%	1 t	Die 14.07.26	Die 14.07.26						
509	Dachterrasse herstellen	0%	5 t	Die 28.07.26	Mon 03.08.26						
510	Substrat/ Kies aufbringen	0%	3 t	Mit 15.07.26	Fre 17.07.26						
511	Attika Verkleidung herstellen	0%	2 t	Don 16.07.26	Fre 17.07.26						
512	Montage PV Module	0%	7 t	Die 04.08.26	Mit 12.08.26						
513	Glasgeländer montieren	0%	2 t	Don 28.01.27	Fre 29.01.27						
514	Gebäudehülle wetterfest	0%	0 t	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26						
515	Ausbauarbeiten	0%	188 t	Fre 12.06.26	Die 16.03.27						
516	Aufstellen Baustromverteiler - alle Etagen	0%	5 t	Don 16.07.26	Mit 22.07.26						
517	Grobinstallation Elektro in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26						
518	Grobinstallation Heizung in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26						
519	Grobinstallation Sanitär in Holzrahmenbau	0%	8 t	Fre 12.06.26	Die 23.06.26						
520	Verschluss Holzrahmenbauwände	0%	6 t	Mit 24.06.26	Mit 01.07.26						
521	Ausbauarbeiten BT-A	0%	113 t	Mit 12.08.26	Fre 29.01.27						
522	Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)	0%	5 t	Mit 12.08.26	Die 18.08.26						
523	Grobmontage ELT (Funktionserhalt unter Schüttung)	0%	3 t	Mit 19.08.26	Fre 21.08.26						
524	Schüttung herstellen	0%	5 t	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26						
525	Trocknungszeit Schüttung	0%	10 t	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26						
526	Hohlraumboden 1. Lage herstellen	0%	5 t	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26						
527	Grobinstallation Heizung	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
528	Grobinstallation Lüftung	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
529	Grobinstallation Sanitär	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
530	Grobmontage MSR (Teil 1)	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
531	Grobmontage ELT (Teil 1 Ausbau Leitungswege unter Holraumboden, Steigepunkte)	0%	5 t	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26						
532	Hohlraumboden Stützen + Oberlage	0%	3 t	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26						
533	Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)	0%	8 t	Don 01.10.26	Mon 12.10.26						
534	Grobinstallation Fußbodenheizung in Hohlraumboden	0%	5 t	Fre 09.10.26	Don 15.10.26						
535	Hohlraumboden Heißleitung spachteln	0%	3 t	Fre 16.10.26	Die 20.10.26						
536	Grobmontage MSR - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26						
537	Grobmontage ELT - Teil 2 (Installation in GK-Wände)	0%	3 t	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26						
538	Grobinstallation Lüftung - Teil 2 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26						
539	Grobmontage MSR - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26						
540	Grobmontage ELT - Teil 3 (Installation im Deckenbereich)	0%	5 t	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26						
541	Gipskartonwände schließen	0%	8 t	Fre 23.10.26	Die 03.11.26						
542	Einbau Rohrrahmentüren (ohne Türblatt)	0%	2 t	Die 03.11.26	Mit 04.11.26						
543	Trockenbau Decken	0%	10 t	Don 05.11.26	Mit 18.11.26						
544	Fliesenarbeiten	0%	7 t	Don 19.11.26	Fre 27.11.26						
545	Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	0%	5 t	Mit 25.11.26	Die 01.12.26						
546	Tischlerarbeiten (Wandbekleidung)	0%	5 t	Mit 02.12.26	Die 08.12.26						

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Don 06.08.26	Vorgang		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein	
	Unterbrechung		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		ExterVorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		In Arbeit		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Unterbrechung	

Terminplan Vergabe- und Bauausführung

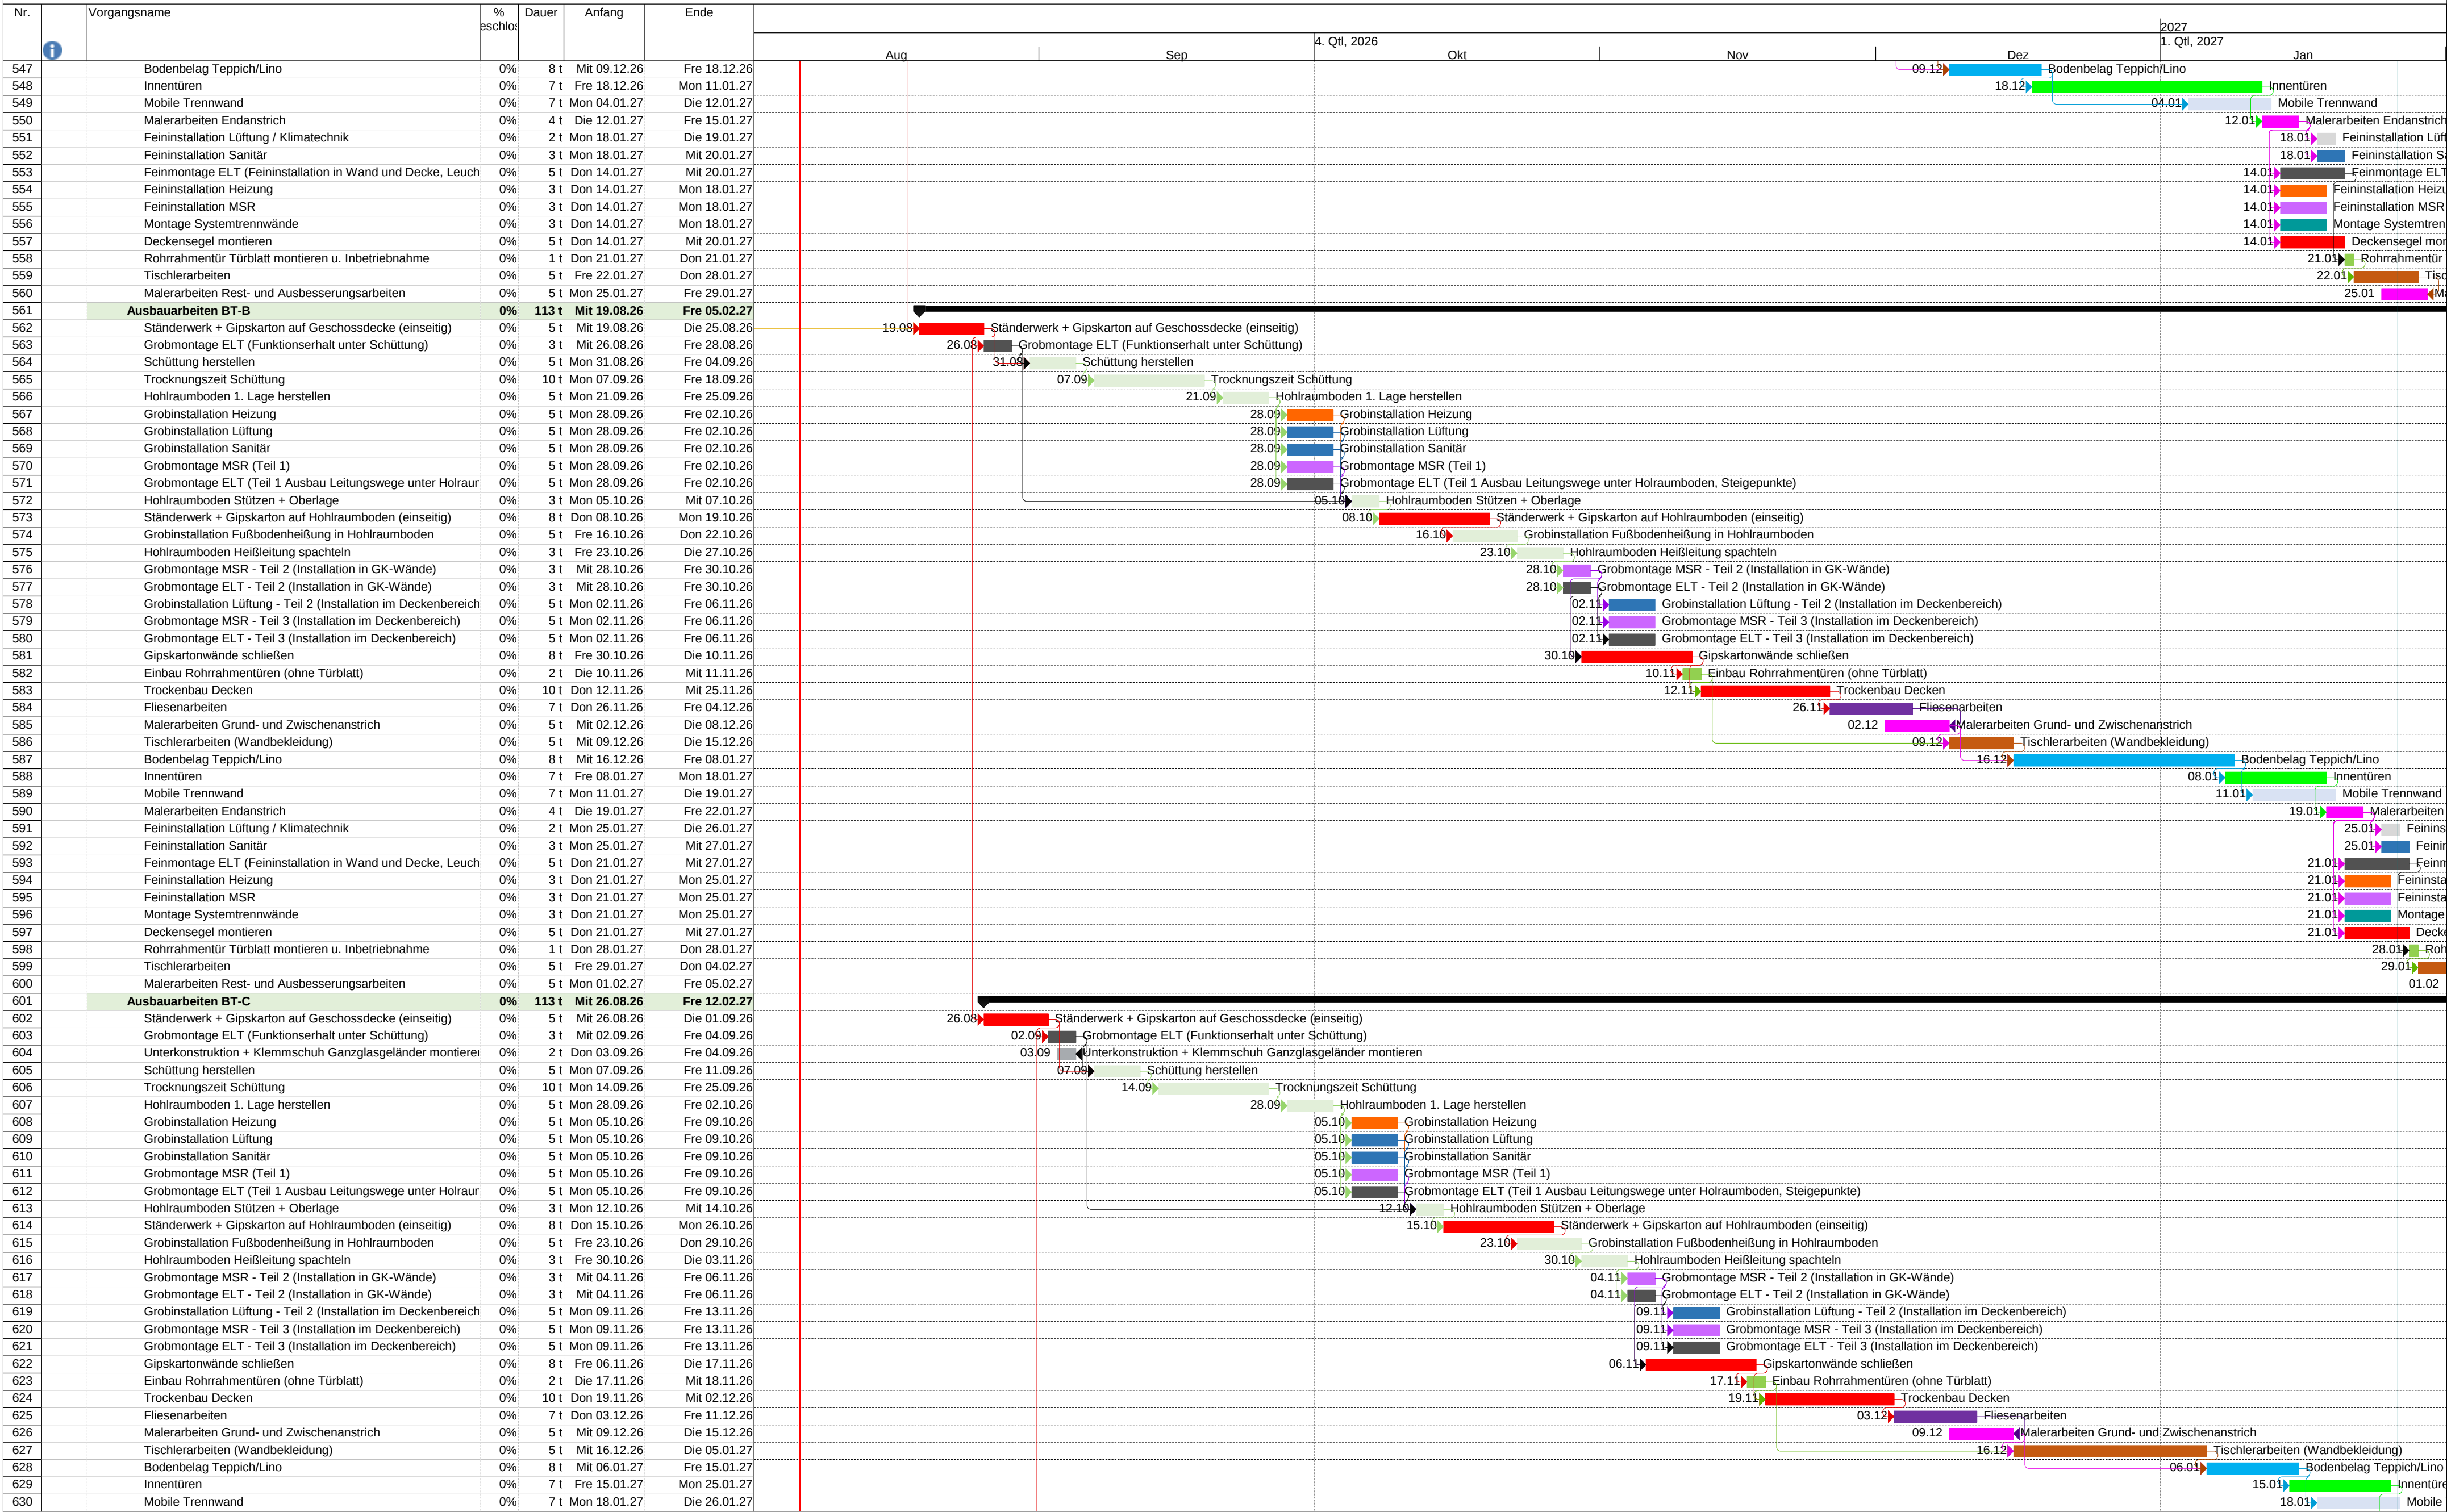

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Don 06.08.26	Vorgang		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein	
	Unterbrechung		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		ExterVorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		In Arbeit		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Unterbrechung	

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Don 06.08.26	Vorgang		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein	
	Unterbrechung		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		ExterVorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		In Arbeit		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Unterbrechung	

Terminplan Vergabe- und Bauausführung



Nr.	i	Vorgangsname	% eschlossen	Dauer	Anfang	Ende												
							2027 1. Qtl, 2027											
							Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	Jan					
799		Tischlerarbeiten	0%	5 t	Die 09.03.27	Mon 15.03.27												
800		Malerarbeiten Rest- und Ausbesserungsarbeiten	0%	5 t	Mit 10.03.27	Die 16.03.27												
801		Ausbau Treppenhaus/ Aufzug	0%	119 t	Don 06.08.26	Die 02.02.27												
802		Montage Aufzug	0%	20 t	Don 06.08.26	Mit 02.09.26												
803		Schlosser Geländer/Handlauf	0%	8 t	Fre 11.12.26	Mit 06.01.27												
804		Malerarbeiten Decke TRH	0%	1 t	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27												
805		Demontage Gerüst Dachgeschoss	0%	1 t	Don 07.01.27	Don 07.01.27												
806		Betonwerkstein TRH	0%	15 t	Mit 06.01.27	Mit 27.01.27												
807		Feinmontage ELT (Feininstallation in Wand und Decke, Leuchten	0%	5 t	Mit 27.01.27	Die 02.02.27												
808		Inbetriebnahme	0%	61 t	Mit 09.12.26	Mit 17.03.27												

Projekt: Neubau Rathaus Hörstel Datum: Don 06.08.26	Vorgang		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein	◇	Projekt-Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein	
	Unterbrechung		Rollup-Vorgang		Rollup in Arbeit		ExterVorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein	◆	Rollup-Unterbrechung		Externe Vorgänge		In Arbeit		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Unterbrechung	
