











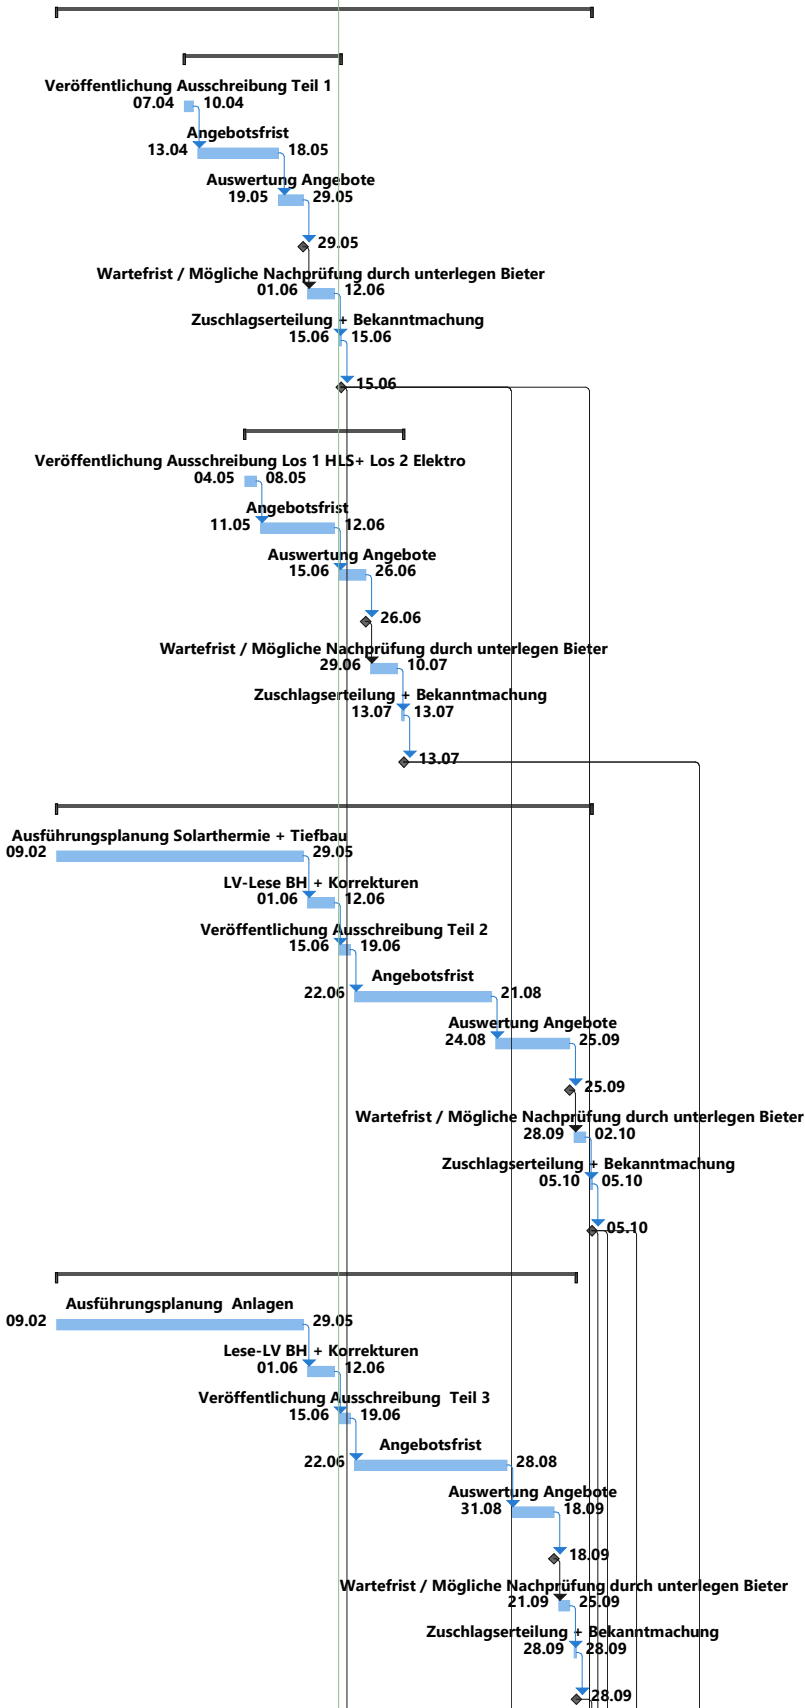
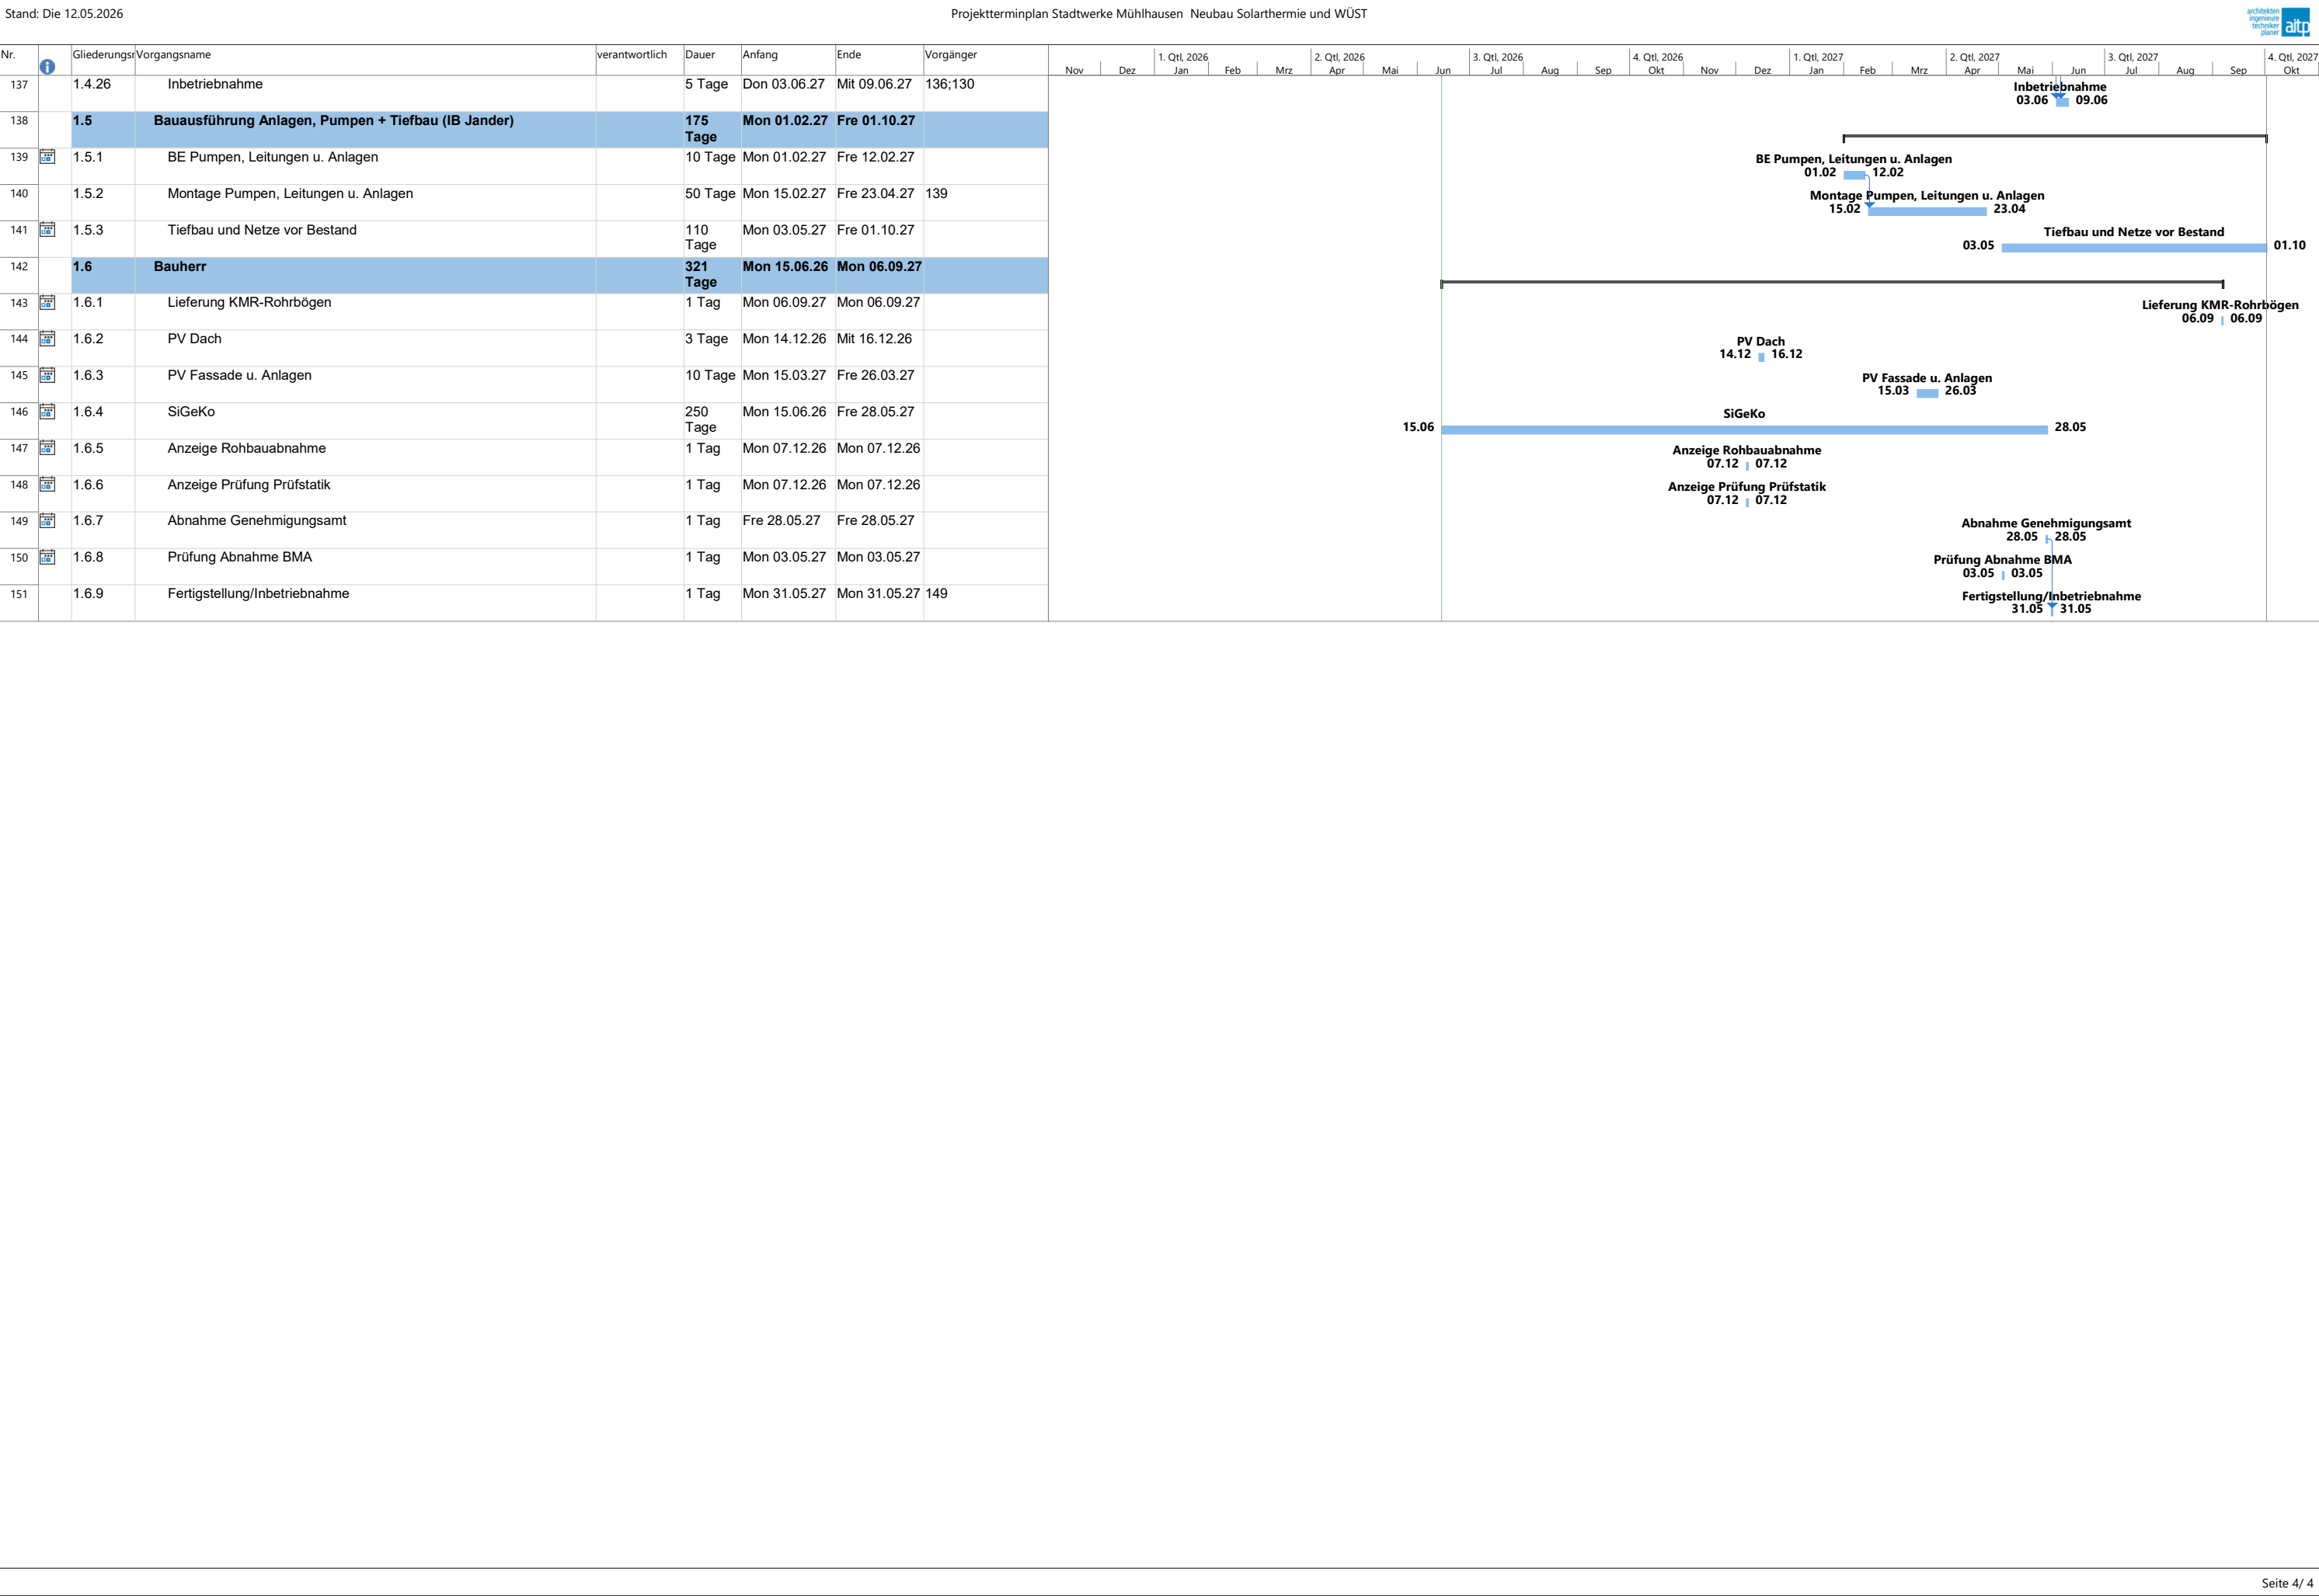


Nr.		Gliederungs	Vorgangsname	verantwortlich	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nov	Dez	1. Qtl. 2026 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2026 Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2026 Okt	Nov	Dez	1. Qtl. 2027 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2027 Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2027 Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2027 Okt
1		1	SW Mühlhausen  Neubau Solarthermie und WÜST		545 Tage	Mon 01.09.25	Fre 01.10.27																									
2		1.1	Planung Projektvorbereitung		195 Tage	Mon 01.09.25	Fre 29.05.26																									
16		1.2	Ausschreibung		171 Tage	Mon 09.02.26	Mon 05.10.26																									
17		1.2.1	1.1 Hochbau + Baufeldfreimachung		50 Tage	Die 07.04.26	Mon 15.06.26																									
18		1.2.1.1	Veröffentlichung Ausschreibung Teil 1	aitp	4 Tage	Die 07.04.26	Fre 10.04.26																									
19		1.2.1.2	Angebotsfrist	aitp	26 Tage	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26	18																								
20		1.2.1.3	Auswertung Angebote	aitp	9 Tage	Die 19.05.26	Fre 29.05.26	19																								
21		1.2.1.4	Versendung Vorabinformationsschreiben	aitp	0 Tage	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	20																								
22		1.2.1.5	Wartefrist / Mögliche Nachprüfung durch unterlegen Bieter	aitp	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	21																								
23		1.2.1.6	Zuschlagserteilung + Bekanntmachung	aitp	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26	22																								
24		1.2.1.7	Auftrag	aitp	0 Tage	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26	23																								
25		1.2.2	1.2 TGA / HLSE	aitp	51 Tage	Mon 04.05.26	Mon 13.07.26																									
26		1.2.2.1	Veröffentlichung Ausschreibung Los 1 HLS+ Los 2 Elektro	aitp	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26																									
27		1.2.2.2	Angebotsfrist	aitp	25 Tage	Mon 11.05.26	Fre 12.06.26	26																								
28		1.2.2.3	Auswertung Angebote	aitp	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26	27																								
29		1.2.2.4	Versendung Vorabinformationsschreiben	aitp	0 Tage	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26	28																								
30		1.2.2.5	Wartefrist / Mögliche Nachprüfung durch unterlegen Bieter	aitp	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	29																								
31		1.2.2.6	Zuschlagserteilung + Bekanntmachung	aitp	1 Tag	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	30																								
32		1.2.2.7	Auftrag	aitp	0 Tage	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	31																								
33		1.2.3	2. Solarthermie + Tiefbau (aitp GmbH)		171 Tage	Mon 09.02.26	Mon 05.10.26																									
34		1.2.3.1	Ausführungsplanung Solarthermie + Tiefbau	aitp	80 Tage	Mon 09.02.26	Fre 29.05.26																									
35		1.2.3.2	LV-Lese BH + Korrekturen	aitp	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	34																								
36		1.2.3.3	Veröffentlichung Ausschreibung Teil 2	aitp	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	35																								
37		1.2.3.4	Angebotsfrist	aitp	45 Tage	Mon 22.06.26	Fre 21.08.26	36																								
38		1.2.3.5	Auswertung Angebote	aitp	25 Tage	Mon 24.08.26	Fre 25.09.26	37																								
39		1.2.3.6	Versendung Vorabinformationsschreiben	aitp	0 Tage	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26	38																								
40		1.2.3.7	Wartefrist / Mögliche Nachprüfung durch unterlegen Bieter	aitp	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	39																								
41		1.2.3.8	Zuschlagserteilung + Bekanntmachung	aitp	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	40																								
42		1.2.3.9	Auftrag	aitp	0 Tage	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	41																								
43		1.2.4	3. Anlagen Pumpen/Netze + Tiefbau (IB Jander)		166 Tage	Mon 09.02.26	Mon 28.09.26																									
44		1.2.4.1	Ausführungsplanung Anlagen	Jander	80 Tage	Mon 09.02.26	Fre 29.05.26																									
45		1.2.4.2	Lese-LV BH + Korrekturen	Jander	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	44																								
46		1.2.4.3	Veröffentlichung Ausschreibung Teil 3	Jander	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26	45																								
47		1.2.4.4	Angebotsfrist	Jander	50 Tage	Mon 22.06.26	Fre 28.08.26	46																								
48		1.2.4.5	Auswertung Angebote	Jander	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26	47																								
49		1.2.4.6	Versendung Vorabinformationsschreiben	Jander	0 Tage	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26	48																								
50		1.2.4.7	Wartefrist / Mögliche Nachprüfung durch unterlegen Bieter	Jander	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	49																								
51		1.2.4.8	Zuschlagserteilung + Bekanntmachung	Jander	1 Tag	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26	50																								
52		1.2.4.9	Auftrag	Jander	0 Tage	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26	51																								
53		1.3	Bauausführung		229 Tage	Die 16.06.26	Fre 30.04.27																									
54		1.3.1	1.1 Hochbau + Baufeldfreimachung		229 Tage	Die 16.06.26	Fre 30.04.27																									



Stand: Die 12.05.2026				Projektterminplan Stadtwerke Mühlhausen  Neubau Solarthermie und WÜST																						<div>architekten ingenieure technische planer</div> <div>aitp</div>							
Nr.	<div><div></div><div></div></div>	Gliederungs	Vorgangsname	verantwortlich	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nov	Dez	1. Qtl. 2026 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2026 Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2026 Okt	Nov	Dez	1. Qtl. 2027 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2027 Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2027 Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2027 Okt	
55	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.1	Baustelleneinrichtung		9 Tage	Die 16.06.26	Fre 26.06.26	24																									
56	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.2	Vermessung/Einmessung Gebäude		2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26	55AA+4 Tage																									
57	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.3	Werkplanung Massivteile, Prüfung Statik		60 Tage	Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	55AA+4 Tage																									
58	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.4	Baufeldfreimachung, Vermessung Absteckung		10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26	55																									
59	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.5	Baugrube		5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	58																									
60	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.6	Schleusen		15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	59																									
61	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.7	Fundamente Achsen 2-4/D-F		20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26																										
62	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.8	Montage Fertigteile Massiv EG 2-4/D-F		3 Tage	Mon 24.08.26	Mit 26.08.26	61																									
63	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.9	Fundamente Achsen 2-4/D-A		20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	61EA-5 Tage																									
64	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.10	Montage Fertigteile Massiv EG 2-4/D-A		3 Tage	Mon 14.09.26	Mit 16.09.26	63																									
65	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.11	Montage Halbfertigteil Decke / Betonage/ Treppe Montage		10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	64																									
66	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.12	Fertigteile Massiv OG Montage		15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26	65																									
67	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.13	Bindermontage Achsen 2-4, 3Stück		5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	66AA+10 Tage																									
68	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.14	Betonage Bodenplatten Achse 2-4/C-F (-80cm)		5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	65																									
69	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.15	Werkplanung Holzständerwand außen, Prüfung Statik		40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26	24																									
70	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.16	Fundamente /Streifen Holz 1-2/A-F		10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26																										
71	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.17	Bodenplatte 1-2/A-F		10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	70																									
72	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.18	Sockel Schalung Betonage		10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	71																									
73	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.19	Holzständerwand außen		30 Tage	Mon 02.11.26	Fre 11.12.26	72AA+15 Tage;69																									
74	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.20	Bindermontage, Windverb. Koppelstäbe, Achse 1-2,		10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	73AA+20 Tage																									
75	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.21	Werkplanung Dach		40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26	24																									
76	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.22	Dach Domico o.glw.		10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26																										
77	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.23	PV-Dach (BH) Montage durch Domico		10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	76AA																									
78	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.24	Fassadenarbeiten Dämmung u. Bekleidung		85 Tage	Mon 04.01.27	Fre 30.04.27	73																									
79	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.25	Fenster+Türen Werkplanung Herstellung		40 Tage	Mon 14.12.26	Fre 05.02.27	73																									
80	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.26	Fenster-Außentüren Montage		10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	73																									
81	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.27	Winterbauheizung		65 Tage	Mon 25.01.27	Fre 23.04.27	80																									
82	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.28	Trockenbau		45 Tage	Mon 25.01.27	Fre 26.03.27	80																									
83	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.29	Fußb. OG Büro Dämmung		2 Tage	Mon 29.03.27	Die 30.03.27	82																									
84	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.30	Fußb. OG Büro Heizung + Estrich		3 Tage	Mit 31.03.27	Fre 02.04.27	83																									
85	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.31	Fußb. OG Büro Aufheizung		15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	84																									
86	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.32	Fußb. Bodenbelag		1 Tag	Mon 26.04.27	Mon 26.04.27	85																									
87	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.33	Innentüren		3 Tage	Mon 05.04.27	Mit 07.04.27	84																									
88	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.34	Schlosser Werkplanung Prüfung, Bühne u. Treppen		50 Tage	Mon 05.10.26	Fre 11.12.26	24																									
89	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.35	Schlosser Montage Bühne u. Treppen		30 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.03.27	88																									
90	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.36	Bodenbeschichtung		10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	80																									
91	<div><div></div><div></div></div>	1.3.1.37	Malerarbeiten		25 Tage	Mon 08.03.27	Fre 09.04.27	80																									
92	<div><div></div><div></div></div>	1.3.2	2.1 HLS/Mechanik		90 Tage	Mon 23.11.26	Fre 26.03.27																										
93	<div><div></div><div></div></div>	1.3.2.1	Baustelleneinrichtung		10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	32																									
94	<div><div></div><div></div></div>	1.3.2.2	Rohinstallation Sanitär		20 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27	93																									
95	<div><div></div><div></div></div>	1.3.2.3	Installation Lüftung		10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27	94																									

[illegible]



Seite 4/ 4
