


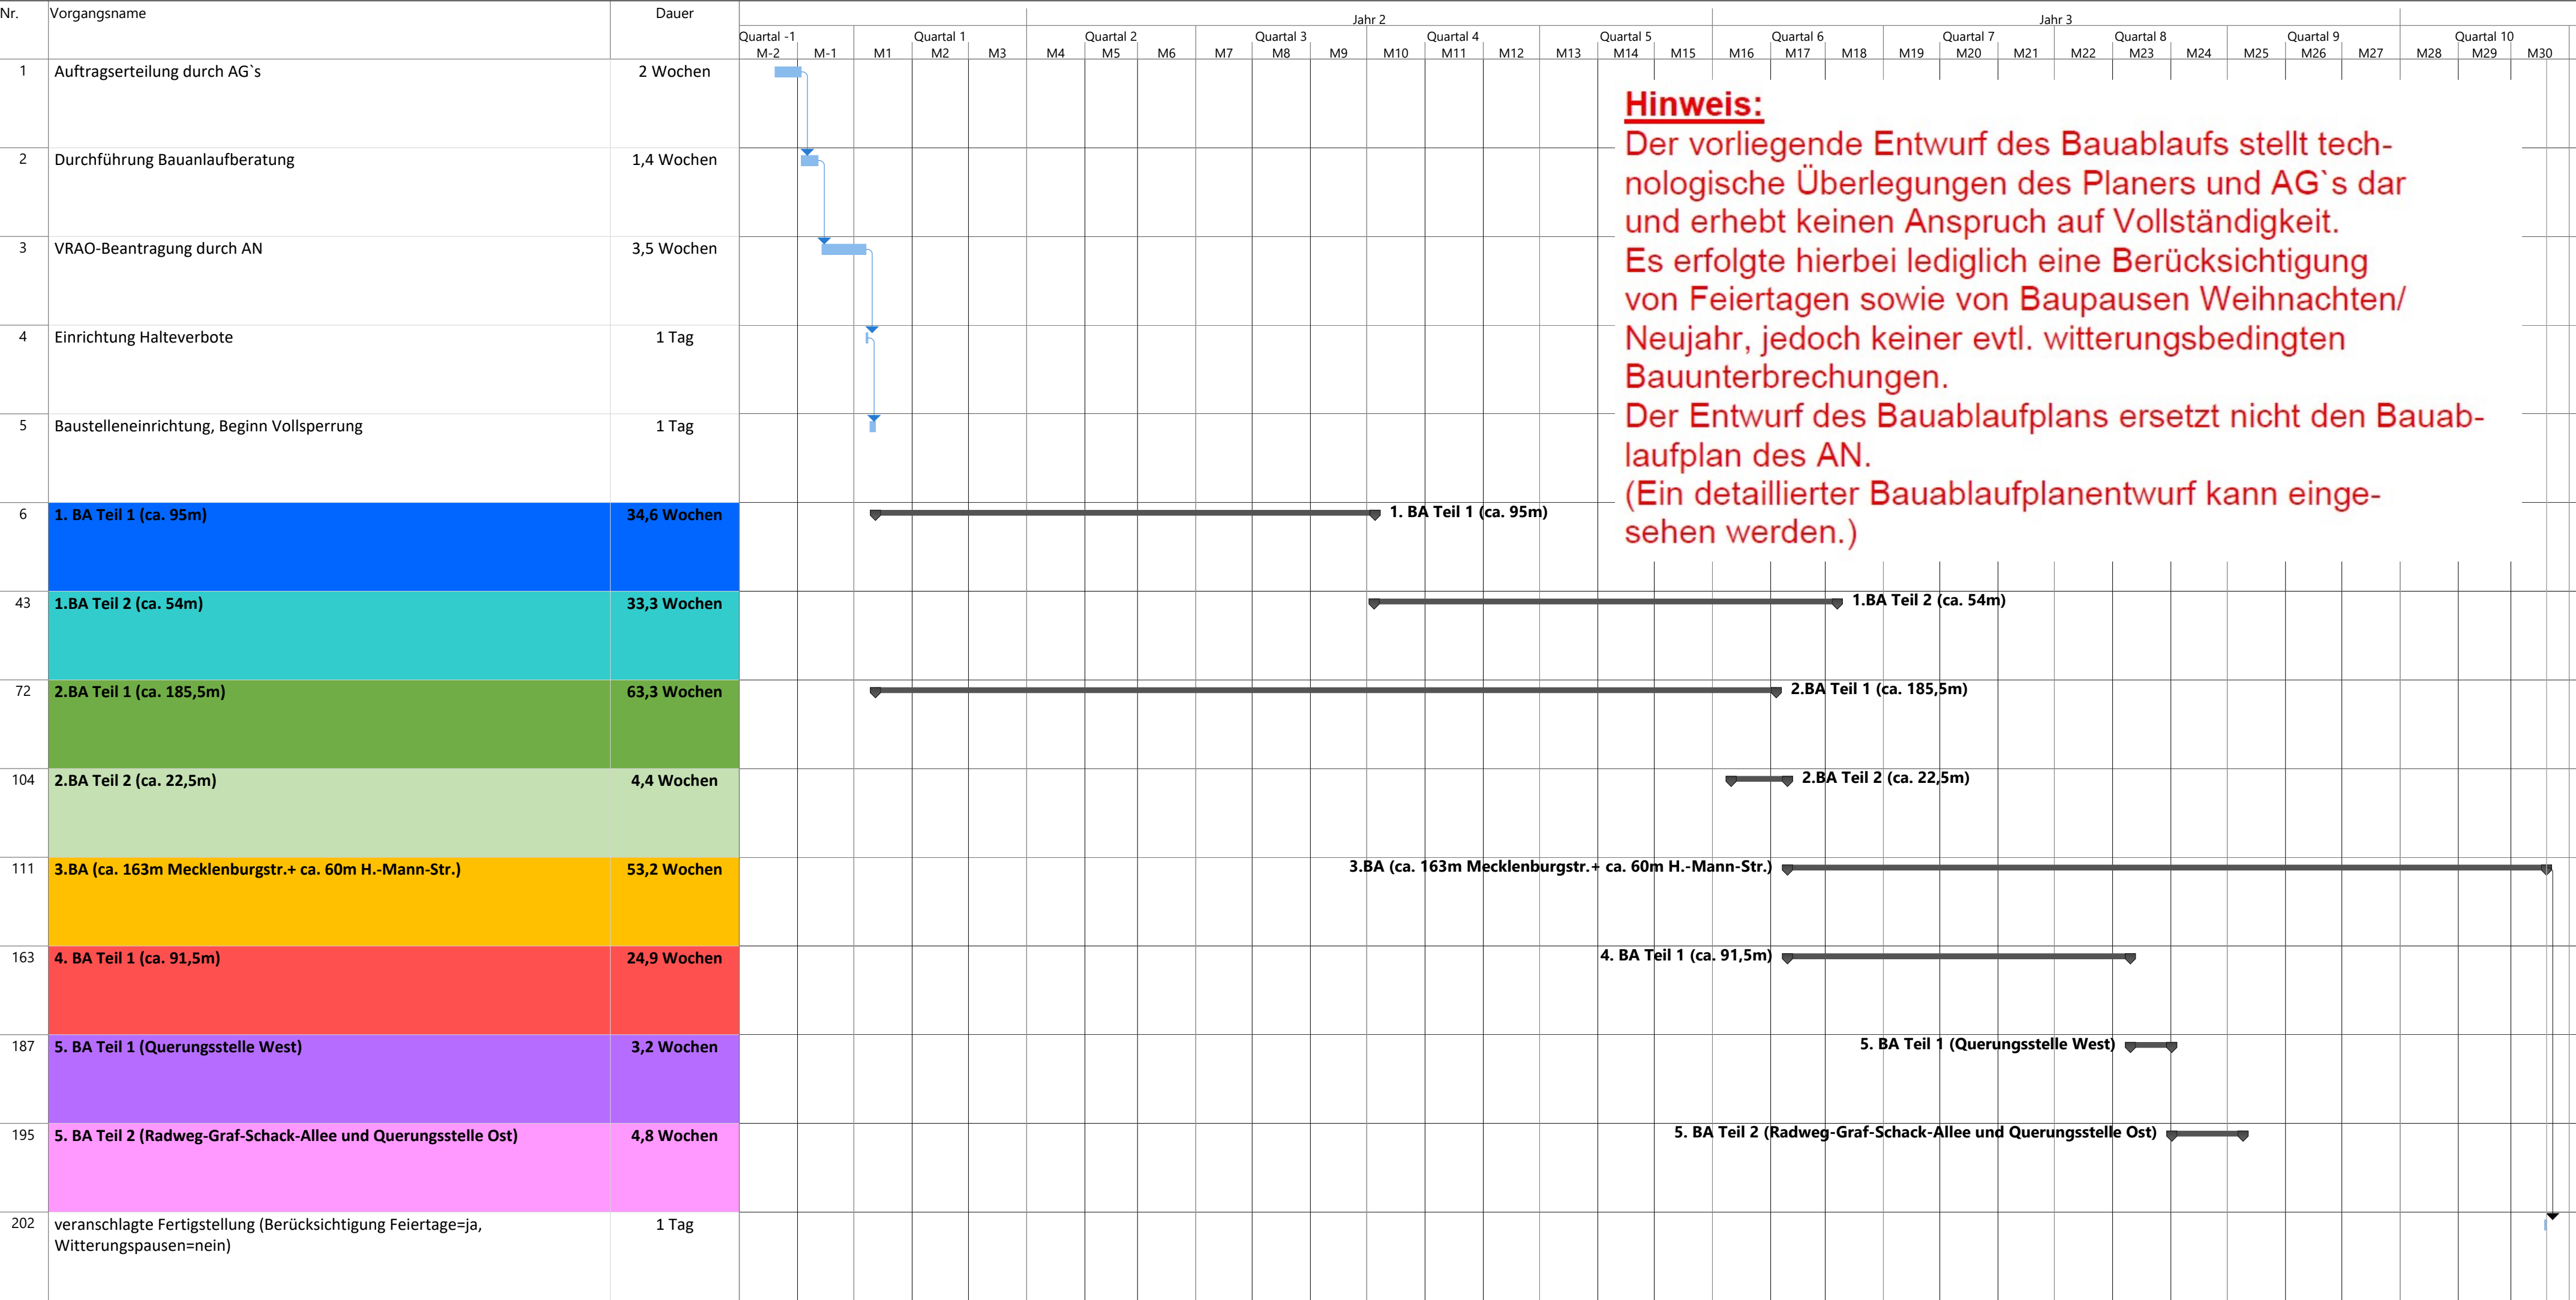

Hinweis:
Der vorliegende Entwurf des Bauablaufs stellt technologische Überlegungen des Planers und AG`s dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es erfolgte hierbei lediglich eine Berücksichtigung von Feiertagen sowie von Baupausen Weihnachten/ Neujahr, jedoch keiner evtl. witterungsbedingten Bauunterbrechungen. Der Entwurf des Bauablaufplans ersetzt nicht den Bauablaufplan des AN. (Ein detaillierter Bauablaufplanentwurf kann eingesehen werden.)

K:\Projekte.STB\19-1379.02\01 GE\07 Ablauf\Bauablauf\BauAblauf05-191379_02-5-21.mpp Mit 03.06.26 Seite 1 von 1

K:\Projekte.STB\19-1379.02\01 GE\07 Ablauf\Bauablauf\BauAblauf05-191379_02-5-21.mpp Mit 03.06.26 Seite 1 von 1

K:\Projekte STB\19-1379_02\01 GE\07 Ablauf\Bauablauf\BauAblauf05-191379_02-5-21.mpp Mit 03.06.26

ICN Ingenieure GmbH

Koordinierungsmaßnahme
"Erneuerung Mecklenburgstraße"
(Verkehrsanlagen / Niederschlagsentwässerung / Fernwärme / NS+MS / TK/ND Gas)
Entwurf Bauablaufplan 05

Bearbeitungsstand 01 : 10. KW 2026
Entwurf 03: 12./13. KW 2026
Entwurf 04 : 19. KW 2026
Entwurf 05 : 20. KW 2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Jahr 2																																				Jahr 3																																																																																																							
			Monat -2			Monat -1			Monat 1			Monat 2			Monat 3			Monat 4			Monat 5			Monat 6			Monat 7			Monat 8			Monat 9			Monat 10			Monat 11			Monat 12			Monat 13			Monat 14			Monat 15			Monat 16			Monat 17			Monat 18			Monat 19			Monat 20			Monat 21			Monat 22			Monat 23			Monat 24			Monat 25			Monat 26			Monat 27			Monat 28			Monat 29			Monat 30																																														
			-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
1	Auftragserteilung durch AG's	2 Wochen																																																																																																																																												
2	Durchführung Bauanlaufberatung	1,4 Wochen																																																																																																																																												
3	VRAO-Beantragung durch AN	3,5 Wochen																																																																																																																																												
4	Einrichtung Halteverbote	1 Tag																																																																																																																																												
5	Baustelleneinrichtung, Beginn Vollsperrung	1 Tag																																																																																																																																												
6	1. BA Teil 1 (ca. 95m)	34,6 Wochen																																																																																																																																												
43	1.BA Teil 2 (ca. 54m)	33,3 Wochen																																																																																																																																												
72	2.BA Teil 1 (ca. 185,5m)	63,3 Wochen																																																																																																																																												
104	2.BA Teil 2 (ca. 22,5m)	4,4 Wochen																																																																																																																																												
111	3.BA (ca. 163m Mecklenburgstr.+ ca. 60m H.-Mann-Str.)	53,2 Wochen																																																																																																																																												
112	Rückbau Oberflächen komplett + Herstellung Baustraße + Interimswegbef.	2 Wochen																																																																																																																																												
113	Suchschachtungen in der geplanten FW-Trasse	1 Woche																																																																																																																																												
114	Herstellung FWL-Graben Mitte Lieferbereich REWE - Zufahrt IHK	3 Wochen																																																																																																																																												
115	FWL-Herstellung inkl. Düker, U-Dehner und Abzweiger	8 Wochen																																																																																																																																												
116	Verfüllung Rohrgraben	2 Wochen																																																																																																																																												
117	Herstellung FW-Graben H.-Mann-Str. West	1 Woche																																																																																																																																												
118	FWL-Herstellung H.-Mann-Str. West	1 Woche																																																																																																																																												
119	Verfüllung Rohrgraben West	1 Tag																																																																																																																																												
120	Herstellung FW-Graben H.-Mann-Str. Ost	1 Woche																																																																																																																																												
121	FWL-Herstellung H.-Mann-Str. Ost	1 Woche																																																																																																																																												
122	Verfüllung Rohrgraben Ost	1 Tag																																																																																																																																												
123	Rohgrabenherstellung für FW-HA Haus 66	2 Tage																																																																																																																																												
124	FW-HA Haus 66	3 Tage																																																																																																																																												
125	Rohgrabenverfüllung FW-HA Haus 66	1 Tag																																																																																																																																												
126	Rohgrabenherstellung für FW-HA-Vorstreckung (ohne potentiell 3 FW-HA)	3 Tage																																																																																																																																												
127	FW-HA- Vorstreckung Herstellung	4 Tage																																																																																																																																												
128	Rohgrabenverfüllung FW-HA- Vorstreckung	1 Tag																																																																																																																																												
129	Erneuerung Gas-HA Haus Nr. 91+89 inkl. Erdarbeiten	1,25 Wochen																																																																																																																																												
130	Herstellung Querungen TK+ Licht	2 Tage																																																																																																																																												
131	Herstellung Querungen NS+MS+TK+Licht etc. Meckl.-und H.-Mann-Str. kom	1 Woche																																																																																																																																												
132	Einbau RW-AL Ost + Abläufe/Einlaufkästen inkl. Vorstrecken West Mecklen	1 Woche																																																																																																																																												
133	Einbau ungeb. Tragschichten in Fahrbahn und östl. Parkstr. Mecklenburgstr	4 Tage																																																																																																																																												
134	Verlegung MS+NS Ost Mecklenburgstr. + nördl. NS in H.-Mann-Str. Ost	3 Tage																																																																																																																																												
135	Verlegung TK+ NS Ost Mecklenburgstr. + südl. in H.-Mann-Str. Ost	3 Tage																																																																																																																																												
136	Verlegung Beleuchtung Ost	4 Tage																																																																																																																																												
137	Einbau RW-AL + Abläufe u. Einlaufkästen H.-Mann-Str. Ost	3 Wochen																																																																																																																																												
138	Einbau ungeb. Tragschichten in Fahrbahn und Parkstr. H.-Mann-Str. Ost	1,5 Wochen																																																																																																																																												
139	Einbau Bord Ost Mecklenburgstr.	2 Wochen																																																																																																																																												
140	Pflasterung Parkstreifen Ost Mecklenburgstr. Inkl. Aushärtung	6 Wochen																																																																																																																																												
141	Einbau nördl. + südl. Bord H.-Mann-Str. Ost	6 Tage																																																																																																																																												
142	Hertstellung Gehweg Ost Mecklenburgstr. + Nord H.-Mann-Str. Ost	2,5 Wochen																																																																																																																																												
143	Hertstellung Gehweg Ost Mecklenburgstr. inkl. Beleuchtung + Süd H.-Mann	2,5 Wochen																																																																																																																																												
144	Fertigstellung RW-AL West + Abläufe	4 Tage																																																																																																																																												
145	Einbau ungeb. Tragschicht im westl. Parkstr. Mecklenburgstr.	1 Woche																																																																																																																																												
146	Verlegung TK+Licht West Mecklenburgstr. + nördl. TK in H.-Mann-Str. West	4 Tage																																																																																																																																												
147	Verlegung MS+TK+ NS+Licht West Mecklenburgstr. + südl. in H.-Mann-Str. V	1 Woche																																																																																																																																												
148	Einbau RW-AL + Abläufe H.-Mann-Str. West	1 Woche																																																																																																																																												
149	Einbau ungeb. Tragschichten in Fahrbahn und nördl. Parkstr. H.-Mann-Str. V	1 Woche																																																																																																																																												
150	Einbau Bord West Mecklenburgstr.	2 Wochen																																																																																																																																												
151	DBT + Pflasterung Parkstreifen + Rinne West Mecklenburgstr. Inkl. Aushärtu.	8 Wochen																																																																																																																																												
152	Einbau nördl. + südl. Bord H.-Mann-Str. West	1 Woche																																																																																																																																												
153	Hertstellung Gehweg + Traufstreifen West Mecklenburgstr. inkl. Beleuchtur	2,5 Wochen																																																																																																																																												
154	Hertstellung Gehweg + Traufstreifen West Mecklenburgstr. + Süd H.-Mann-	6 Wochen																																																																																																																																												
155	Herstellung gebundene Pflasterbefestigung (Aufpflasterung) H.-Mann-Str. C	7 Wochen																																																																																																																																												
156	Einbau ATS in durchgehender Fahrbahn	3 Tage																																																																																																																																												
157	Herstellung Pflaster in Fahrbahn und Parkstreifen u. Rinne Nord+Süd in H.-M	2 Wochen																																																																																																																																												
158	Herstellung Pflaster in Fahrbahn und Parkstreifen u. Rinne Nord+Süd in H.-M	2 Wochen																																																																																																																																												
159	Einbau ADS + Anpassung Schächte und Schieberkappen	7 Tage																																																																																																																																												
160	Herstellung Markierung	1,5 Wochen																																																																																																																																												
161	Beschilderung	3 Wochen																																																																																																																																												
162	Baumpflanzungen	1 Woche																																																																																																																																												
163	4. BA Teil 1 (ca. 91,5m)	24,9 Wochen																																																																																																																																												
187	5. BA Teil 1 (Querungsstelle West)	3,2 Wochen																																																																																																																																												
195	5. BA Teil 2 (Radweg-Graf-Schack-Allee und Querungsstelle Ost)	4,8 Wochen																																																																																																																																												
202	veranschlagte Fertigstellung (Berücksichtigung Feiertage=ja, Witterungspausen=nein)	1 Tag																																																																																																																																												

1.BA Teil 1 (ca. 95m)

1.BA Teil 2 (ca. 54m)

2.BA Teil 1 (ca. 185,5m)

2.BA Teil 2 (ca. 22,5m)

3.BA (ca. 163m Mecklenburgstr.+ ca. 60m H.-Mann-Str.)

4. BA Teil 1 (ca. 91,5m)

5. BA Teil 1 (Querungsstelle West)

5. BA Teil 2 (Radweg-Graf-Schack-Allee und Querungsstelle Ost)

1.BA Teil 2 (ca. 54m)

2.BA Teil 1 (ca. 185,5m)

2.BA Teil 2 (ca. 22,5m)

4. BA Teil 1 (ca. 91,5m)

5. BA Teil 1 (Querungsstelle West)


5. BA Teil 2 (Radweg-Graf-Schack-Allee und Querungsstelle Ost)

Der vorliegende Entwurf des Bauablaufs stellt tech-
nologische Überlegungen des Planers und AG's dar
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es erfolgte hierbei lediglich eine Berücksichtigung
von Feiertagen sowie von Baupausen Weihnachten/
Neujahr, jedoch keiner evtl. witterungsbedingten
Bauunterbrechungen.
Der Entwurf des Bauablaufplans ersetzt nicht den Bauab-
laufplan des AN.

K:\Projekte.STB\19-1379.02\01 GE\07 Ablauf\Bauablauf\Bauablauf05-191379_02-5-21.mpp

Mit 03.06.26

Seite 1 von 1

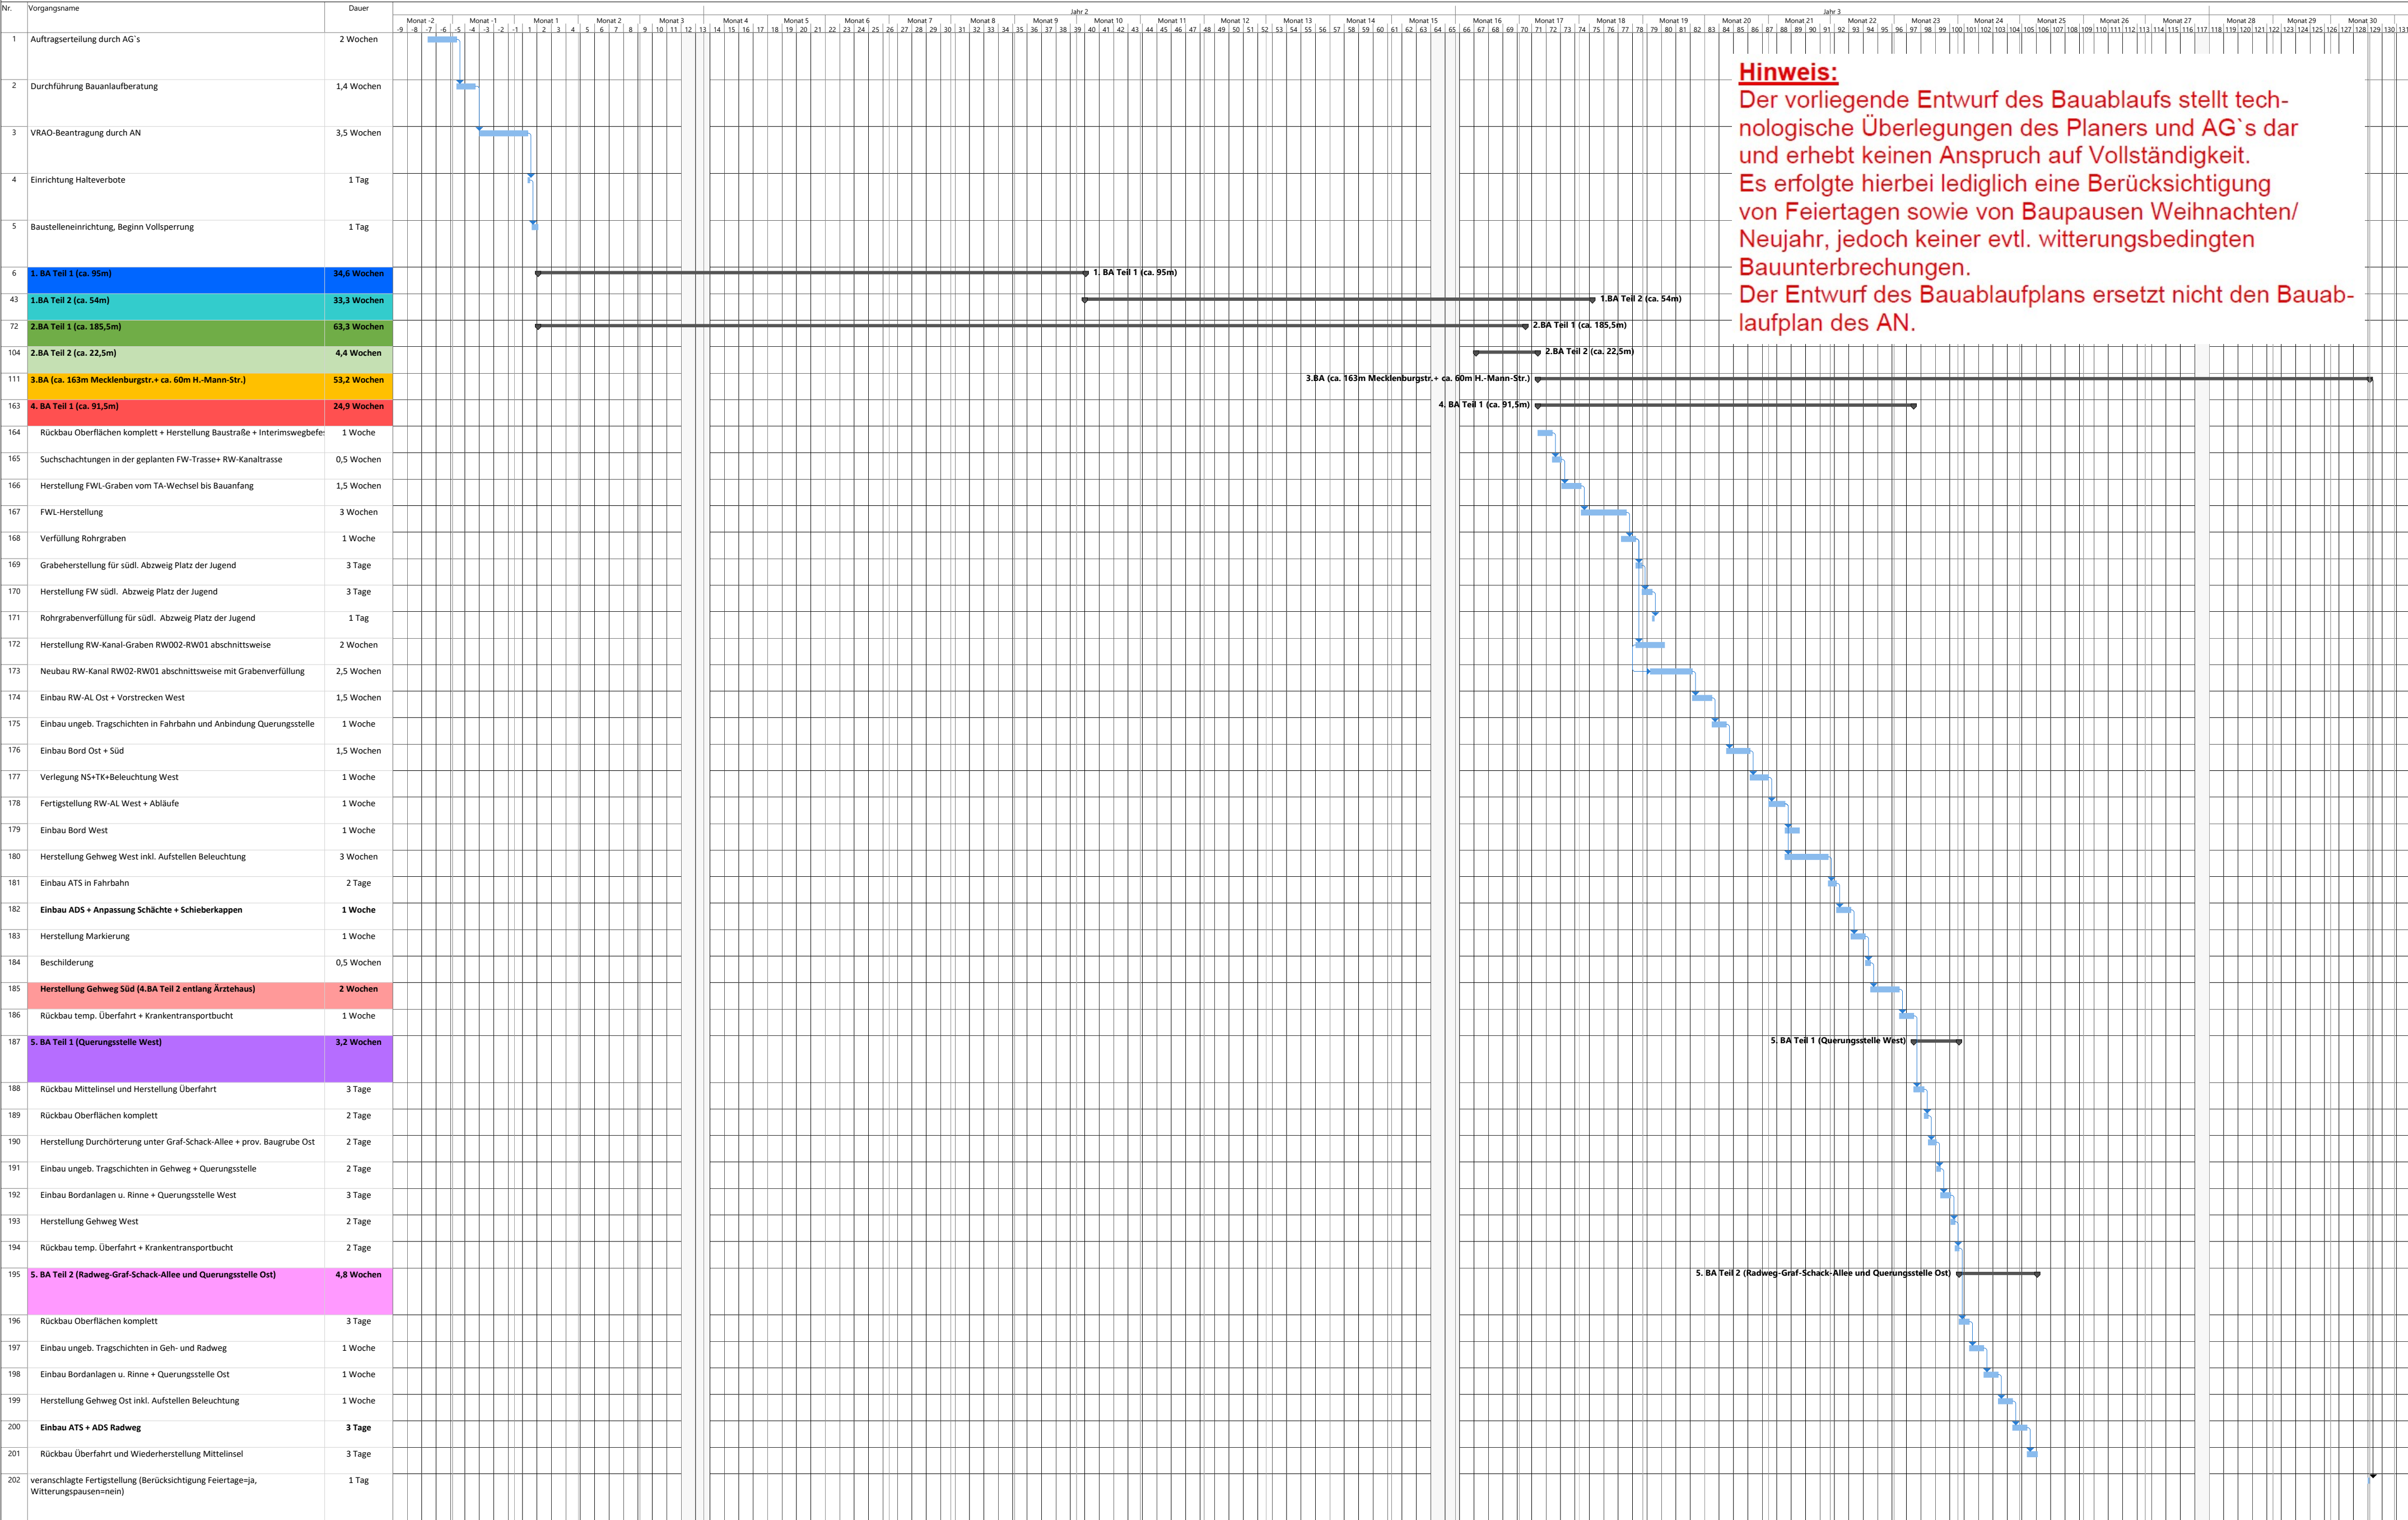

Hinweis:
Der vorliegende Entwurf des Bauablaufs stellt tech-
nologische Überlegungen des Planers und AG's dar
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es erfolgte hierbei lediglich eine Berücksichtigung
von Feiertagen sowie von Baupausen Weihnachten/
Neujahr, jedoch keiner evtl. witterungsbedingten
Bauunterbrechungen.
Der Entwurf des Bauablaufplans ersetzt nicht den Bauab-
laufplan des AN.
