


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	mber 2026														Oktober 2026						
					03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21				
1	HTC Uhlenhorst Außenanlagen	234 Tage	Fre 04.09.26	Mit 28.07.27	<div><div></div></div>																				
2	Vorabmaßnahme	22 Tage	Fre 04.09.26	Mon 05.10.26	<div><div></div></div>																				
3	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Fre 04.09.26	Mon 07.09.26	<div><div></div></div>																				
4	Abbruch befestigte Flächen	1 Tag	Die 08.09.26	Die 08.09.26	<div><div></div></div>																				
5	Suchschachtung Bereich Rigole	1 Tag	Mit 09.09.26	Mit 09.09.26	<div><div></div></div>																				
6	Erdarbeiten Rigolen	4 Tage	Mit 09.09.26	Mon 14.09.26	<div><div></div></div>																				
7	Montage Rigole + Sedimentationsanlag	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	<div><div></div></div>																				
8	Verfüllen	4 Tage	Die 29.09.26	Fre 02.10.26	<div><div></div></div>																				
9	Baustraße wiederherstellen	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26	<div><div></div></div>																				
10	Hauptmaßnahme	52 Tage	Mon 03.05.27	Die 13.07.27																					
49	Sonstiges	15 Tage	Don 08.07.27	Mit 28.07.27																					

<div> <div>Projekt: 260624-HTCU-BZP-Au</div> <div>Datum: Mit 24.06.26</div> </div>	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Ende		Manueller Fortschritt	
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge			

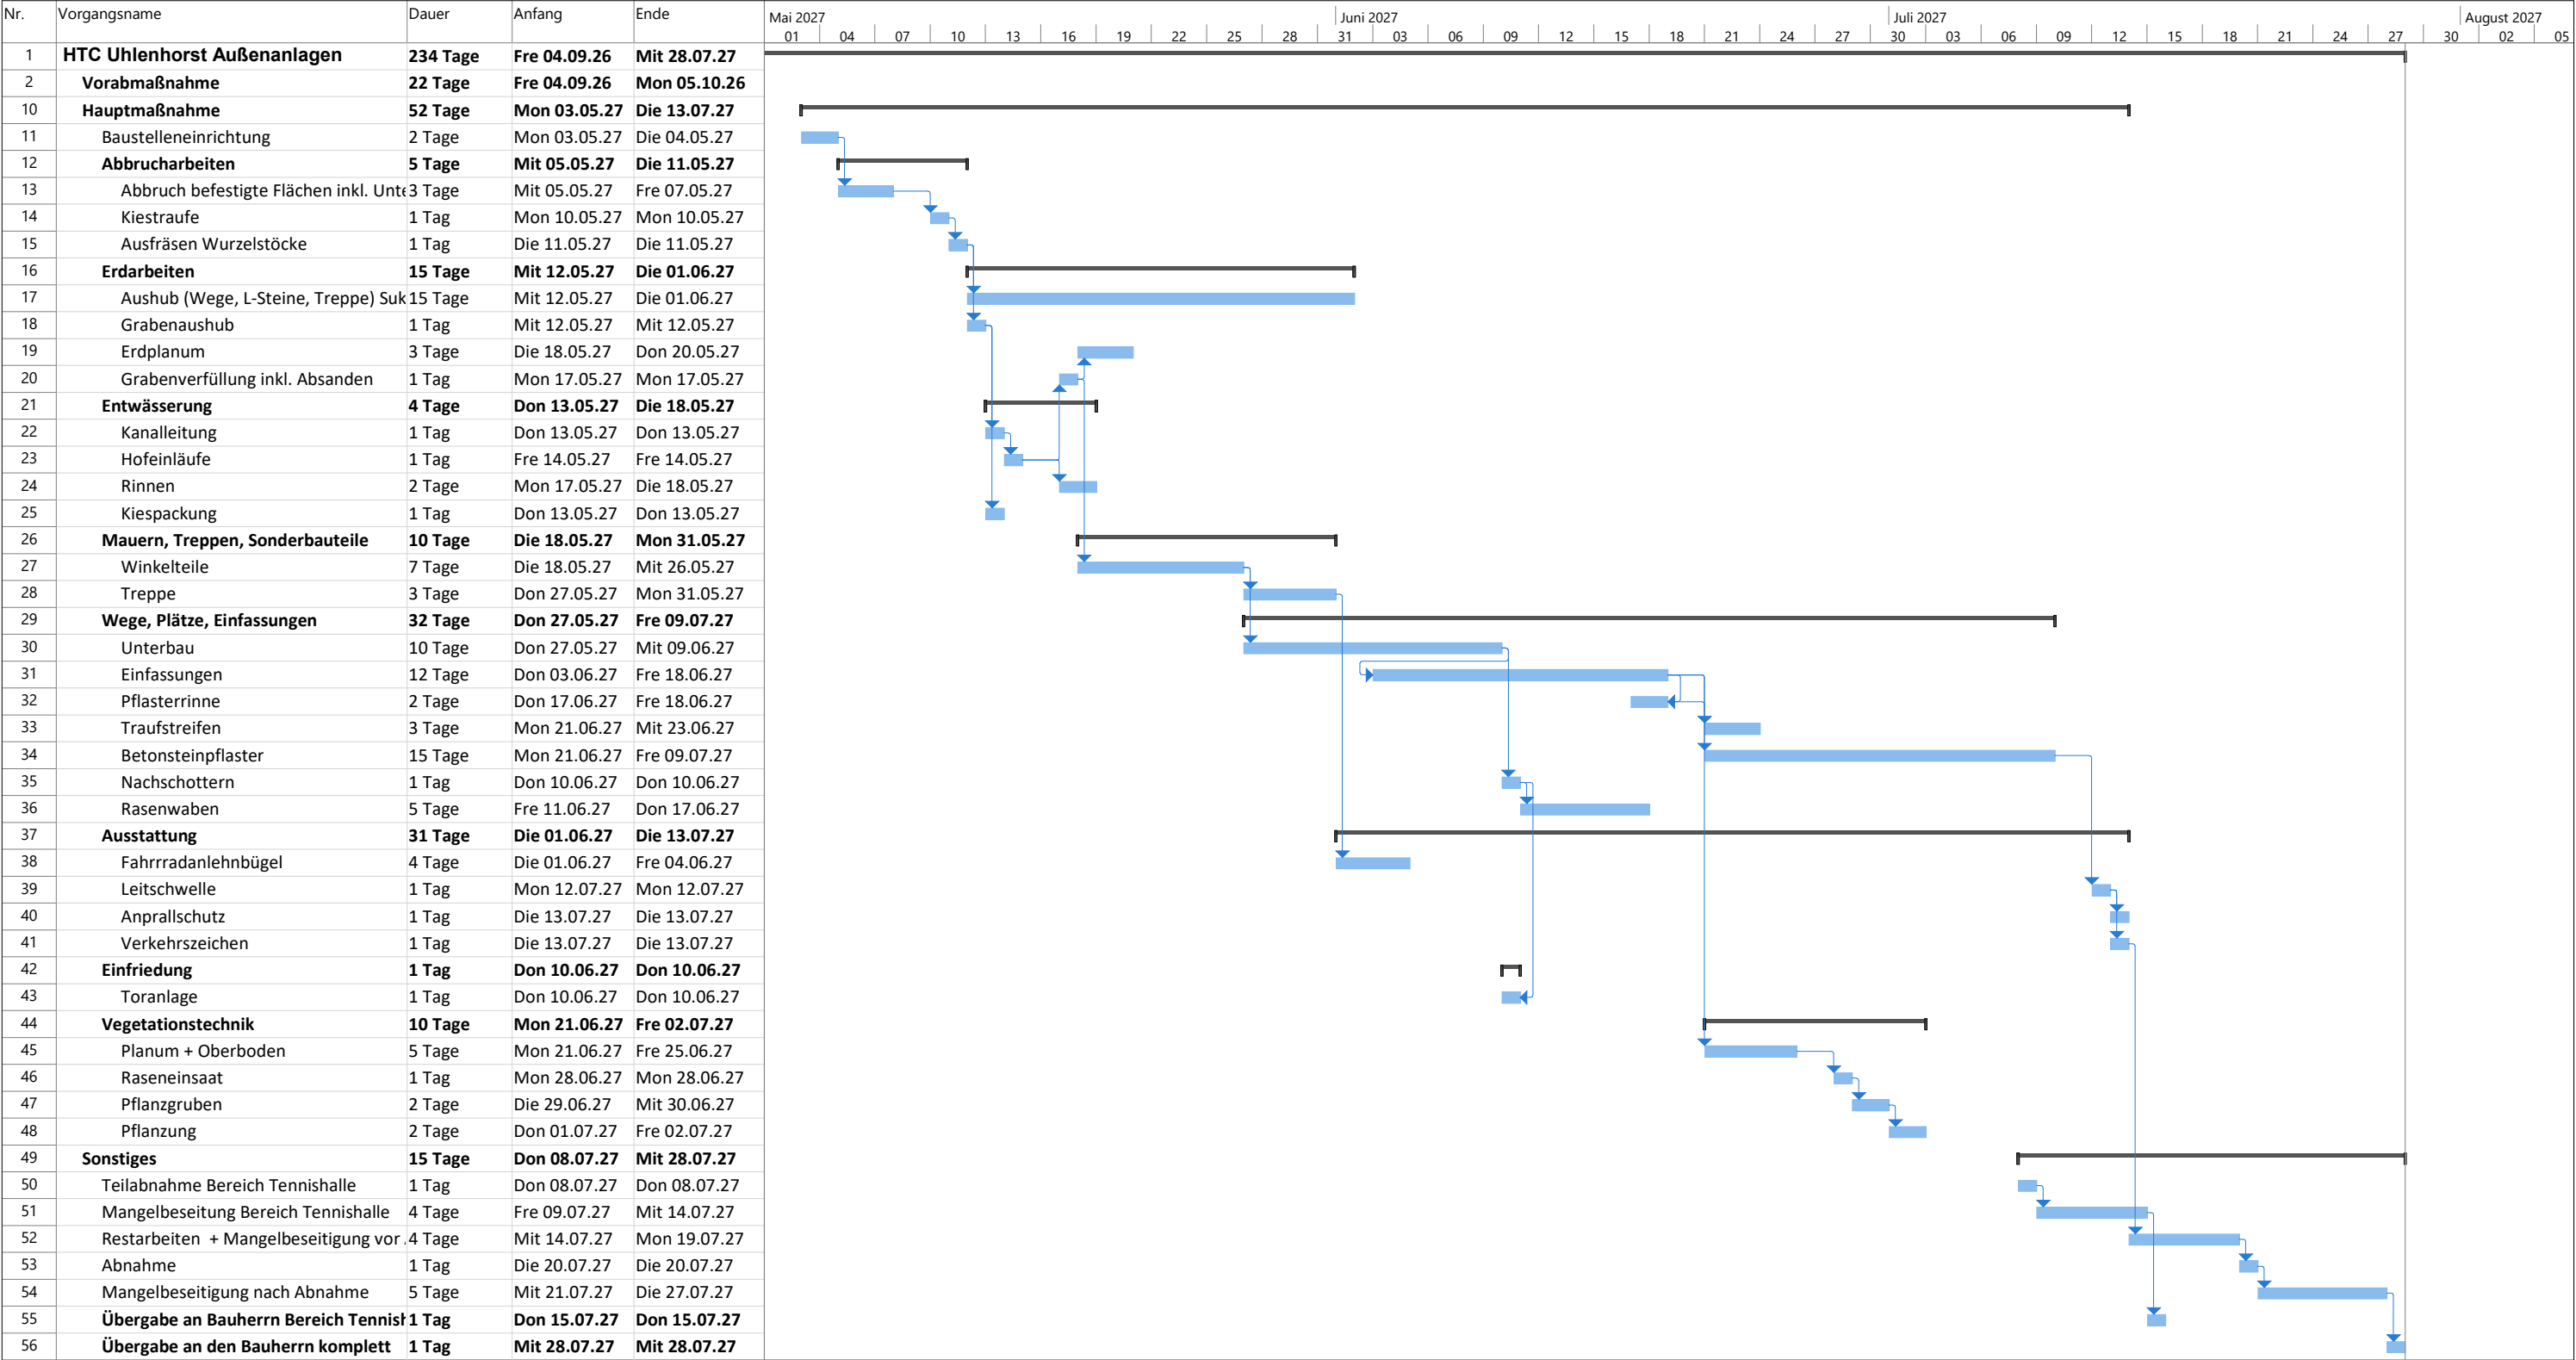

Projekt: 260624-HTCU-BZP-Au Datum: Mit 24.06.26	Vorgang	<div></div>	Sammelvorgang	<div></div>	Inaktiver Meilenstein	<div></div>	Nur Dauer	<div></div>	Nur Anfang	<div></div>	Externer Meilenstein	<div></div>	Manueller Fortschritt	<div></div>
	Unterbrechung	<div></div>	Projektsammelvorgang	<div></div>	Inaktiver Sammelvorgang	<div></div>	Manueller Sammelrollup	<div></div>	Nur Ende	<div></div>	Stichtag	<div></div>		
	Meilenstein	<div></div>	Inaktiver Vorgang	<div></div>	Manueller Vorgang	<div></div>	Manueller Sammelvorgang	<div></div>	Externe Vorgänge	<div></div>	In Arbeit	<div></div>		
