


Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	25																											
							Hälfte 1, 2026							Hälfte 2, 2026							Hälfte 1, 2027							Hälfte 2, 2027						
							S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A				
1	📌	Projektkonzeption	1 Tag	Die 25.02.25	Die 25.02.25																													
8	➡	Vorentwurfsplanung	86 Tage	Mit 26.02.25	Mit 02.07.25																													
19	➡	Entwurfsplanung	93 Tage	Don 15.05.25	Mit 24.09.25																													
28	➡	Genehmigungsplanung Abriss	81 Tage	Don 03.07.25	Fre 24.10.25																													
32	➡	Genehmigungsplanung Neubau	102 Tage	Mon 08.09.25	Mit 11.02.26																													
42	➡	Genehmigungsplanung Container	128 Tage	Don 15.05.25	Fre 14.11.25																													
49	➡	Ausführungsplanung	104 Tage	Mit 19.11.25	Mit 29.04.26																													
62	➡	Bauvorbereitung	414 Tage	Die 07.01.25	Die 08.09.26																													
191	➡	REALISIERUNG	609 Tage	Don 27.03.25	Die 14.09.27																													
192	➡	Containergestellung	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25																													
194	➡	Umbau Sporthalle	58 Tage	Mon 15.12.25	Die 17.03.26																													
213	➡	Anbau Lager Sporthalle	64 Tage	Mon 18.05.26	Fre 14.08.26																													
214	📅	Erd- und Betonarbeiten	34 Tage	Mon 18.05.26	Fre 03.07.26																													
215	➡	Zimmer- und Stahlarbeiten	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	214EA+5 Tage																												
216	➡	Fassadenarbeiten	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	215																												
217	➡	Dacharbeiten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	215																												
218	➡	Abbrucharbeiten Außenwand	5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26	223AE																												
219	➡	Trockenbauarbeiten	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	217																												
220	➡	Anputzarbeiten	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	219																												
221	➡	Einbau Stahlrahmen	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26	220																												
222	➡	Einbau Heizleitungen, Heizkörper, Elektro	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	219AA																												
223	➡	Estricharbeiten	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	222																												
224	➡	Einbau Tore	3 Tage	Fre 07.08.26	Die 11.08.26	223EA+3 Tage																												
225	➡	Bodenbelagsarbeiten	2 Tage	Die 11.08.26	Mit 12.08.26	223EA+5 Tage																												
226	➡	Spachtel- und Malerarbeiten	2 Tage	Don 13.08.26	Fre 14.08.26	225																												
227	➡	Abrissarbeiten	45 Tage	Mon 05.01.26	Fre 06.03.26																													
230	➡	Baustelleneinrichtung Neubau	230 Tage	Mon 02.03.26	Fre 05.02.27																													
231	➡	Erstellung Baustraße	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	229EE																												
232	➡	Aufbau Sanitärcontainer	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	234AA																												
233	➡	Herstellung Untergrund Kran	2 Tage	Mit 08.04.26	Fre 10.04.26	235AE																												
234	📅	Baustelleneinrichtung Tiefbau	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	238AE																												
235	📅	Aufbau Kran	1 Tag	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26																													
236	➡	Abbau Kran	2 Tage	Don 04.02.27	Fre 05.02.27	339;336;335																												
237	➡	Vermessungsarbeiten	27 Tage	Don 19.03.26	Mit 29.04.26																													
240	➡	Erdarbeiten, Abwasserkanalarbeiten	76 Tage	Mon 23.03.26	Mon 13.07.26																													
241	📌	Aushub Baugrube	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26																													
242	➡	Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Fundam.	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	241																												
243	➡	Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Bodenplatte	3 Tage	Mit 29.04.26	Mon 04.05.26	264																												
244	➡	Verlegung Grundleitungen unterhalb Gebäude	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26	243																												
245	➡	Feinplanum UK Dämmung Bodenplatte	2 Tage	Die 12.05.26	Mit 13.05.26	244																												

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	25																							
							Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027													
							S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
246	➤	Auffüllung Fundamentgräben, BA 1	1 Tag	Die 30.06.26	Die 30.06.26																									
247	➤	Auffüllung Fundamentgräben, BA 2	1 Tag	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	244																								
248	➤	Blitzschutz- und Erdungsarbeiten	445 Tage	Don 27.03.25	Don 21.01.27																									
249	➤	Ringleitungserder	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	241																								
250	➤	Fundamenterder	2 Tage	Don 27.03.25	Fre 28.03.25																									
251	➤	Blitzschutzarbeiten (unter) Fassade	10 Tage	Die 13.10.26	Die 27.10.26	349AE																								
252	➤	Fangleitungen Dach	5 Tage	Fre 15.01.27	Don 21.01.27	322																								
253	➤	Betonarbeiten	117 Tage	Die 07.04.26	Die 22.09.26																									
254	➤	Baustelleneinrichtung	9 Tage	Die 07.04.26	Fre 17.04.26																									
255	➤	Unterfahrt Aufzug	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26																									
256	➤	Streifenfundamente Takt 1 (9-19)	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26																									
257	➤	Fundamente und Unterfahrt	16 Tage	Die 07.04.26	Die 28.04.26																									
265	➤	Bodenplatte, BA 1	12 Tage	Mon 18.05.26	Mit 03.06.26																									
269	➤	Bodenplatte, BA 2	17 Tage	Don 28.05.26	Son 21.06.26																									
273	➤	Wände, Decken BA 1, Achse 12-19	50 Tage	Mon 01.06.26	Fre 07.08.26																									
274	➤	Takt 1, TRH 2, Achse 17-19	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 03.07.26	267																								
275	➤	Takt 2, Aufzug Achse 15/D	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	274																								
276	➤	Takt 3, Wände Achse 13-15, C-E	8 Tage	Mon 13.07.26	Mit 22.07.26	275EA-5 Tage																								
277	➤	Takt 4, Wände Achse 12-13, C-E	8 Tage	Mon 20.07.26	Mit 29.07.26	276EA-3 Tage																								
278	➤	Takt 5, Wände Achse 13-14, A-G + Wand Achse 8, E-G	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	277EA-3 Tage																								
279	➤	Wände, Decken BA 2, Achse 1-8	23 Tage	Mon 10.08.26	Mit 09.09.26																									
280	➤	Takt 6, TRH 1 Achse 1-3	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	278																								
281	➤	Takt 7, F60 Wand Achse 5-6, E-G	8 Tage	Mit 26.08.26	Mit 02.09.26	280EA-3 Tage																								
282	➤	Takt 8, Wände Achse 6-8, C-E	8 Tage	Mon 31.08.26	Mit 09.09.26	281EA-3 Tage																								
283	➤	Treppen	20 Tage	Die 25.08.26	Die 22.09.26																									
284	➤	Einbau Fertigteile TRH 2	2 Tage	Die 25.08.26	Don 27.08.26	274;304AE																								
285	➤	Einbau Fertigteile TRH 1	2 Tage	Fre 18.09.26	Die 22.09.26	280;309AE																								
286	➤	Einbau Fertigteile Haupttreppe	2 Tage	Don 10.09.26	Fre 11.09.26	282																								
287	➤	Gerüste Holzbau	111 Tage	Mon 10.08.26	Mon 25.01.27																									
288	➤	Aufbau Außengerüst EG	3 Tage	Mon 10.08.26	Don 13.08.26	303AE																								
289	➤	Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Don 03.09.26	Die 08.09.26	308AE;306AE																								
290	➤	Aufbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 07.09.26	Die 08.09.26	308AE;306AE																								
291	➤	Abbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 18.01.27	Die 19.01.27	393AE																								
292	➤	Abbau Außengerüste	3 Tage	Don 21.01.27	Mon 25.01.27	322;349;331																								
293	➤	Holzbauarbeiten	113 Tage	Die 12.05.26	Mon 19.10.26																									
294	➤	Abstimmung Werkplanung mit AN	15 Tage	Die 12.05.26	Don 04.06.26	296AE																								
295	➤	Abstimmung Werkplanung mit AN	15 Tage	Die 12.05.26	Don 04.06.26	296AE																								
296	➤	Prüfstatiker	20 Tage	Don 04.06.26	Don 02.07.26	297AE																								
297	➤	Bestellung Holz	0 Tage	Don 02.07.26	Don 02.07.26	298AE																								
298	➤	Lieferzeit Holz	5 Tage	Don 02.07.26	Don 09.07.26	299AE																								
299	➤	Abbund HRB inkl. Fassade	25 Tage	Don 09.07.26	Don 13.08.26	303AE																								
300	➤	Abbund Kassettendecken	35 Tage	Don 09.07.26	Don 27.08.26	304AE																								
301	➤	Richten BA 1	18 Tage	Mon 10.08.26	Mit 02.09.26																									

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	25																				
							S	O	N	D	Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027					Hälfte 2, 2027		
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	
302	→	Nivellierschwellen	3 Tage	Mon 10.08.26	Don 13.08.26	303AE																					
303	→	Wände / Stützen aufstellen	10 Tage	Don 13.08.26	Mit 26.08.26																						
304	→	Kassettendecken Montage	3 Tage	Don 27.08.26	Mon 31.08.26	303																					
305	→	Witterungsschutz	2 Tage	Die 01.09.26	Mit 02.09.26	304																					
306	→	Richten BA 2	18 Tage	Don 03.09.26	Mon 28.09.26	305																					
307	→	Nivellierschwellen	3 Tage	Don 03.09.26	Mon 07.09.26	303AE																					
308	→	Wände / Stützen aufstellen	10 Tage	Die 08.09.26	Mon 21.09.26	307																					
309	→	Kassettendecken Montage	3 Tage	Die 22.09.26	Don 24.09.26	308																					
310	→	Witterungsschutz	2 Tage	Fre 25.09.26	Mon 28.09.26	309																					
311	→	Dach	9 Tage	Mit 07.10.26	Mon 19.10.26	310																					
312	→	Montage Attika	9 Tage	Mit 07.10.26	Mon 19.10.26	318																					
313	→	Dachkränze Ausstieg, RWA	2 Tage	Mit 07.10.26	Don 08.10.26	312AA																					
314	→	Dachabdichtungsarbeiten	125 Tage	Fre 10.07.26	Don 14.01.27																						
315	→	Abstimmung RWA-Anlage	10 Tage	Fre 10.07.26	Fre 24.07.26	316AE																					
316	→	Fertigung RWA-Anlage	45 Tage	Fre 24.07.26	Fre 25.09.26	317AE																					
317	→	Einbau RWA-Anlagen, Dachausstieg	5 Tage	Fre 25.09.26	Don 01.10.26	309																					
318	→	Dampfbremse Dach	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	317AA+3 Tage																					
319	→	Hochführen Damfbremse Attika	5 Tage	Die 20.10.26	Mon 26.10.26	312																					
320	→	Dämmung Flachdächer	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	319																					
321	→	Abdichtung Flachdächer	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	320																					
322	→	Attika, Klempnerarbeiten	8 Tage	Die 05.01.27	Don 14.01.27	349																					
323	→	Gründach, UK PV-Anlage	69 Tage	Die 24.11.26	Fre 12.03.27																						
324	→	Schutzvlies	5 Tage	Die 24.11.26	Mon 30.11.26	321																					
325	→	Einbau Feuchtwächter	5 Tage	Die 01.12.26	Mon 07.12.26	324																					
326	→	Einbau Dachgeländer	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	324																					
327	→	Speichermatten	5 Tage	Don 03.12.26	Mit 09.12.26	326AA+2 Tage																					
328	→	Vlies, Pflanzpads	5 Tage	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	327																					
329	→	Unterbau Plattenbeläge	5 Tage	Don 17.12.26	Mit 06.01.27	328																					
330	→	Plattenbeläge	5 Tage	Don 07.01.27	Mit 13.01.27	329																					
331	→	Einbau Substrat	10 Tage	Don 07.01.27	Mit 20.01.27	329																					
332	→	Einsaat, Fertigstellungspflege	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27																						
333	→	Dachausstieg, Rauchabzüge	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26																						
334	→	Montage Rauchabzug Aula	3 Tage	Mit 07.10.26	Fre 09.10.26	318																					
335	→	Montage Rauchabzug Aufzug	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26	318																					
336	→	Montage Dachausstieg	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26	318																					
337	→	PV-Anlage	42 Tage	Die 24.11.26	Mit 03.02.27																						
338	→	Montage UK	3 Tage	Die 24.11.26	Don 26.11.26	324AA																					
339	→	Montage PV-Anlage	10 Tage	Don 21.01.27	Mit 03.02.27	331																					
340	→	Fenster / Türen / PR-Fassade	106 Tage	Mon 15.06.26	Mon 09.11.26																						
341	→	Montageplanung	10 Tage	Mon 15.06.26	Mon 29.06.26	342AE																					
342	→	Überarbeitung / Freigabe	5 Tage	Mon 29.06.26	Mon 06.07.26	343AE																					
343	→	Profilbestellung und Prüfung	1 Tag	Mon 06.07.26	Die 07.07.26	344AE																					
344	→	Fertigung	60 Tage	Die 07.07.26	Die 29.09.26	345AE																					
345	→	Einbau Fenster / Türen	20 Tage	Die 29.09.26	Mon 26.10.26	310																					

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	25																							
							Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027														
							S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
429	→	Einbau Innentüren	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27	428;423																								
430	→	Tischlerarbeiten	120 Tage	Mit 06.01.27	Mon 28.06.27																									
431	→	Montageplanung	30 Tage	Mit 06.01.27	Mit 17.02.27	432AE																								
432	→	Prüfung/ Freigabe	10 Tage	Mit 17.02.27	Mit 03.03.27	433AE																								
433	→	Produktion	60 Tage	Mit 03.03.27	Die 01.06.27	434AE																								
434	→	Einbau Garderoben, Einbauschränke	20 Tage	Die 01.06.27	Mon 28.06.27	407;416																								
435	→	Küchenzeilen	90 Tage	Mit 03.02.27	Mon 14.06.27																									
436	→	Montageplanung Küchen	30 Tage	Mit 03.02.27	Mit 17.03.27	437AE																								
437	→	Freigabe	5 Tage	Mit 17.03.27	Mit 24.03.27	438AE																								
438	→	Vorproduktion Küchen	45 Tage	Mit 24.03.27	Die 01.06.27	439AE																								
439	→	Einbau Küchen	10 Tage	Die 01.06.27	Mon 14.06.27	416																								
440	→	Fein- und Endmontage TGA	58 Tage	Die 27.04.27	Mon 19.07.27																									
441	→	Heizung	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27																									
442	→	Endmontage Heizung	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27	407;416																								
443	→	Lüftung	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27																									
444	→	Endmontage Lüftung	30 Tage	Die 01.06.27	Mon 12.07.27	416																								
445	→	Inbetriebnahme Lüftung	5 Tage	Die 13.07.27	Mon 19.07.27	444																								
446	→	Sanitär	43 Tage	Die 27.04.27	Mon 28.06.27																									
447	→	Endmontage, Objekte	35 Tage	Die 27.04.27	Mit 16.06.27	411																								
448	→	Anschluss Küchenmöbel	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	439																								
449	→	ggf. Nachbeprobung	5 Tage	Die 22.06.27	Mon 28.06.27	448																								
450	→	Gebäudeautomation	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27																									
451	→	Endmontage GA	15 Tage	Die 01.06.27	Mon 21.06.27	407;416																								
452	→	Inbetriebnahme GA	20 Tage	Die 22.06.27	Mon 19.07.27	451																								
453	→	Elektro	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27																									
454	→	Endmontage Elektro	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27	407;416																								
455	→	Endmontage Brandmeldeanlage	15 Tage	Die 01.06.27	Mon 21.06.27	407;416																								
456	→	Außenarbeiten	155 Tage	Die 24.11.26	Fre 16.07.27																									
457	→	Abstimmung, Werkplanung	35 Tage	Die 24.11.26	Die 26.01.27	458AE																								
458	→	Vorbereitende Arbeiten	20 Tage	Die 26.01.27	Mon 22.02.27	292																								
459	→	Unterbau	20 Tage	Die 23.02.27	Mon 22.03.27	458																								
460	→	Oberflächen	60 Tage	Die 23.03.27	Fre 18.06.27	459																								
461	→	Anpflanzungen / Außenmöblierung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27	460																								
462	→	Abnahmen / Endreinigung	26 Tage	Die 20.07.27	Die 24.08.27																									
463	→	Grobreinigung	3 Tage	Die 20.07.27	Don 22.07.27	430;435;440;419;																								
464	→	Sachverständigenprüfung BMA + Sicherheitsbeleuchtung	2 Tage	Fre 23.07.27	Mon 26.07.27	463;452																								
465	→	Abnahme Lüftung (Dekra)	2 Tage	Fre 23.07.27	Mon 26.07.27	445;463																								
466	→	Abnahme Brandschutzprüfer	2 Tage	Fre 23.07.27	Mon 26.07.27	463;452																								
467	→	Endabnahmen Firmen	5 Tage	Die 27.07.27	Mon 02.08.27	466																								
468	→	Mangelbeseitigung	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27	467																								
469	→	Endreinigung	5 Tage	Die 17.08.27	Mon 23.08.27	468																								

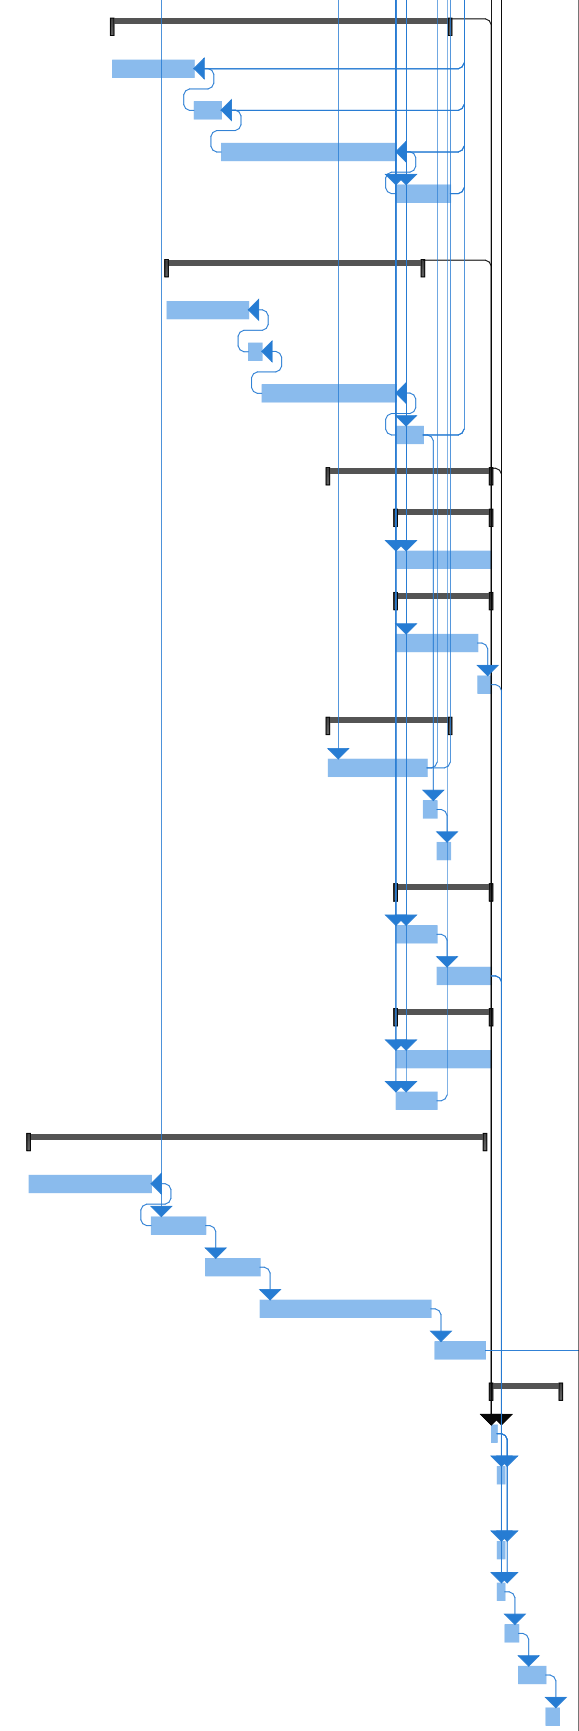

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	25																			
							S	O	N	D	Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027						
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
470		Abnahme Kreis Schleswig-Flensburg	0 Tage	Mon 23.08.27	Mon 23.08.27	469																				
471		Übergabe	1 Tag	Die 24.08.27	Die 24.08.27	470																				
472		Einrichtung	15 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27																					
473		Textilien	15 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27	471																				
474		Möblierung, lose	15 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27	471																				
475		Sichtschutz / Beklebungen / Schilder	15 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27	471																				
476		Schließanlage	5 Tage	Mit 25.08.27	Die 31.08.27	471																				
477		EINZUG	0 Tage	Die 14.09.27	Die 14.09.27	472;461																				
