
























































































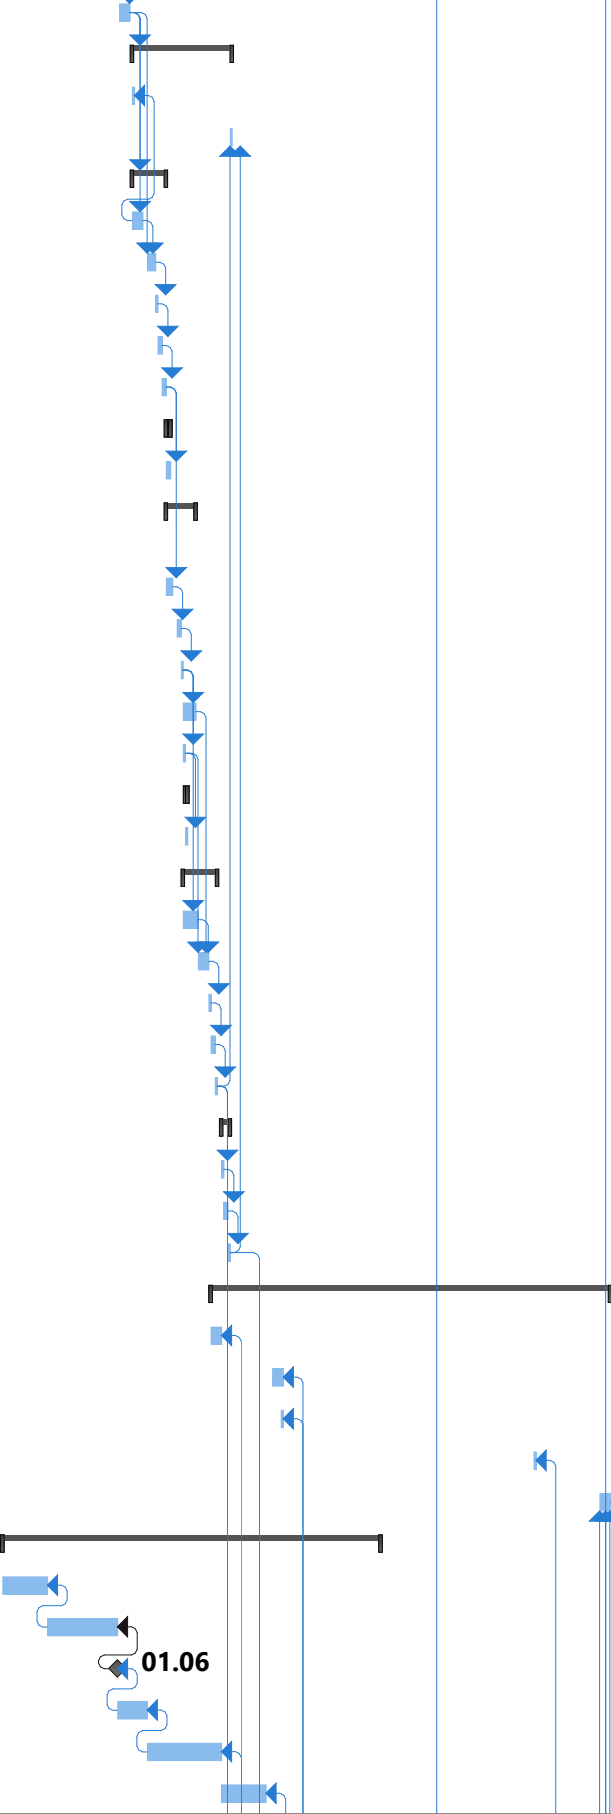




















































































Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 1, 2026												Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027					
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1			Projektkonzeption	1 Tag	Die 25.02.25	Die 25.02.25																							
8			Vorentwurfsplanung	86 Tage	Mit 26.02.25	Mit 02.07.25																							
19			Entwurfsplanung	93 Tage	Don 15.05.25	Mit 24.09.25																							
28			Genehmigungsplanung Abriss	81 Tage	Don 03.07.25	Fre 24.10.25																							
32			Genehmigungsplanung Neubau	102 Tage	Mon 08.09.25	Mit 11.02.26																							
42			Genehmigungsplanung Container	128 Tage	Don 15.05.25	Fre 14.11.25																							
49			Ausführungsplanung	99 Tage	Mit 19.11.25	Mit 22.04.26																							
62			Bauvorbereitung	252 Tage	Don 21.08.25	Die 01.09.26																							
198			REALISIERUNG	439 Tage	Mon 17.11.25	Die 31.08.27																							
199			Containergestellung	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25																							
201			Umbau Sporthalle	58 Tage	Mon 15.12.25	Die 17.03.26																							
202			Suchschachtungen	5 Tage	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25																							
203			Gebäude	49 Tage	Mon 05.01.26	Don 12.03.26																							
204			Abrissarbeiten	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26																							
205			Rohbauarbeiten	8 Tage	Mon 19.01.26	Mit 28.01.26	204																						
206			Einbau Fenster	3 Tage	Mon 19.01.26	Mit 21.01.26	204																						
207			Putz- und Spachtelarbeiten	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26	206;215;218																						
208			Estrichdämmung	2 Tage	Mon 16.02.26	Die 17.02.26	207;215;218																						
209			Estrich	1 Tag	Mit 18.02.26	Mit 18.02.26	208																						
210			Trocknung Estrich	10 Tage	Don 19.02.26	Sam 28.02.26	209																						
211			Einbau Türen	1 Tag	Die 24.02.26	Die 24.02.26	209EA+3 Tage																						
212			Fliesenarbeiten	6 Tage	Mon 02.03.26	Mon 09.03.26	210																						
213			Maler- und Tapezierarbeiten	3 Tage	Die 10.03.26	Don 12.03.26	212																						
214			Elektro	37 Tage	Mon 26.01.26	Die 17.03.26																							
215			Rohinstallation	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	205EA-3 Tage																						
216			Endmontage	3 Tage	Fre 13.03.26	Die 17.03.26	213																						
217			HLS	36 Tage	Mon 26.01.26	Mon 16.03.26																							
218			Rohinstallation	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26	205EA-3 Tage																						
219			Endmontage	5 Tage	Die 10.03.26	Mon 16.03.26	212																						
220			Anbau Lager Sporthalle	91 Tage	Die 07.04.26	Fre 14.08.26																							
221			Erd- und Betonarbeiten	15 Tage	Die 07.04.26	Mon 27.04.26	259AA																						
222			Zimmer- und Stahlarbeiten	15 Tage	Fre 08.05.26	Mon 01.06.26	221EA+7 Tage																						
223			Fassadenarbeiten	15 Tage	Die 02.06.26	Mon 22.06.26	222																						
224			Dacharbeiten	10 Tage	Die 02.06.26	Mon 15.06.26	222																						
225			Abbrucharbeiten Außenwand	2 Tage	Sam 04.07.26	Mon 06.07.26																							
226			Trockenbauarbeiten	2 Tage	Die 07.07.26	Mit 08.07.26	225;223																						
227			Anputzarbeiten	1 Tag	Don 09.07.26	Don 09.07.26	226																						
228			Einbau Stahlrahmen	2 Tage	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26	227																						
229			Einbau Heizleitungen, Heizkörper, Elektro	8 Tage	Die 14.07.26	Don 23.07.26	228																						
230			Estricharbeiten	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	229																						
231			Einbau Tore	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	230EA+3 Tage																						
232			Bodenbelagsarbeiten	2 Tage	Mon 10.08.26	Die 11.08.26	230EA+10 Tage																						
233			Spachtel- und Malerarbeiten	3 Tage	Mit 12.08.26	Fre 14.08.26	232																						

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5							Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027						
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
234			Abrissarbeiten	45 Tage	Mon 05.01.26	Fre 06.03.26																						
235			Baustelleneinrichtung	9 Tage	Mon 05.01.26	Don 15.01.26																						
236			Abrissarbeiten Schulgebäude	36 Tage	Fre 16.01.26	Fre 06.03.26	235																					
237			Baustelleneinrichtung Neubau	225 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.01.27																						
238			Erstellung Baustraße	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	236EE																					
239			Aufbau Sanitärcontainer	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	241AA																					
240			Herstellung Untergrund Kran	2 Tage	Mon 30.03.26	Mit 01.04.26	242AE																					
241			Baustelleneinrichtung Tiefbau	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	245AE																					
242			Aufbau Kran	2 Tage	Mit 01.04.26	Die 07.04.26	260AE																					
243			Abbau Kran	2 Tage	Don 28.01.27	Fre 29.01.27	350																					
244			Vermessungsarbeiten	27 Tage	Don 19.03.26	Mit 29.04.26																						
245			Grobabsteckung	2 Tage	Don 19.03.26	Mon 23.03.26	248AE																					
246			Feinabsteckung	2 Tage	Mon 27.04.26	Mit 29.04.26	250AE																					
247			Erdarbeiten, Abwasserkanalarbeiten	35 Tage	Mon 23.03.26	Mit 13.05.26																						
248			Aushub Baugrube	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26																						
249			Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Fundam.	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	248																					
250			Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Bodenplatte	3 Tage	Mit 29.04.26	Mon 04.05.26	266																					
251			Verlegung Grundleitungen unterhalb Gebäude	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26	250																					
252			Sauberkeitsschicht UK Dämmung Bodenplatte + Feinplanum	2 Tage	Die 12.05.26	Mit 13.05.26	251																					
253			Blitzschutz- und Erdungsarbeiten	196 Tage	Mon 30.03.26	Mon 18.01.27																						
254			Ringleitungserder	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	248																					
255			Fundamenterder	2 Tage	Mit 27.05.26	Fre 29.05.26	270AE																					
256			Blitzschutzarbeiten (unter) Fassade	10 Tage	Die 06.10.26	Die 20.10.26	360AE																					
257			Fangleitungen Dach	5 Tage	Die 12.01.27	Mon 18.01.27	330																					
258			Betonarbeiten	76 Tage	Die 07.04.26	Fre 24.07.26																						
259			Fundamente und Unterfahrt	16 Tage	Die 07.04.26	Die 28.04.26																						
260			Sauberkeitsschicht	2 Tage	Die 07.04.26	Mit 08.04.26	249																					
261			Schalung Fundamente + Unterfahrt	5 Tage	Don 09.04.26	Mit 15.04.26	260																					
262			Bewehrungsarbeiten Fundamente	4 Tage	Don 16.04.26	Die 21.04.26	261																					
263			Betonage Fundamente + Unterfahrt	3 Tage	Mit 22.04.26	Fre 24.04.26	262																					
264			Trocknung	2 Tage	Sam 25.04.26	Son 26.04.26	263																					
265			Ausschalen Fundamente	1 Tag	Mon 27.04.26	Mon 27.04.26	264																					
266			Perimeterdämmung aufgehende Bauteile	1 Tag	Die 28.04.26	Die 28.04.26	265																					
267			Bodenplatte	15 Tage	Fre 15.05.26	Sam 06.06.26	252																					
268			Dämmarbeiten Bodenplatte	4 Tage	Fre 15.05.26	Mit 20.05.26	252																					
269			Bewehrung Bodenplatte	5 Tage	Don 21.05.26	Don 28.05.26	268;266																					
270			Betonage Bodenplatte	2 Tage	Fre 29.05.26	Mon 01.06.26	269																					


Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027								
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
271			Trocknung	5 Tage	Die 02.06.26	Sam 06.06.26	270																					
272			Gerüste Rohbauarbeiten	35 Tage	Mon 08.06.26	Fre 24.07.26	271																					
273			Aufbau	1 Tag	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26	276AE																					
274			Abbau	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	296;300																					
275			Wände und Schwellen EG	12 Tage	Mon 08.06.26	Die 23.06.26	271																					
276			Schalung	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	271																					
277			Bewehrung	4 Tage	Mon 15.06.26	Don 18.06.26	276;271																					
278			Betonage	1 Tag	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26	277																					
279			Trocknung	2 Tage	Sam 20.06.26	Son 21.06.26	278																					
280			Ausschalen	2 Tage	Mon 22.06.26	Die 23.06.26	279																					
281			Haupttreppe (Fertigteile)	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26																						
282			Einbau	2 Tage	Mit 24.06.26	Don 25.06.26	280																					
283			Filigrandecken EG, Podeste (Fertigteile)	10 Tage	Mit 24.06.26	Die 07.07.26																						
284			Schalung	3 Tage	Mit 24.06.26	Fre 26.06.26	280																					
285			Bewehrung	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	284																					
286			Betonage	1 Tag	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	285																					
287			Trocknung	4 Tage	Don 02.07.26	Die 07.07.26	286																					
288			Ausschalen	1 Tag	Don 02.07.26	Don 02.07.26	286																					
289			Nottreppen (Fertigteile)	1 Tag	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26																						
290			Einbau Treppen	1 Tag	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26	288																					
291			Wände OG	12 Tage	Don 02.07.26	Fre 17.07.26																						
292			Schalung Wände OG	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	286																					
293			Bewehrung Wände OG	3 Tage	Don 09.07.26	Mon 13.07.26	292;288;287																					
294			Betonage Wände OG	1 Tag	Die 14.07.26	Die 14.07.26	293																					
295			Trocknung	2 Tage	Mit 15.07.26	Don 16.07.26	294																					
296			Ausschalen	1 Tag	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26	295																					
297			Deckel Aufzugschacht	4 Tage	Mon 20.07.26	Don 23.07.26																						
298			Schalung, Bewehrung + Betonage	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	296																					
299			Trocknung	2 Tage	Die 21.07.26	Mit 22.07.26	298																					
300			Ausschalen	1 Tag	Don 23.07.26	Don 23.07.26	299																					
301			Gerüste Holzbau	124 Tage	Mit 15.07.26	Mon 18.01.27																						
302			Aufbau Außengerüst EG	3 Tage	Mit 15.07.26	Mon 20.07.26	315AE																					
303			Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Don 13.08.26	Die 18.08.26	318AE																					
304			Aufbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 17.08.26	Die 18.08.26	318AE																					
305			Abbau Innengerüst Aula	1 Tag	Mon 14.12.26	Die 15.12.26	398AE																					
306			Abbau Außengerüste	3 Tage	Don 14.01.27	Mon 18.01.27	330;344;360																					
307			Holzbauarbeiten	125 Tage	Mit 08.04.26	Fre 02.10.26																						
308			Abstimmung Werkplanung mit AN	15 Tage	Mit 08.04.26	Mit 29.04.26	309AE																					
309			Prüfstatiker	20 Tage	Mit 29.04.26	Mon 01.06.26	310AE																					
310			Bestellung Holz	0 Tage	Mon 01.06.26	Mon 01.06.26	311AE																					
311			Lieferzeit Holz	10 Tage	Mon 01.06.26	Mon 15.06.26	312AE																					
312			Abbund HRB inkl. Fassade	25 Tage	Mon 15.06.26	Mon 20.07.26	315AE																					
313			Abbund Kassettendecken	15 Tage	Mon 20.07.26	Mon 10.08.26	316AE																					




Nr.		Vorgangs <i>si</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027									
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
314			Nivellierschwellen	5 Tage	Mon 13.07.26	Mon 20.07.26	315AE																						
315			Wände / Stützen EG aufstellen	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	296																						
316			Kassettendecke EG: Montage	3 Tage	Mon 10.08.26	Mit 12.08.26	315																						
317			Witterungsschutz Decke EG	3 Tage	Don 13.08.26	Mon 17.08.26	316																						
318			Wände / Stützen OG aufstellen	15 Tage	Die 18.08.26	Mon 07.09.26	317																						
319			Kassettendecke OG: Montage	3 Tage	Die 08.09.26	Don 10.09.26	318																						
320			Witterungsschutz Decke OG (falls erf.)	2 Tage	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	319																						
321			Attika	8 Tage	Mit 23.09.26	Fre 02.10.26	319;326																						
322			Dachabdichtungsarbeiten	132 Tage	Fre 26.06.26	Mon 11.01.27																							
323			Abstimmung RWA-Anlage	10 Tage	Fre 26.06.26	Fre 10.07.26	324AE																						
324			Fertigung RWA-Anlage	45 Tage	Fre 10.07.26	Fre 11.09.26	325AE																						
325			Einbau RWA-Anlagen, Dachausstieg	5 Tage	Fre 11.09.26	Don 17.09.26	319																						
326			Dampfbremse Dach	5 Tage	Mit 16.09.26	Die 22.09.26	325AA+3 Tage;34																						
327			Hochführen Damfbremse Attika	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	326;321																						
328			Dämmung Flachdächer	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	327																						
329			Abdichtung Flachdächer	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	328																						
330			Attika, Klempnerarbeiten	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27	360																						
331			Metallbauarbeiten (Geländer)	186 Tage	Die 03.11.26	Die 10.08.27																							
332			Montageplanung	5 Tage	Die 03.11.26	Die 10.11.26	333AE																						
333			Fertigung	20 Tage	Die 10.11.26	Die 08.12.26	334AE																						
334			Montage Holme	5 Tage	Die 08.12.26	Die 15.12.26	330AE																						
335			Montage Geländerfüllungen	5 Tage	Die 03.08.27	Die 10.08.27	474AE																						
336			Gründach, Sekuranten, UK PV-Anlage	38 Tage	Mon 09.11.26	Mit 13.01.27																							
337			Schutzvlies	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	329																						
338			Speichermatten	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	337																						
339			Vlies, Pflanzpads	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	338																						
340			Einbau Bewässerungsanlage	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	339																						
341			Unterbau Plattenbeläge	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	339																						
342			Plattenbeläge	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	341																						
343			Einbau Substrat	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	341																						
344			Einsaat / Rollrasen, Bepflanzungen	10 Tage	Don 17.12.26	Mit 13.01.27	343EA-2 Tage																						
345			Sicherungssysteme	83 Tage	Fre 11.09.26	Die 19.01.27																							
346			Einbau Sekuranten	3 Tage	Fre 11.09.26	Die 15.09.26	325AA																						
347			Montage Sicherungsseilsystem	4 Tage	Don 14.01.27	Die 19.01.27	344																						
348			PV-Anlage	48 Tage	Mon 09.11.26	Mit 27.01.27																							
349			Montage UK	3 Tage	Mon 09.11.26	Mit 11.11.26	337AA																						
350			Montage PV-Anlage	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	344																						
351			Fenster / Türen / PR-Fassade	90 Tage	Die 30.06.26	Mon 02.11.26																							
352			Montageplanung	10 Tage	Die 30.06.26	Die 14.07.26	353AE																						
353			Überarbeitung / Freigabe	10 Tage	Die 14.07.26	Die 28.07.26	354AE																						
354			Profilbestellung und Prüfung	5 Tage	Die 28.07.26	Die 04.08.26	355AE																						
355			Fertigung	30 Tage	Die 04.08.26	Die 15.09.26	356AE																						
356			Einbau Fenster / Türen	15 Tage	Die 15.09.26	Mon 05.10.26	320																						




Nr.	i	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027									
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
357			Einbau PR-Fassade	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	356																						
358			Montage Sonnenschutz	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	356;357																						
359			Fassadenarbeiten	40 Tage	Die 20.10.26	Mon 14.12.26																							
360			Holzschalung ergänzen, Winddichtigkeit, Bleche	40 Tage	Die 20.10.26	Mon 14.12.26	321;356;357																						
361			Trockenbau	142 Tage	Mon 12.10.26	Fre 14.05.27																							
362			Erdgeschoss	46 Tage	Mon 12.10.26	Mon 14.12.26																							
363			Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	327																						
364			Lattung Installationsebenen	8 Tage	Mon 26.10.26	Mit 04.11.26	363																						
365			Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Don 26.11.26	Die 08.12.26	371AE																						
366			Schließen Innenwände	10 Tage	Die 24.11.26	Die 08.12.26	371AE																						
367			Spachteln Q2	5 Tage	Die 08.12.26	Mon 14.12.26	366																						
368			Obergeschoss	46 Tage	Mon 26.10.26	Mon 11.01.27																							
369			Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	363																						
370			Lattung Installationsebenen	7 Tage	Fre 27.11.26	Die 08.12.26	371AE																						
371			Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Die 08.12.26	Don 17.12.26	378																						
372			Schließen Innenwände	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	378																						
373			Spachteln Q2	5 Tage	Die 05.01.27	Mon 11.01.27	372																						
374			Abgehängte Decken	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27	378																						
375			Akustikbeplankung Wände	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27	374;421																						
376			Rohinstallation TGA	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
377			Elektro	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
378			Rohinstallation Elektro	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
379			Heizung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
380			Rohinstallation Heizung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
381			Verteilungsleitungen Rohfußboden	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
382			Sanitär	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
383			Rohinstallation	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
384			Gebäudeautomation	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
385			Verkabelung RLT-Anlagen	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
386			Lüftung	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26																							
387			WC- Lüftungsanlagen	45 Tage	Die 06.10.26	Mon 07.12.26	356;326																						
388			Aufzug	310 Tage	Don 26.02.26	Die 01.06.27																							
389			Abstimmung Werkplanung	25 Tage	Don 26.02.26	Mit 01.04.26	92																						
390			Aufmaß Schacht	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	300EA+10 Tage																						
391			Herstellung	80 Tage	Die 18.08.26	Die 08.12.26	390;392AE																						
392			Rohmontage Aufzuganlage	5 Tage	Die 08.12.26	Die 15.12.26	398AE																						
393			Einbau Kabine	2 Tage	Die 15.12.26	Mit 16.12.26	392																						
394			Abnahme DEKRA	1 Tag	Don 17.12.26	Don 17.12.26	393																						
395			Inbetriebnahme	1 Tag	Die 01.06.27	Die 01.06.27	458																						
396			Estricharbeiten / FB-Heizung	48 Tage	Die 15.12.26	Don 04.03.27																							

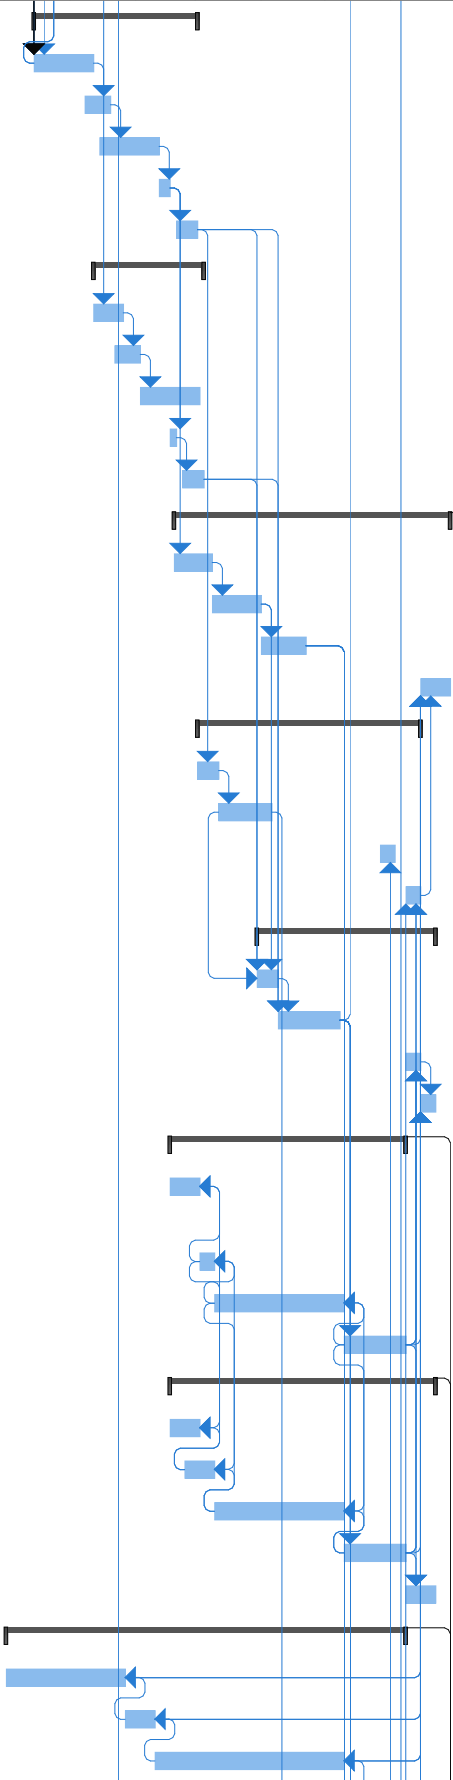Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 1, 2026												Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027											
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J						
397			Erdgeschoss	45 Tage	Die 15.12.26	Mon 01.03.27																													
398			Dämmung	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27	378;379;384;365;																												
399			Trittschalldämmung	8 Tage	Fre 08.01.27	Die 19.01.27	398EA-2 Tage																												
400			Heizschlangen	20 Tage	Fre 15.01.27	Don 11.02.27	399EA-3 Tage																												
401			Estrich	3 Tage	Fre 12.02.27	Die 16.02.27	400																												
402			Belegreif Heizen	10 Tage	Sam 20.02.27	Mon 01.03.27	401EA+3 Tage																												
403			Obergeschoss	38 Tage	Die 12.01.27	Don 04.03.27																													
404			Schüttung	10 Tage	Die 12.01.27	Mon 25.01.27	373																												
405			Trittschalldämmung	8 Tage	Fre 22.01.27	Die 02.02.27	404EA-2 Tage																												
406			Heizschlangen	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	405																												
407			Estrich	3 Tage	Mit 17.02.27	Fre 19.02.27	401																												
408			Belegreif Heizen	10 Tage	Die 23.02.27	Don 04.03.27	407EA+3 Tage																												
409			Malerarbeiten	88 Tage	Fre 19.02.27	Mon 28.06.27																													
410			Spachteln Q3	12 Tage	Fre 19.02.27	Mon 08.03.27	401EA+2 Tage																												
411			Grundanstrich	15 Tage	Die 09.03.27	Mit 31.03.27	410																												
412			Endanstrich	15 Tage	Don 01.04.27	Mit 21.04.27	411																												
413			Nacharbeiten	10 Tage	Die 15.06.27	Mon 28.06.27	418;439;442;433;																												
414			Fliesenarbeiten	71 Tage	Die 02.03.27	Mon 14.06.27																													
415			Abdichtungsarbeiten	8 Tage	Die 02.03.27	Don 11.03.27	402																												
416			Wand-und Bodenfliesen	15 Tage	Fre 12.03.27	Mon 05.04.27	415																												
417			Silikonarbeiten	5 Tage	Don 27.05.27	Mit 02.06.27	450																												
418			Sockelfliesen, Restarbeiten	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	450;433;428																												
419			Bodenbeläge	58 Tage	Die 30.03.27	Mon 21.06.27																													
420			Niveaueausgleich	8 Tage	Die 30.03.27	Don 08.04.27	402;411EA-2 Tage																												
421			Bodenbeläge	20 Tage	Fre 09.04.27	Fre 07.05.27	402;420;408																												
422			Fußbodenleisten	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	433;428																												
423			Fußboden Restarbeiten	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	422;442;439;438;																												
424			Mobile Trennwand	75 Tage	Mit 17.02.27	Mon 07.06.27																													
425			Montageplanung mobile Trennwand	10 Tage	Mit 17.02.27	Mit 03.03.27	431AE;426AE																												
426			Prüfung / Freigabe	5 Tage	Mit 03.03.27	Mit 10.03.27	432AE;427AE																												
427			Produktion	40 Tage	Mit 10.03.27	Mon 10.05.27	433AE;428AE																												
428			Einbau mobile Trennwände	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	421																												
429			Innentüren	85 Tage	Mit 17.02.27	Mon 21.06.27																													
430			Montageplanung Innentüren	10 Tage	Mit 17.02.27	Mit 03.03.27	431AE;426AE																												
431			Prüfung / Freigabe	10 Tage	Mit 24.02.27	Mit 10.03.27	432AE;427AE																												
432			Produktion	40 Tage	Mit 10.03.27	Mon 10.05.27	433AE;428AE																												
433			Einbau Zargen Innentüren	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	421																												
434			Einbau Innentüren	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	433;428																												
435			Tischlerarbeiten	120 Tage	Mit 02.12.26	Mon 07.06.27																													
436			Montageplanung	30 Tage	Mit 02.12.26	Mit 27.01.27	437AE																												
437			Prüfung/ Freigabe	10 Tage	Mit 27.01.27	Mit 10.02.27	438AE																												
438			Produktion	60 Tage	Mit 10.02.27	Mon 10.05.27	439AE																												

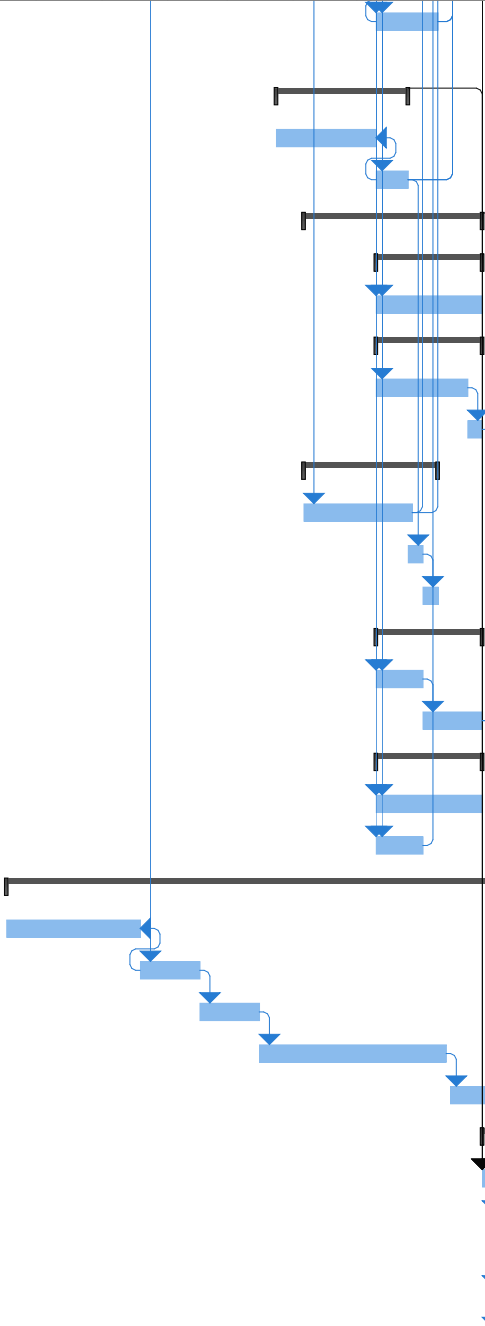

Nr.	i	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5				Hälfte 1, 2026				Hälfte 2, 2026				Hälfte 1, 2027			
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
439			Einbau Garderoben, Einbauschränke	20 Tage	Mon 10.05.27	Mon 07.06.27	412;421																
440			Küchenzeilen	40 Tage	Mit 24.03.27	Mon 24.05.27																	
441			Vorproduktion Küchen	30 Tage	Mit 24.03.27	Mon 10.05.27	442AE																
442			Einbau Küchen	10 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27	421																
443			Fein- und Endmontage TGA	58 Tage	Die 06.04.27	Mon 28.06.27																	
444			Heizung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																	
445			Endmontage Heizung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27	412;421																
446			Lüftung	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																	
447			Endmontage Lüftung	30 Tage	Mon 10.05.27	Mon 21.06.27	421																
448			Inbetriebnahme Lüftung	5 Tage	Die 22.06.27	Mon 28.06.27	447																
449			Sanitär	43 Tage	Die 06.04.27	Mon 07.06.27																	
450			Endmontage, Objekte	35 Tage	Die 06.04.27	Mit 26.05.27	416																
451			Anschluss Küchenmöbel	5 Tage	Die 25.05.27	Mon 31.05.27	442																
452			ggf. Nachbeprobung	5 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27	451																
453			Gebäudeautomation	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																	
454			Endmontage GA	15 Tage	Mon 10.05.27	Mon 31.05.27	412;421																
455			Inbetriebnahme GA	20 Tage	Die 01.06.27	Mon 28.06.27	454																
456			Elektro	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27																	
457			Endmontage Elektro	35 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27	412;421																
458			Endmontage Brandmeldeanlage	15 Tage	Mon 10.05.27	Mon 31.05.27	412;421																
459			Außenarbeiten	155 Tage	Die 17.11.26	Fre 09.07.27																	
460			Abstimmung, Werkplanung	35 Tage	Die 17.11.26	Die 19.01.27	461AE																
461			Vorbereitende Arbeiten	20 Tage	Die 19.01.27	Mon 15.02.27	306																
462			Unterbau	20 Tage	Die 16.02.27	Mon 15.03.27	461																
463			Oberflächen	60 Tage	Die 16.03.27	Fre 11.06.27	462																
464			Anpflanzungen / Außenmöblierung	20 Tage	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27	463																
465			Abnahmen / Endreinigung	31 Tage	Die 29.06.27	Die 10.08.27																	
466			Grobreinigung	3 Tage	Die 29.06.27	Don 01.07.27	435;440;443;424;																
467			Sachverständigenprüfung BMA + Sicherheitsbeleuchtung	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	466;455																
468			Abnahme Lüftung (Dekra)	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	448;466																
469			Abnahme Brandschutzsprüfer	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	466;455																
470			Endabnahmen Firmen	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27	469																
471			Mangelbeseitigung	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.27	470																
472			Endreinigung	5 Tage	Die 03.08.27	Mon 09.08.27	471																
473			Abnahme Kreis Schleswig-Flensburg	0 Tage	Mon 09.08.27	Mon 09.08.27	472																
474			Übergabe	1 Tag	Die 10.08.27	Die 10.08.27	473																
475			Einrichtung	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27																	
476			Textilien	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																
477			Möblierung, lose	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																
478			Sichtschutz / Beklebungen / Schilder	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27	474																



Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	5	S	O	N	D	Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027								
479			Schließanlage	5 Tage	Mit 11.08.27	Die 17.08.27	474																								
480			EINZUG	0 Tage	Die 31.08.27	Die 31.08.27	475;464																								

