


4 Bauphase

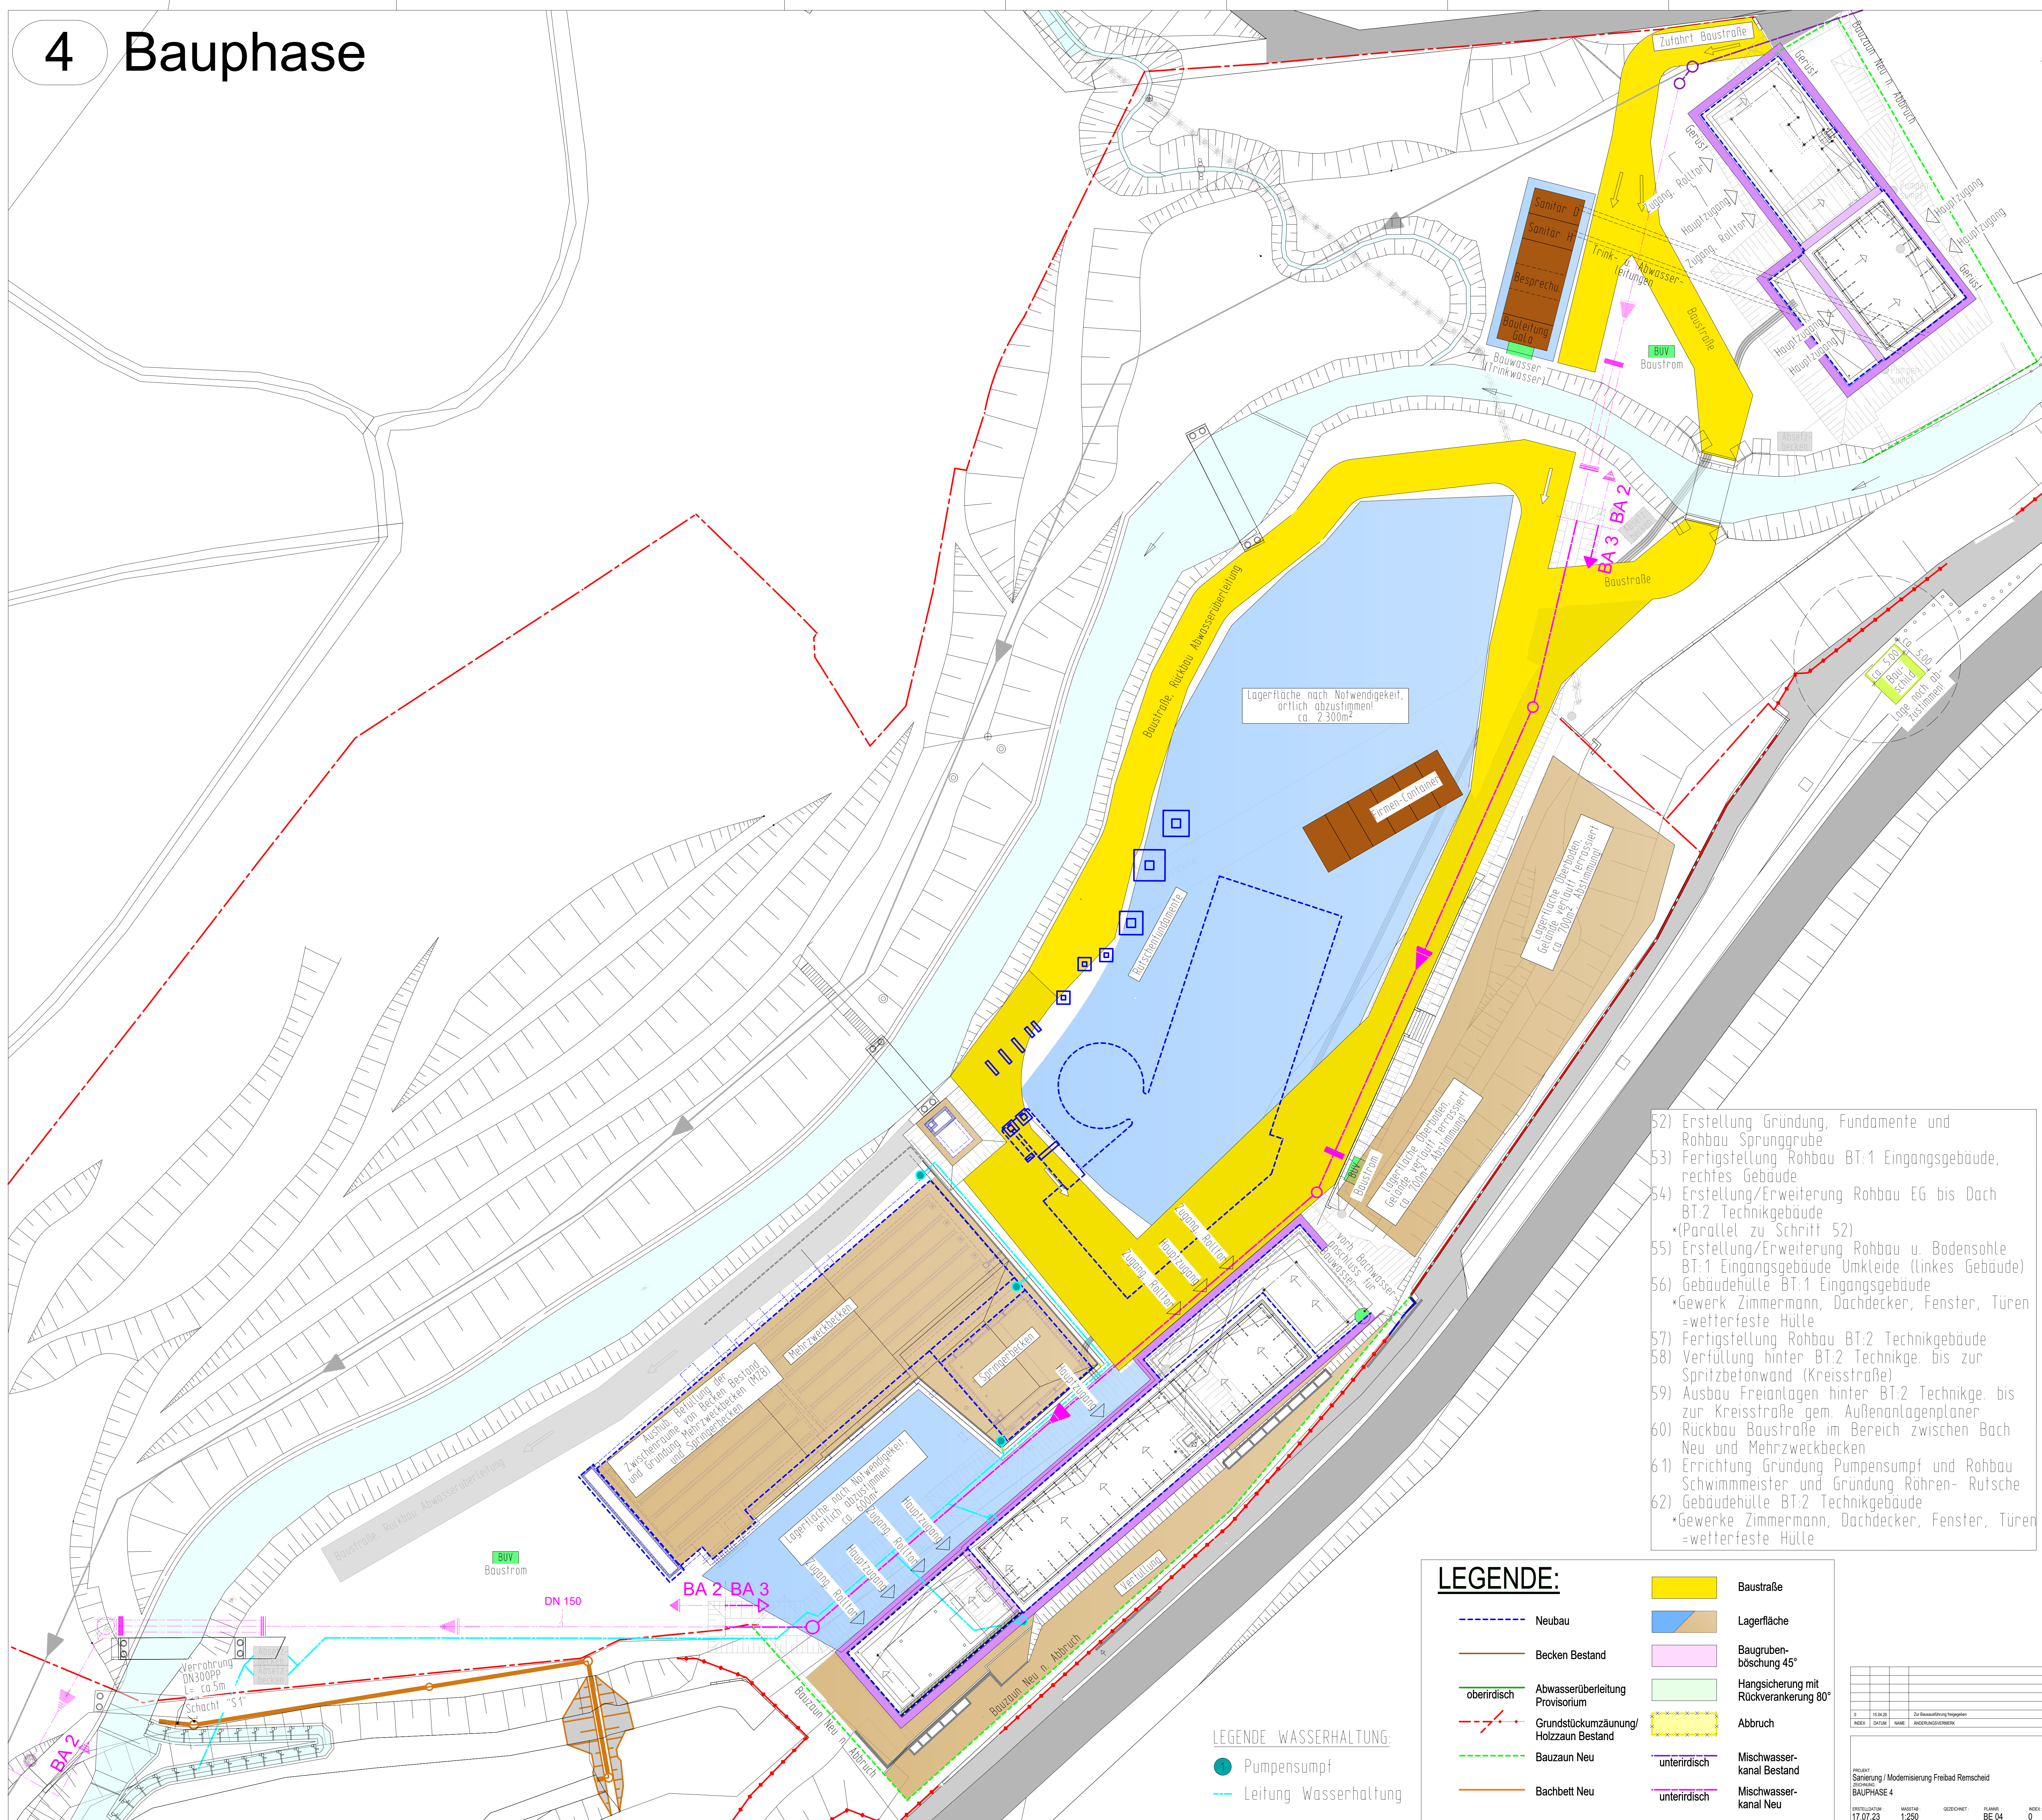

- 52) Erstellung Gründung, Fundamente und Rohbau Sprungrube
- 53) Fertigstellung Rohbau BT:1 Eingangsgebäude, rechtes Gebäude
- 54) Erstellung/Erweiterung Rohbau EG bis Dach BT:2 Technikgebäude
*(Parallel zu Schritt 52)
- 55) Erstellung/Erweiterung Rohbau u. Bodensohle BT:1 Eingangsgebäude Umkleide (linkes Gebäude)
- 56) Gebäudehülle BT:1 Eingangsgebäude
*Gewerk Zimmermann, Dachdecker, Fenster, Türen =wetterfeste Hülle
- 57) Fertigstellung Rohbau BT:2 Technikgebäude
- 58) Verfüllung hinter BT:2 Technikge. bis zur Spritzbetonwand (Kreisstraße)
- 59) Ausbau Freianlagen hinter BT:2 Technikge. bis zur Kreisstraße gem. Außenanlagenplaner
- 60) Rückbau Baustraße im Bereich zwischen Bach Neu und Mehrzweckbecken
- 61) Errichtung Gründung Pumpensumpf und Rohbau Schwimmmeister und Gründung Röhren- Rutsche
- 62) Gebäudehülle BT:2 Technikgebäude
*Gewerke Zimmermann, Dachdecker, Fenster, Türen =wetterfeste Hülle

LEGENDE:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Baustraße | | Lagerfläche |
| | Neubau | | Baugrubenböschung 45° |
| | Becken Bestand | | Hangsicherung mit Rückverankerung 60° |
| | Abwasserüberleitung Provisorium | | Abbruch |
| | Grundstückumzäunung/ Holzzaun Bestand | | Mischwasserkanal Bestand |
| | Bauzaun Neu | | Mischwasserkanal Neu |
| | Bachbett Neu | | |

LEGENDE WASSERHALTUNG:
 Pumpensumpf
 Leitung Wasserhaltung

PROJEKT	Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheld
BAUPHASE	4
PROJEKTLEITER	17.07.23
MASSSTAB	1:250
ZEICHNER	BE 04
PLANNR.	0
PROJEKT	15.04.2026
INDEX	DATUM
NAME	ÄNDERUNGSSTREIFEN

H/B = 850 / 980 (0.83m²)

Proj.-Datum: 15.04.2026
