


Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027		
						Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
1		<b>Rahmendaten</b>	<b>25 Tage</b>	<b>Mon 05.07.27</b>	<b>Fre 06.08.27</b>																		
2		Sommersspielpause Elphi 2027	25 Tage	Mon 05.07.27	Fre 06.08.27																		
3		geplantes Umbaufenster	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27																		
4																							
5																							
6		<b>Terminplan</b>	<b>275 Tage</b>	<b>Mon 06.07.26</b>	<b>Fre 23.07.27</b>																		
7		Angebotsphase	50 Tage	Mon 06.07.26	Fre 11.09.26																		
8		Auswertung / Vergabe	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26																		
9		KickOff	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26																		
10		Fachplanungsphase	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26																		
11		Beistellungen anliefern	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26																		
12		Montage	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27																		
13		Inbetriebnahme	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27																		
14		Güteprüfung	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27																		
15		Restmängelbeseitigung	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27																		
16		ENTSCHEIDUNG UMZUG JA ODER NEIN	0 Tage	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27																		
17		Abbau und Einpacken am Ro	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27																		
18		Demontage Elphi-Regie	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27																		
19		Montage	8 Tage	Mon 12.07.27	Mit 21.07.27																		
20		Tests	2 Tage	Don 22.07.27	Fre 23.07.27																		

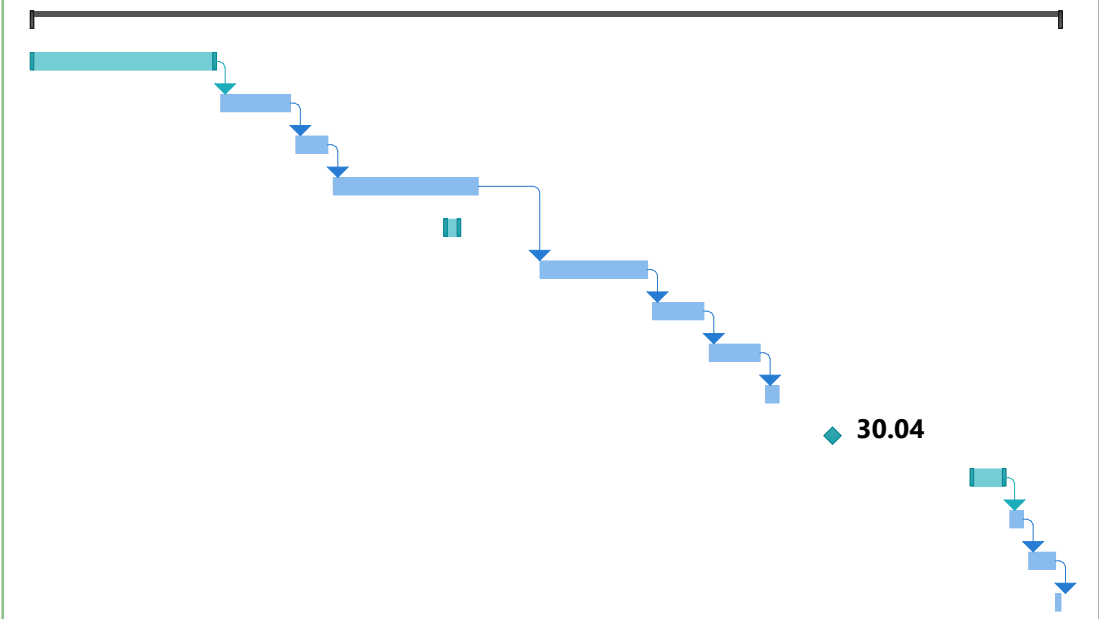

Projekt: Zeitplan-2026-05-04 Datum: Don 25.06.26	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
