
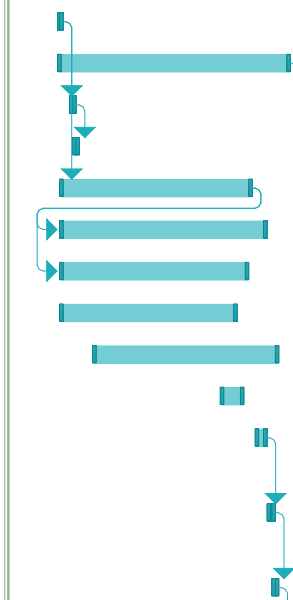



Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	e 2, 2026							Hälfte 1, 2027		
							A	S	O	N	D	J	F	M		
1			Ertüchtigung nach Vollaussstattung													
2			Vergabe													
3			Ankündigung bei Vergabestelle													
4			Veröffentlichung Ausschreibung													
5			Angebotseröffnung													
6			Wertung													
7			Vergabeempfehlung													
8			Unterschrift / Beauftragung / Versendung													
9			Bauanlaufberatung / Werkplanung	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26										
10			Leistungszeitraum	100 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.02.27										
11			Demontage Büro SB und Schulleitung	2 Tage	Mon 12.10.26	Die 13.10.26										
12			Montage BR Kanal und Leitungszug	2 Tage	Mit 14.10.26	Don 15.10.26										
13			Demontage LF Kanal und Steckdosen im Schulgebäude	82 Tage	Die 06.10.26	Mit 27.01.27										
14			Montage BR Kanal	89 Tage	Die 06.10.26	Fre 05.02.27										
15			Installationsarbeiten	80 Tage	Die 06.10.26	Mon 25.01.27										
16			Trassenbau	75 Tage	Die 06.10.26	Mon 18.01.27										
17			Trockenbau	80 Tage	Mon 26.10.26	Fre 12.02.27										
18			Malerarbeiten	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27										
19			Umbau Unterflursystem & Elektroarbeiten Demontage und Bodentanks vorbereiten	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27										
20			Bodenbelagsarbeiten Abbruch und Entsorgungsarbeiten	3 Tage	Mon 08.02.27	Mit 10.02.27										
21			Untergrundvorbereitung (Rohfussboden)	2 Tage	Don 11.02.27	Fre 12.02.27										



Projekt: Bauzeitenplan 1 GYM L
Datum: Fre 04.09.26

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	e 2, 2026					Hälfte 1, 2027		
							A	S	O	N	D	J	F	M
22			Linoleum-Verlegearbeiten	4 Tage	Mon 15.02.2	Don 18.02.27								
23			unvorhergesehene Leistungen	35 Tage	Mon 04.01.2	Fre 19.02.27								
24			Abnahme und Restleistungen	1 Tag	Fre 26.02.27	Fre 26.02.27								

Projekt: Bauzeitenplan 1 GYM L Datum: Fre 04.09.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
