



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	September 2026												Oktober 2026				
						31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12		
1	MEP Mikado H Schule Hagenow	129 Tage	Die 01.09.26	Fre 26.02.27																		
2	Bauanlaufberatung / Werkplanung	1 Tag	Die 01.09.26	Die 01.09.26																		
3	Trockenbau	6 Tage	Mit 02.09.26	Mit 09.09.26																		
4	Malerarbeiten Serverräume	2 Tage	Don 10.09.26	Fre 11.09.26	3																	
5	Klimaanlage	4 Tage	Mon 14.09.26	Don 17.09.26	4																	
6	Trassenbau Glasfaser	2 Tage	Mit 16.09.26	Don 17.09.26																		
7	Kabelzug Glasfaser	1 Tag	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26	6																	
8	Trassenbau Netzwerk	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26																		
9	Kabelzug Netzwerk	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26																		
10	Klemmarbeiten / Schränke	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	9;7																	
11	unvorhergesehene Leistungen	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	10																	
12	Inbetriebnahme	3 Tage	Mon 09.11.26	Mit 11.11.26																		
13	Abnahme	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26																		
14	Mängelbeseitigung	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26																		

Projekt: Bauzeitenplan Mikado
Datum: Die 21.07.26

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

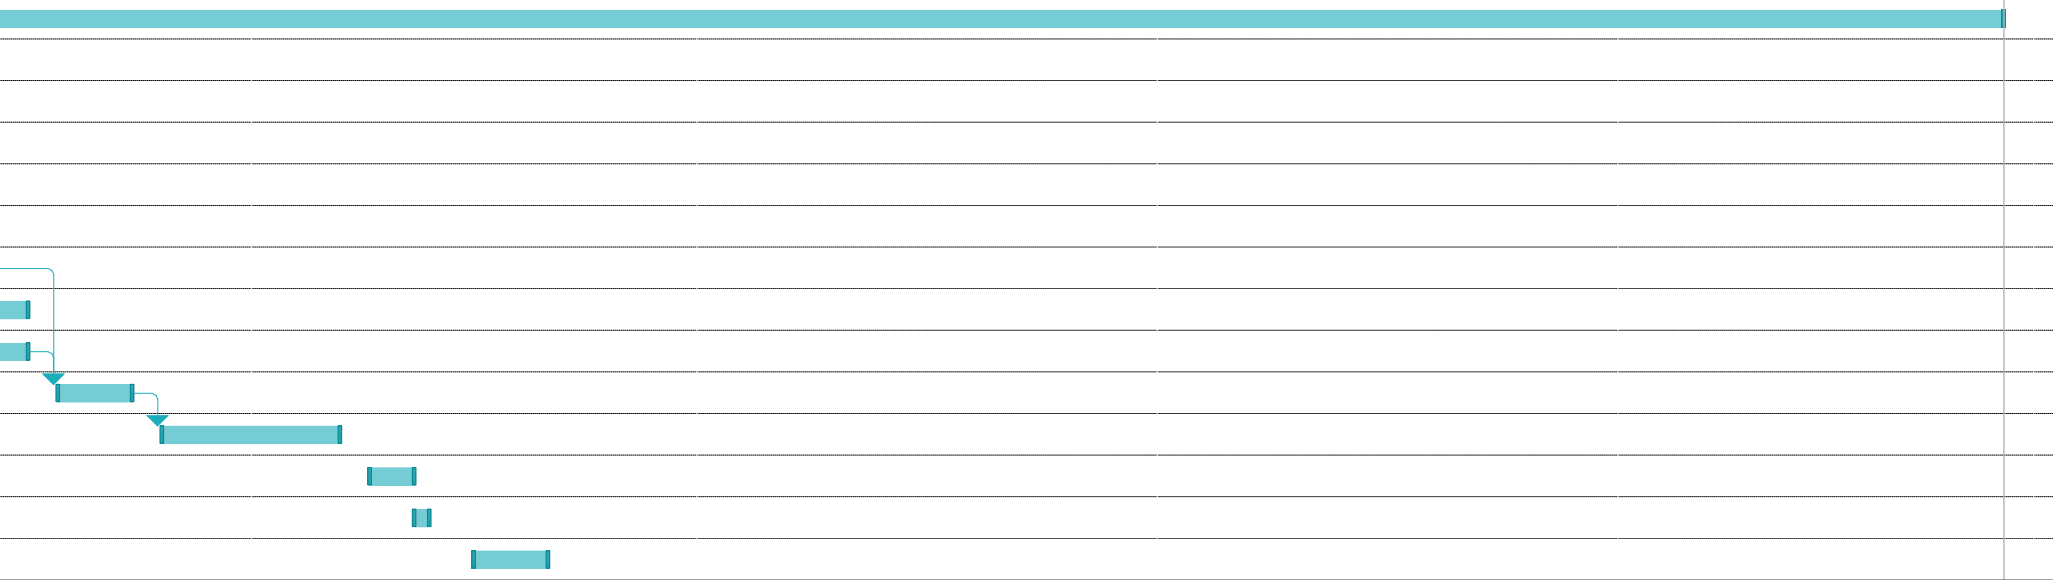

Projekt: Bauzeitenplan Mikado Datum: Die 21.07.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
