


Vivantes - Forum für Senioren

Haus Britz

Austausch der Fenster - Rahmenterminplan

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			1. Qtl, 2028			2. Q
									Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
1			Veröffentlichung Trockenbau-LV	0 Tage	Mit 30.09.26	Mit 30.09.26		AGF / Vivantes																						
2			Angebotserstellung	2 Wochen	Don 01.10.26	Mit 14.10.26	1EA+1 Tag	Firmen																						
3			Submission (mit Bindefrist: 11.11.2026)	0 Tage	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26	2																							
4			Auswertung der Angebote	3 Wochen	Don 15.10.26	Mit 04.11.26	3	AGF																						
5			Beauftragung Trockenbau	3 Wochen	Don 05.11.26	Mit 25.11.26	4	Vivantes																						
6			Personal & Materialdisposition Trockenbau	4 Wochen	Don 26.11.26	Mit 23.12.26	5	Firmen																						
7			Erstellung & Prüfung der Werk- und Montageplanung	3 Wochen	Fre 13.11.26	Fre 04.12.26	9AE	Firmen / AGF																						
8			Bestellung der Fenster	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26		Firmen																						
9			Lieferzeitraum Fenster	12 Wochen	Fre 04.12.26	Mit 03.03.27	8	Firmen																						
10			Bauabschnitt 1 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Fre 05.03.27	Die 30.03.27	9	Firmen																						
11			Bauabschnitt 2 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Mit 31.03.27	Die 20.04.27	10	Firmen																						
12			Bauabschnitt 3 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Mit 21.04.27	Mit 12.05.27	11	Firmen																						
13			Bauabschnitt 4 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 13.05.27	Mit 02.06.27	12	Firmen																						
14			Bauabschnitt 5 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 03.06.27	Mit 23.06.27	13	Firmen																						
15			Bauabschnitt 6 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 24.06.27	Mit 14.07.27	14	Firmen																						
16			Bauabschnitt 7 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 15.07.27	Mit 04.08.27	15	Firmen																						
17			Bauabschnitt 8 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 05.08.27	Mit 25.08.27	16	Firmen																						
18			Bauabschnitt 9 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 26.08.27	Mit 15.09.27	17	Firmen																						
19			Bauabschnitt 10 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 16.09.27	Mit 06.10.27	18	Firmen																						
20			Bauabschnitt 11inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 07.10.27	Mit 27.10.27	19	Firmen																						
21			Bauabschnitt 12 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 28.10.27	Mit 17.11.27	20	Firmen																						
22			Bauabschnitt 13 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 18.11.27	Mit 08.12.27	21	Firmen																						
23			Bauabschnitt 14 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 09.12.27	Mit 29.12.27	22	Firmen																						
24			Bauabschnitt 15 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 30.12.27	Mit 19.01.28	23	Firmen																						
25			Bauabschnitt 16 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 20.01.28	Mit 09.02.28	24	Firmen																						
26			Bauabschnitt 17 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 10.02.28	Mit 01.03.28	25	Firmen																						
27			Bauabschnitt 18 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 02.03.28	Mit 22.03.28	26	Firmen																						
28			Bauabschnitt 19 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	2 Wochen	Don 23.03.28	Mit 05.04.28	27	Firmen																						

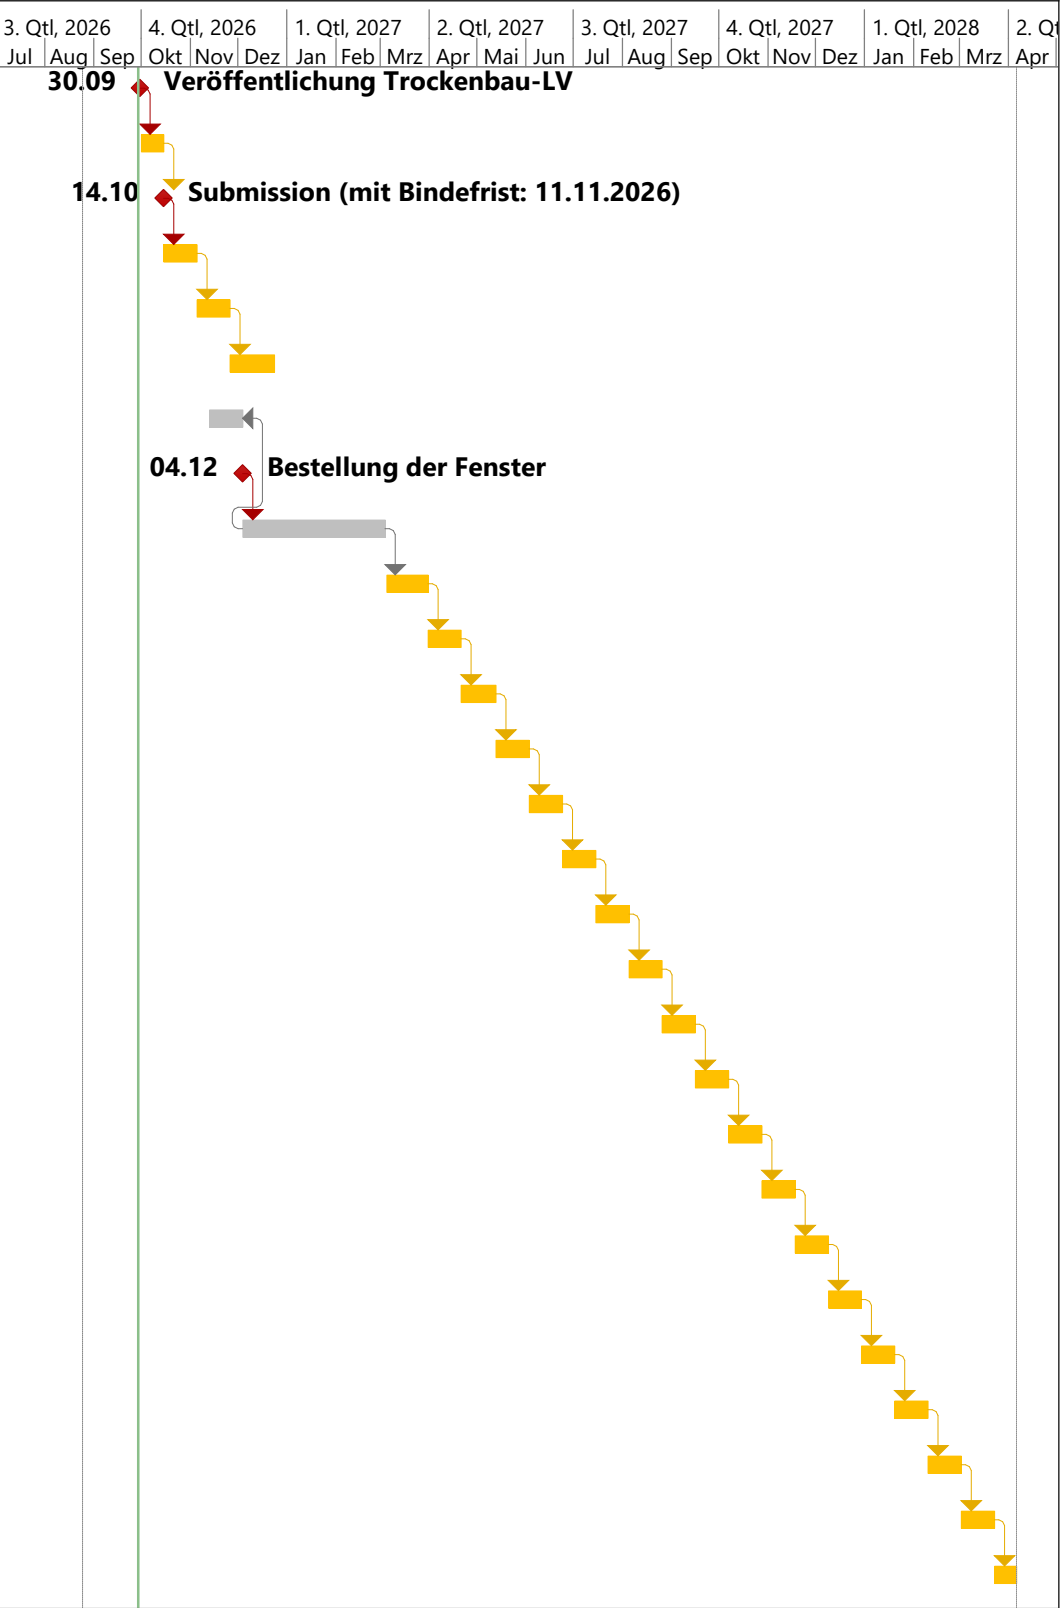

Projekt: 26-09-29_Haus Britz_F
Datum: Die 29.09.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
