

Allgemeine Informationen:

Es ist rücksichtend auszuhauen sowie eine dynamische Beanspruchung auszuschließen. Der Aushub ist mit glatter Schmelde vorzunehmen.

Aufgewerkte Bereiche im Tiefenbereich sind auszutauschen oder nacharbeiten.

Schluffe und tonige Böden sind ohne Aufbereitung nicht zur Wiederverwendung geeignet.

2x Grundwasserstandsstelle in der Mitte der Baugrube anordnen. Aushub, Vakuumkiesfilterbrunnen, Wasserstände im Pegel und getarnten Wasserständen sind täglich zu dokumentieren.

2x leistungsfähige Vakuumkumpen installieren (ausreichende Redundanz bei Pumpenausfall).

Dreikammerabsetzbecken mit Leichtflüssigkeitsabscheider und elektr. Wasserzähler nach Beendigung werden die Brunnen gezogen und die Hohlräume verpresst.

Ablauf Baustelle:

28. Erstellung vom kompletten Rohbau

29. Aufstellung Container Gewerke Dacharbeiten

30. Erstellung Dachtragwerk Gewerke Zimmerer, Stahlbau, Trapezblech (Norddach)


31. Gewerk Gerüstbau und Dachdeckerarbeiten danach

32. Erstellung Lagerfläche Gewerk Estrich und Putzarbeiten

LEGENDE:

Notberuf	Baumstraße (Haupttrichtung)
Baumzahn	Baumstraße
Baumstutzzaun	Lagerfläche
Abbruch	Lagerfläche Mieten
Neubau	Gerüst-Fläche
SW-Leitung Bestand	Baugrube
SW-Leitung Neu	Vakuumkiesfilterbrunnen
Kranradius	Vakuumpumpe
Leitung Wasserhaltung	

INDEX	DATUM	NAM	ÄNDERUNGSVERMERK
2	13.03.20	Ap	Anpassung Lagerflächen Gerüstflächen, Ergänzung NA-Weg
1	05.03.20	Ba/Hp	Anpassung Position Pumpenraum und Wasserhaltung, Ergänzung Baustelleneinrichtung
0	10.02.20	Rie	Zur Bauausführung freigegeben

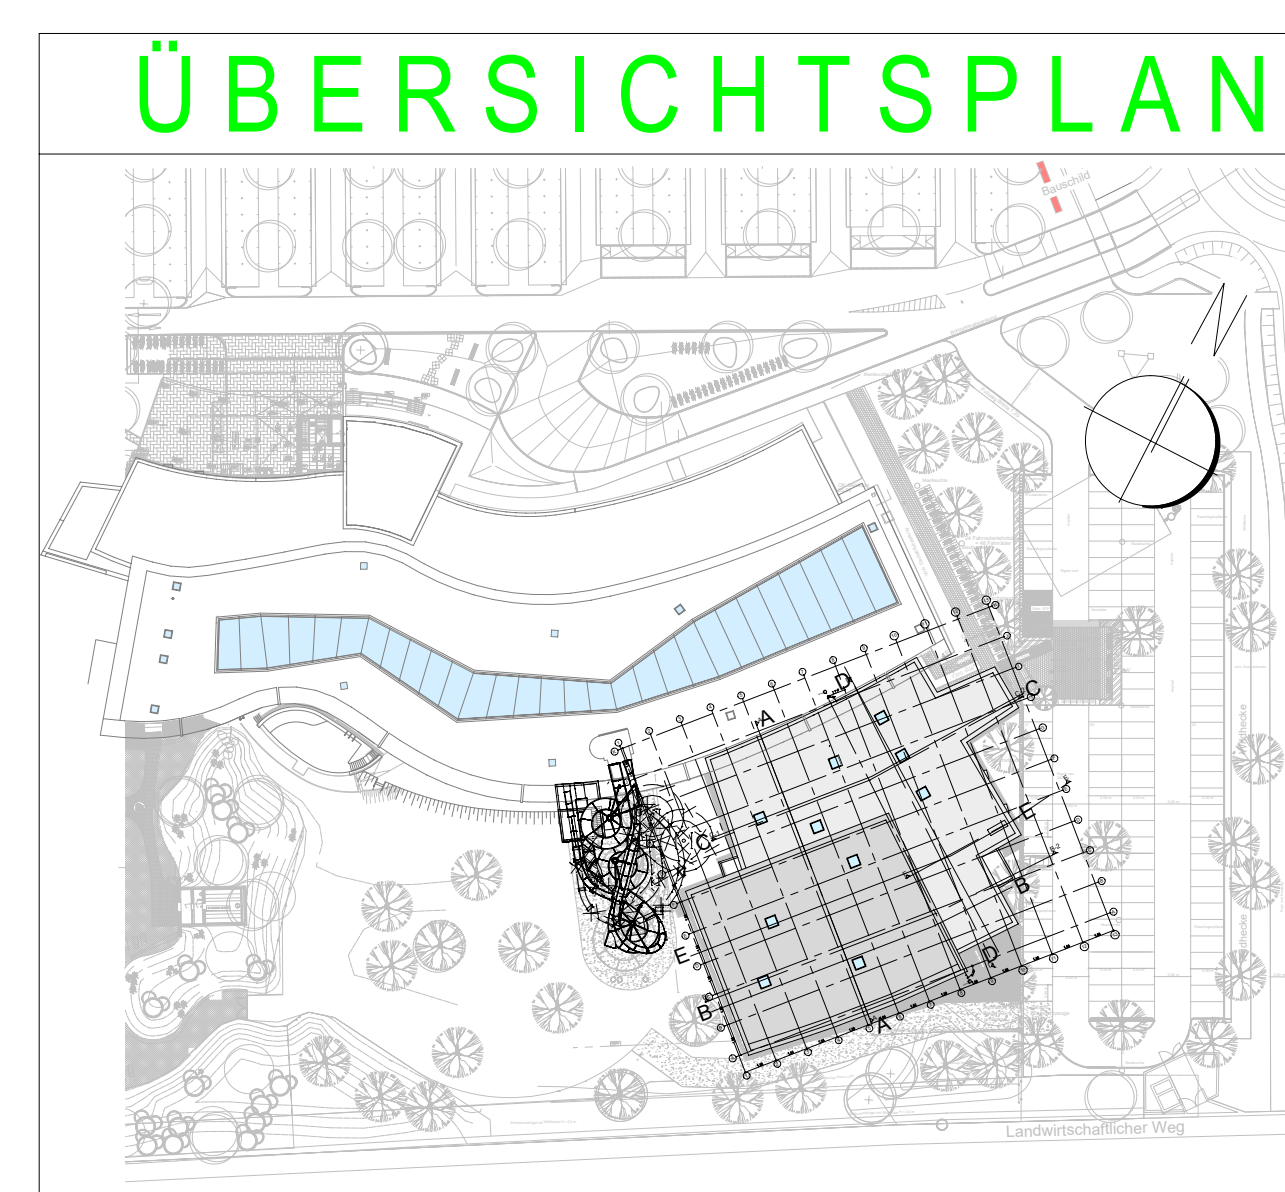

PROJEKT

Anbau einer Lehr- und Schwimmhalle an der Rheinwelle
Binger Straße 99
55435 Gau-Algesheim

BAUHERR

Zweckverband Regionalbad Bingen - Ingelheim
Burg Klopp
55411 Bingen am Rhein

ARCHITEKT

KRIEGER
KRIEGER Architekten | Ingenieure GmbH
Bismarckstraße 2 | 42699 Solingen
T. 020513107-0
E. info@architekt-krieger.de

ZEICHNUNG

BAUPHASENPLAN 3
Baugrube Phase 3

± 0,00m = NHN
u. NHN +65,75 m

MASSTAB: 1:200

PROJEKTLÄNGE: 10.03.2020

PROJEKTNUMMER: RBL-841

ERSTELLDATUM: 03.01.2024

PROJEKTLÄNGE: Batz

GEZEICHNET: kha

INDEX: 2

BE 3
