

Bauvorhaben Gleisüberfahrten St. Petersburger Straße und Blüherstraße

Verkehrsführung während der Bauzeit
Konzept

Dresden, 10.07.2026



Allgemeine Anmerkungen/Festlegungen zum BV Blüherstraße

- VwdB wird grundsätzlich für das BV Blüherstraße einzeln bestätigt
- Radverkehrsführung siehe Folie 11
- Einordnung Bauzeitraum:
 - Nicht zu Fußballspielen oder Veranstaltungen im R.-Harbig-Stadion
 - DVB Operativplanung: Umleitung der Straßenbahnen während des 10-Minuten-Taktes führt zu massiver Überlastung am Lennéplatz

Allgemeine Anmerkungen /Festlegungen zum BV St. Petersburger Straße am Pirnaischen Platz


- Einordnung Bauzeitraum: Herbstferien 2026 → Bauzeitraum höchstens 2 Wochen
- VwdB für die Variante 3 wird grundsätzlich mit Wegnahme aller Linksabbiegebeziehungen bestätigt, allerdings nur für das BV St. Petersburger Straße am Pirnaischen Platz einzeln und nicht für beide BV parallel.
- VTU-Bau-LSA muss rechtzeitig vorliegen (12 Wochen vor Baubeginn Vorlage zur Prüfung an SVB, 6W vor Baubeginn Übergabe an Ausrüster)

Bauvorhaben und Rahmenbedingungen


Baumaßnahme:

LU-Maßnahme Pirnaischer Platz: Gleisüberfahrten der St. Petersburger Straße, insgesamt 71,1 m, feste Fahrbahn, zum Teil Zwillingsgleis

LU-Maßnahme Blüherstraße: Gleisüberfahrten am Knoten Grunaer Straße/ Blüherstraße, insgesamt 44,7 m, Rasengleis, Schwellenbauweise

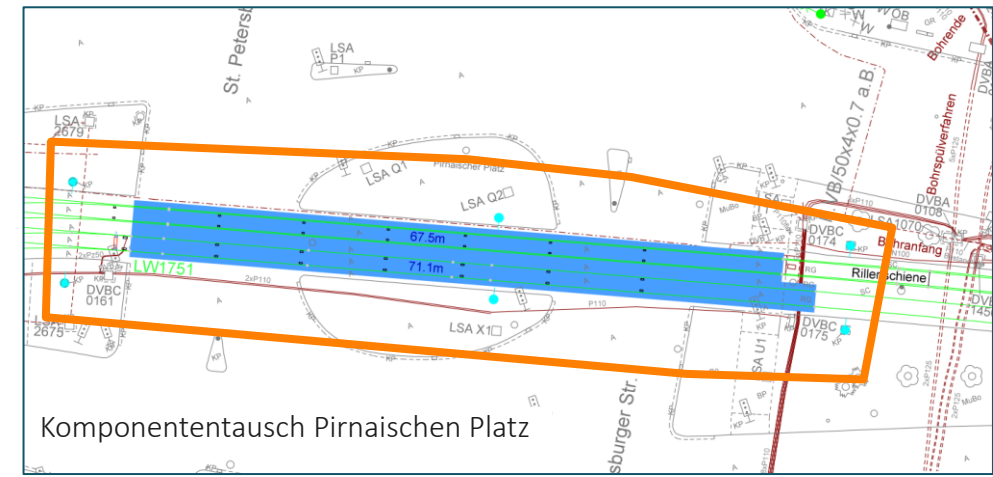


Komponententausch Pirnaischen Platz

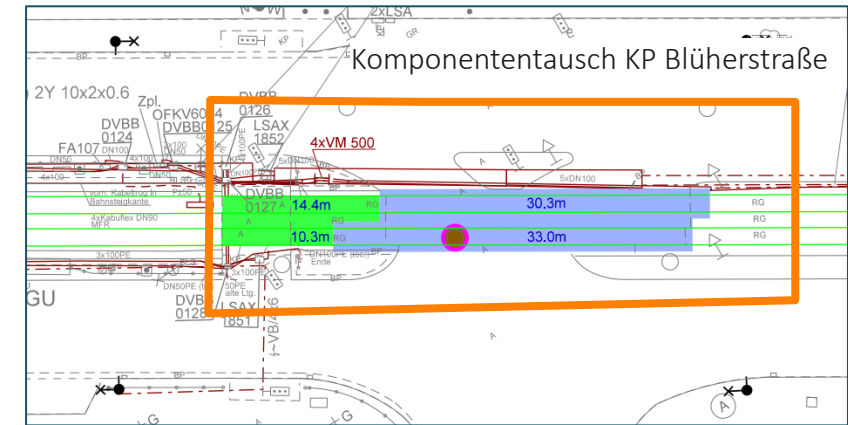

Komponententausch KP Blüherstraße

- Gleisbauarbeiten an Weichen und Gleiskreuzung am Pirnaischen Platz → gesondertes BV (Umsetzung vor Gleisüberfahrten) → gesonderte VwdB
- Anpassung Furt über Wilsdruffer Straße nicht Bestandteil dieses VwdB-Konzeptes

Bestandsanalyse – Übersicht Stadtgebiet Dresden

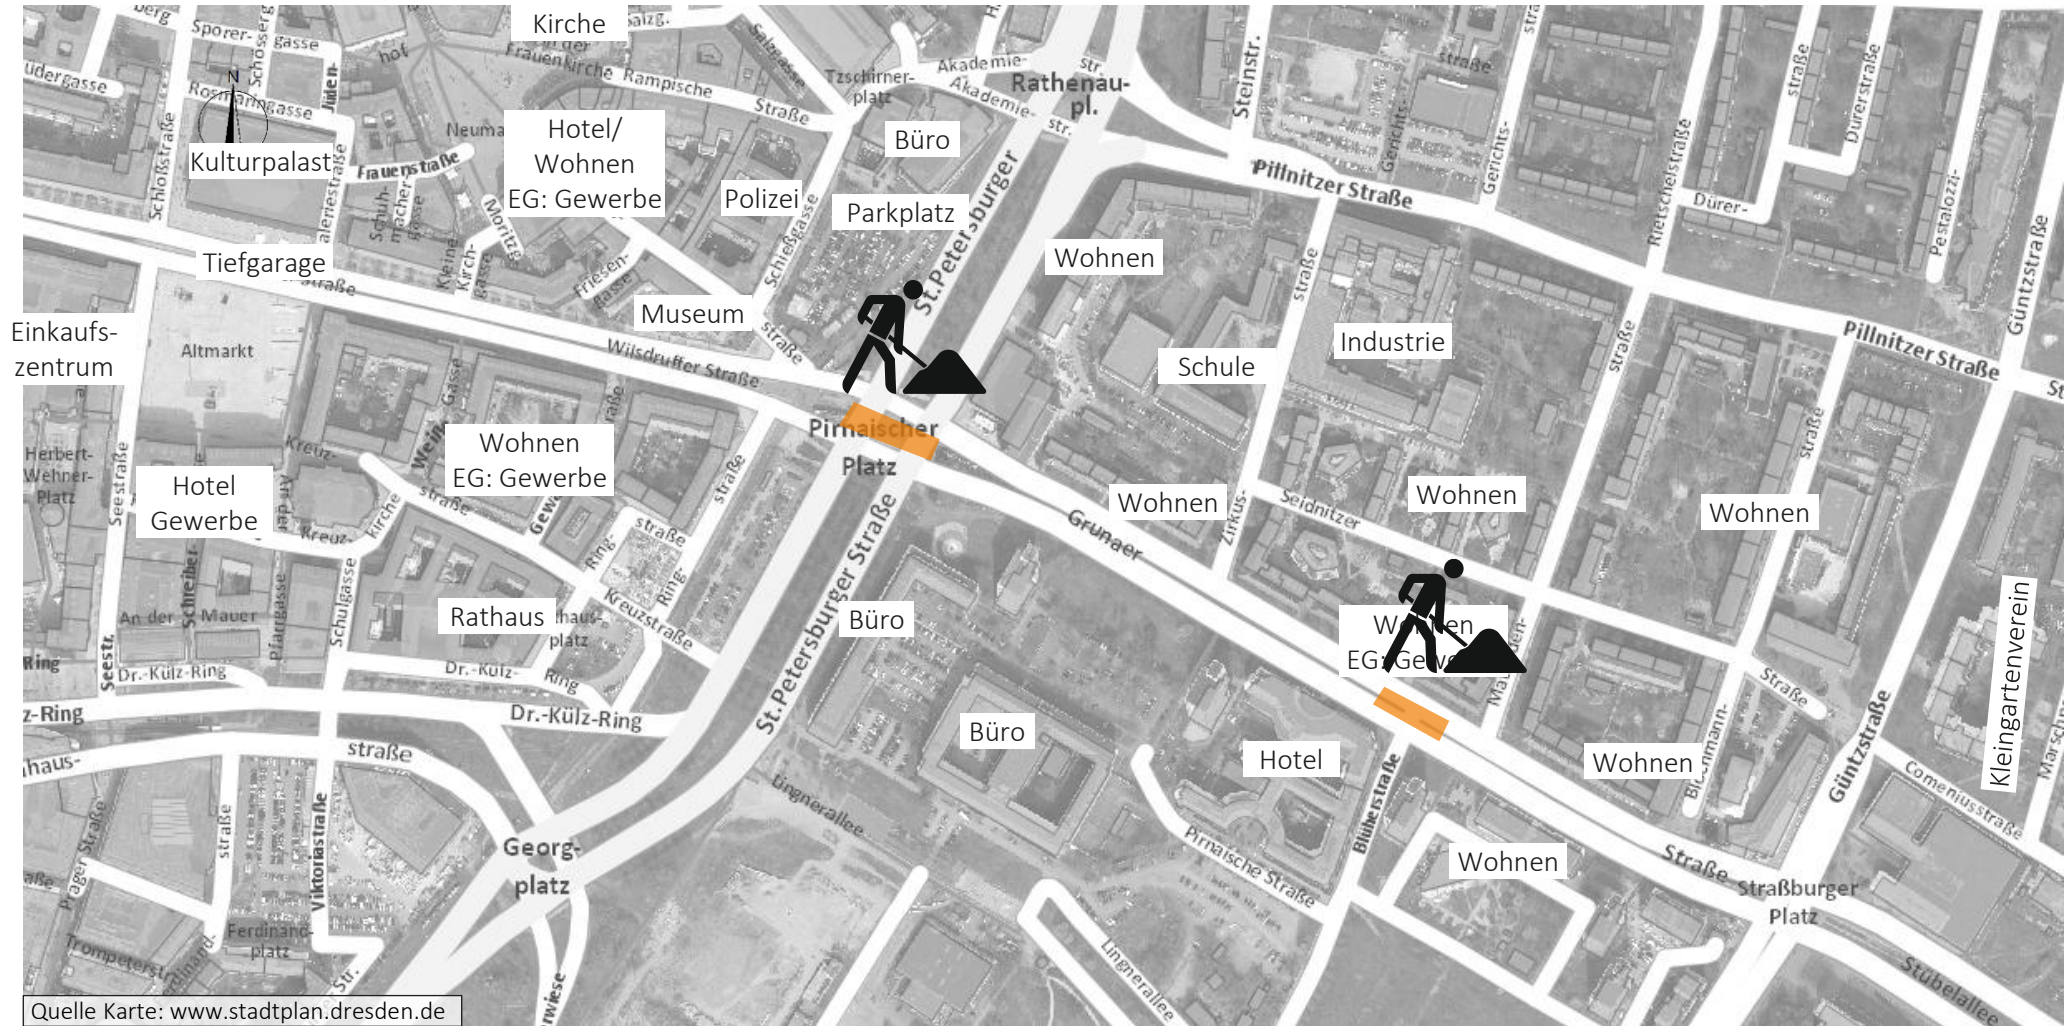


Bestandsanalyse

Verkehrsmengen MIV

Zähldaten


- St. Petersburger Straße
 - 25.04.2023 Rathenauplatz bis Pirnaischer Platz
 - 30.06.2025 Pirnaischer Platz bis Georgplatz
- Wilsdruffer Straße 20.09.2022
- Grunaer Straße 30.06.2025
- Pillnitzer Straße 25.04.2023
- Steinstraße 25.04.2023
- Dr.-Külz-Ring
 - 30.06.2025 Schulgasse bis Seestraße
 - 06.09.2022 Georgplatz bis Schullgasse
 - 06.09.2022 südliche Zufahrt Georgplatz
 - 07.07.2020 nördliche Zufahrt Georgplatz
- Waisenhausstraße
 - 06.09.2022 Georgplatz bis Viktoriastraße
 - 07.07.2020 Prager Straße bis Viktoriastraße

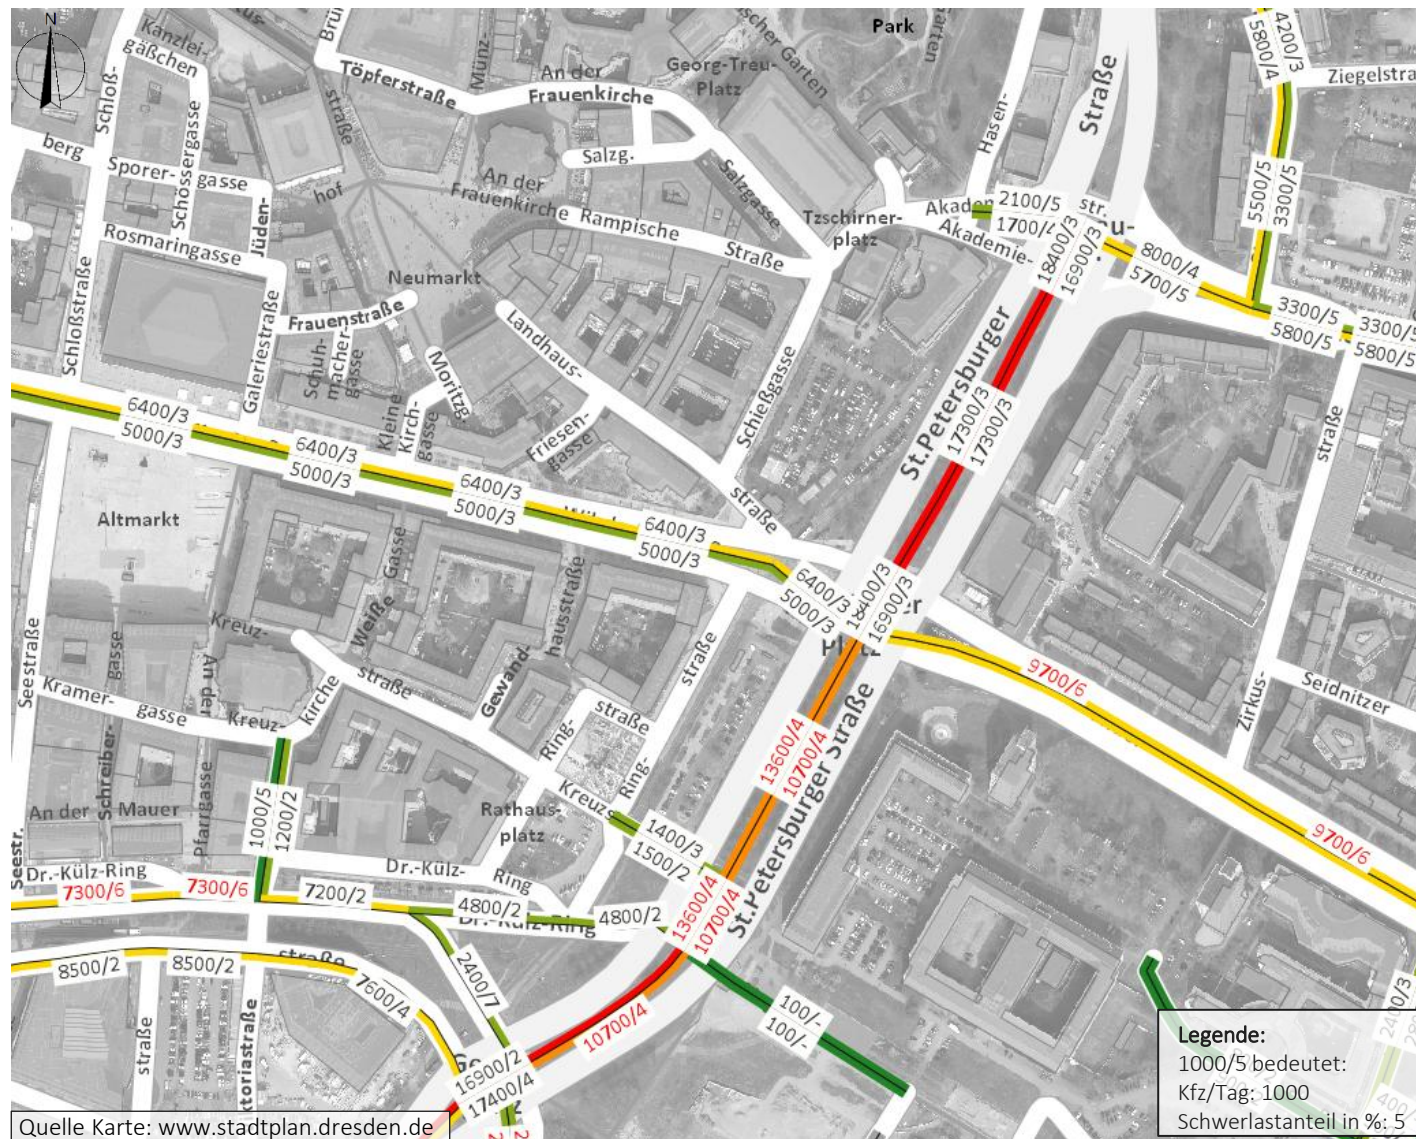

Bestandsanalyse


ÖPNV-Linien

	DVB-Linie 1	10 min-Takt
	DVB-Linie 2	10 min-Takt
	DVB-Linie 9	10 min-Takt
	DVB-Linie 12	10 min-Takt
	DVB-Linie 62	10 min-Takt
	RVSOE-Linie 261	60 min-Takt
	RVSOE-Linie 333	6 bzw. 9 Fahrten
	RVSOE-Linie 360	

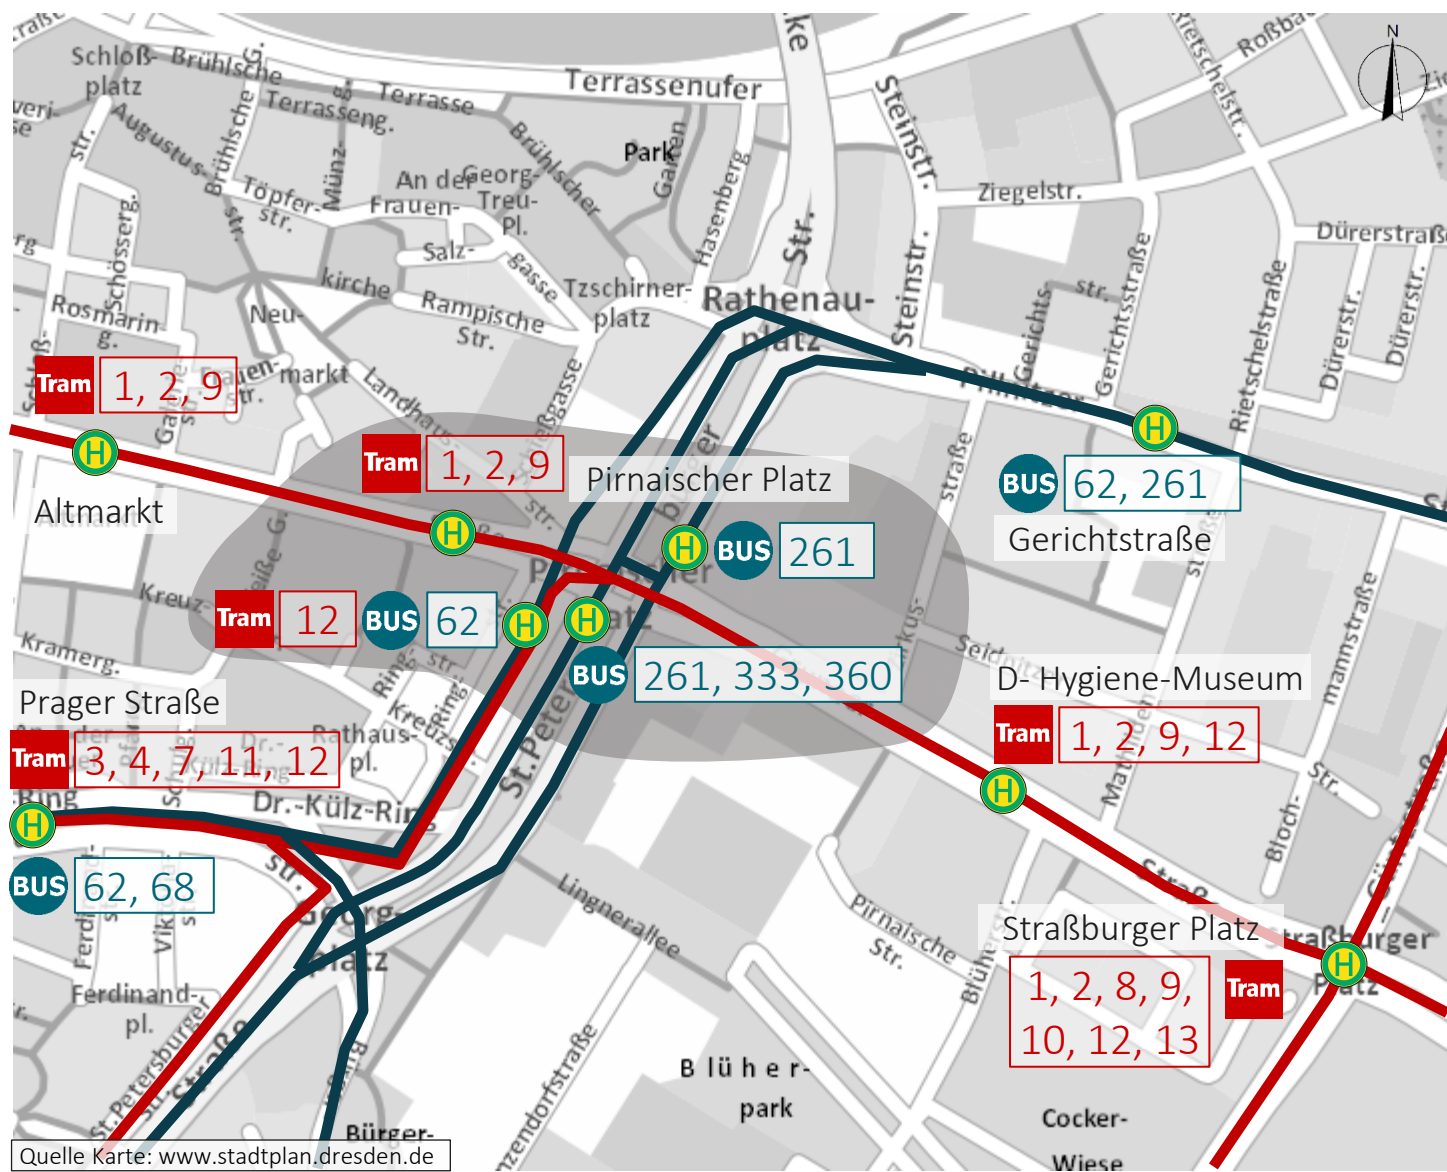


Bestandsanalyse

Ortsbegehung

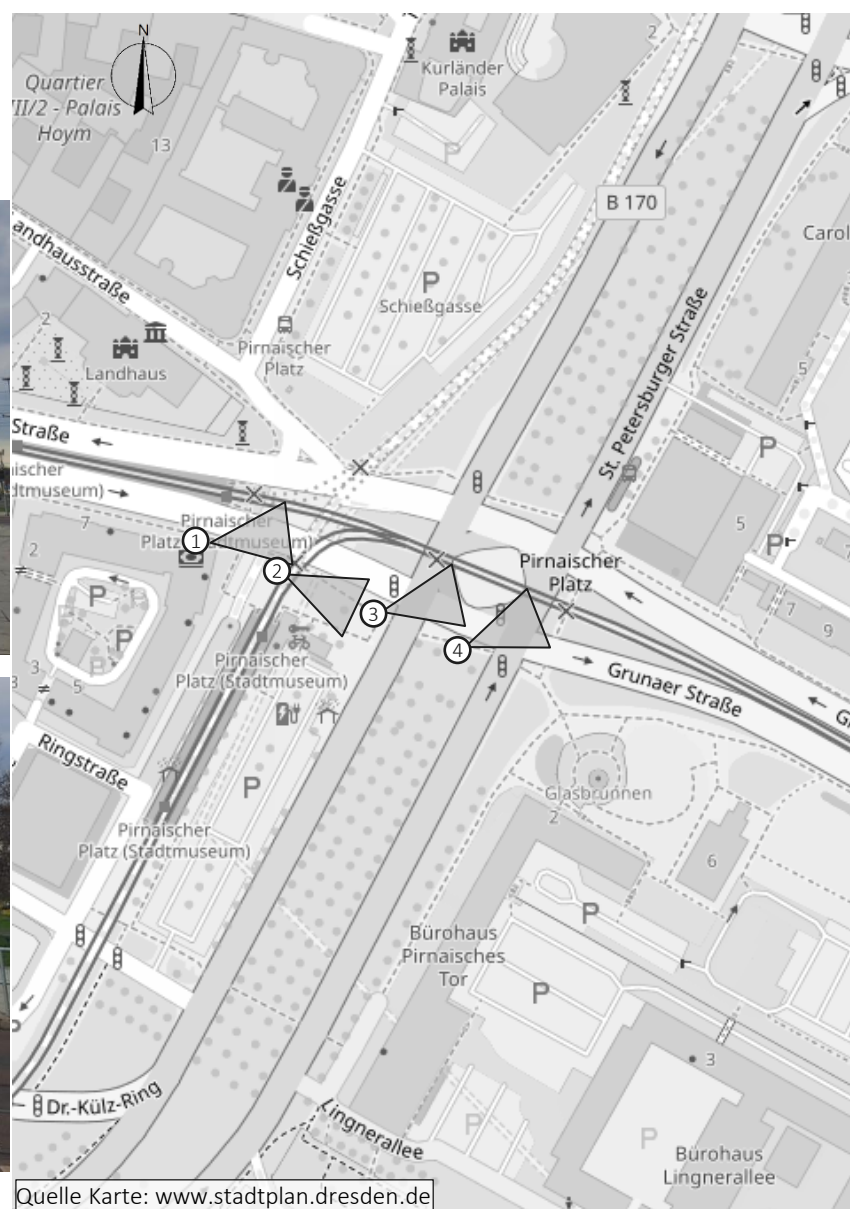

Bestandsanalyse


Ortsbegehung

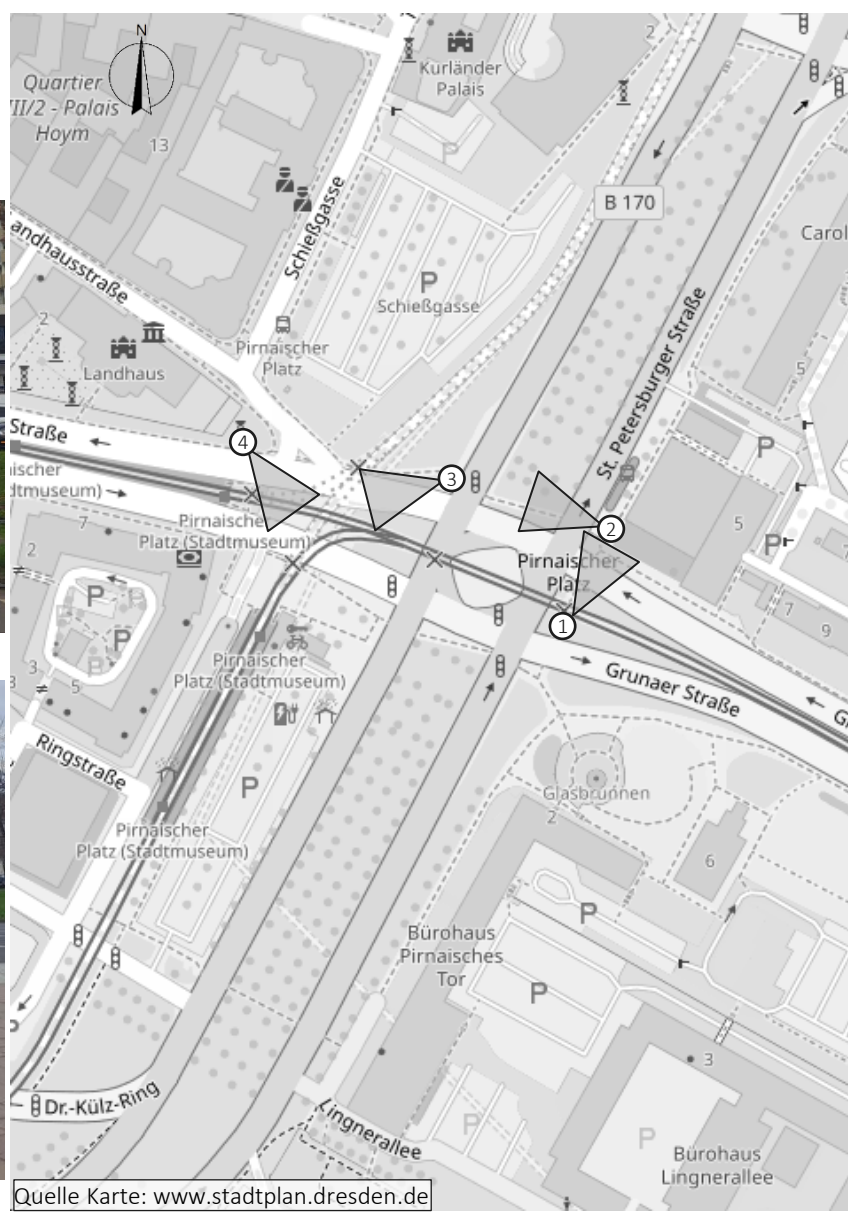

1 LU-Maßnahme Blüherstraße



Dauer Blüherstr.:
1 Woche bzw.
2 Wochenenden

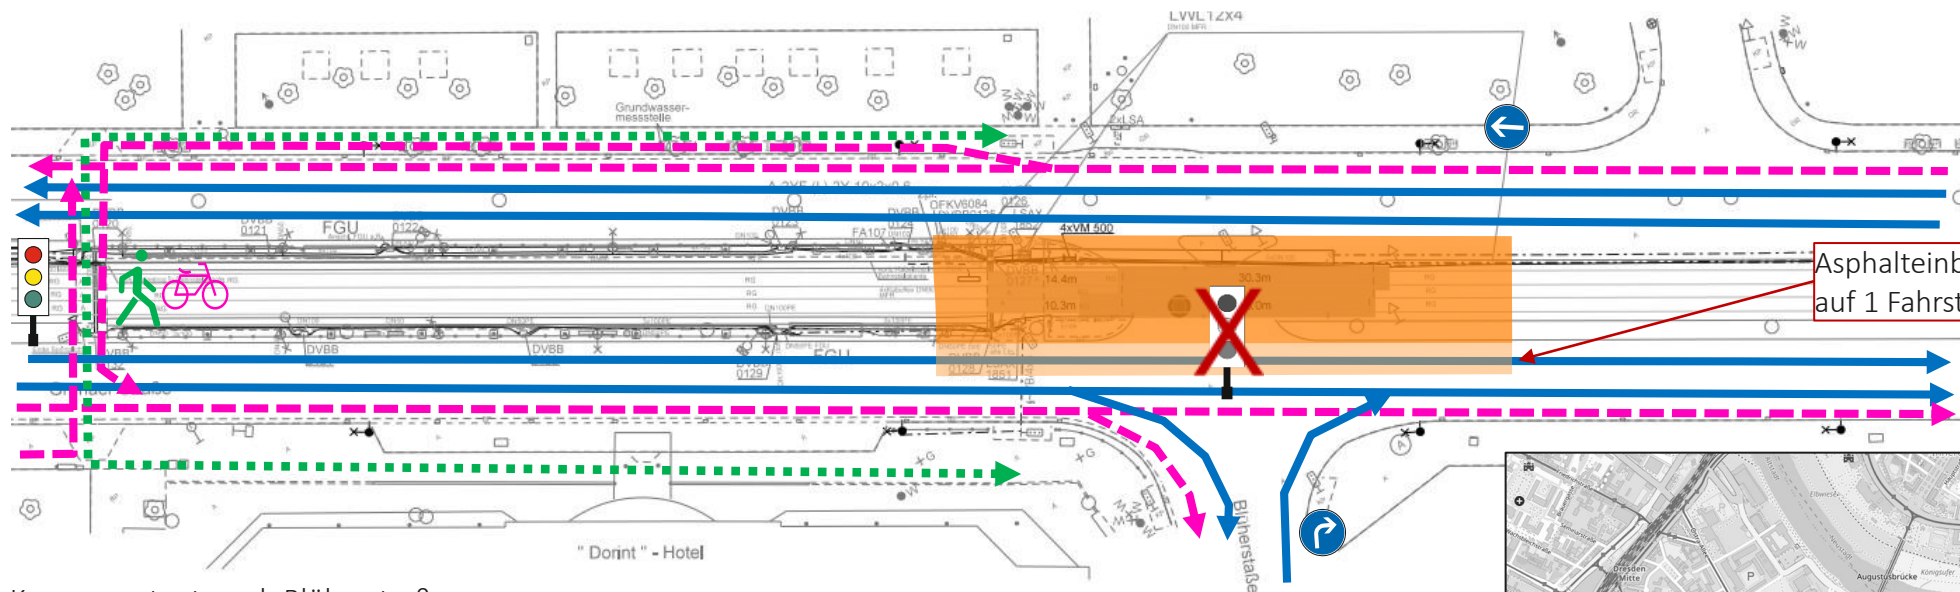

Asphalteinbau: Reduktion auf 1 Fahrstreifen

Komponententausch Blüherstraße

Fuß und Rad nutzen Querungsstelle westlich der Haltestelle (gesichert mit temporärer F-LSA). Aufstellfläche für Radverkehr → auf Gleisen oder Reduzierung MIV-Fahrstreifen (siehe Folgende Folie)

Abschaltung der Bestands-LSA am Knoten Blüherstraße
Abstimmung 28.10.: Bei Einschränkungen der Geradeaus-Fahrbahnen in der Grunaer Straße, keine zeitgleiche Umsetzung mit dem Baufeld in der St. Petersburger Straße

Beachtung des Wochenmarkts am Hygienemuseum, der Heimspiele von Dynamo und des Dresden Marathons
Baumaßnahme einzeln auch außerhalb der verkehrsschwachen Zeit möglich

Legende

Orange rectangle: Baufeld (schematisch)


Green dashed line: Fußgängerführung

Red and yellow circles: Bau-LSA

Blue arrow: MIV


Pink arrow: Rad

Grey circle: Bestands-LSA

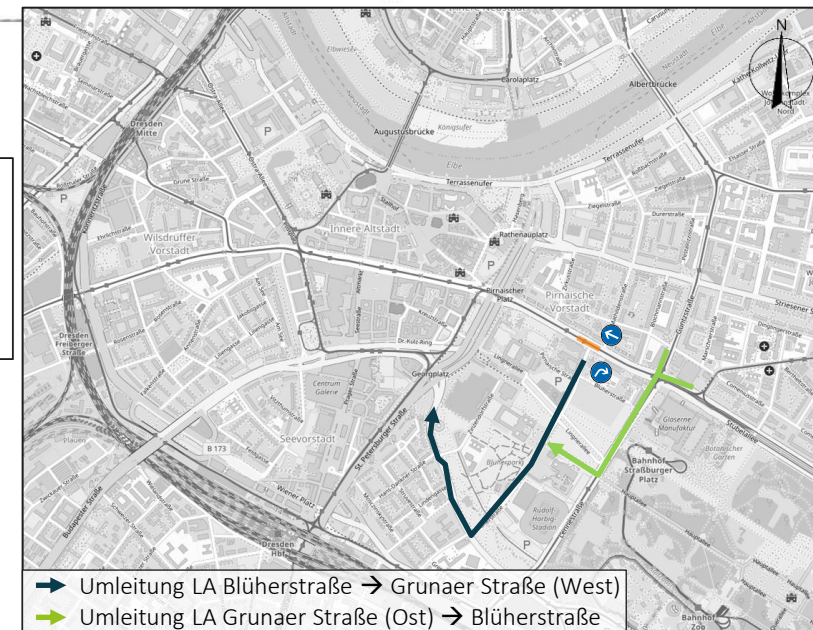


Blue arrow: Umleitung LA Blüherstraße → Grunaer Straße (West)
Green arrow: Umleitung LA Grunaer Straße (Ost) → Blüherstraße

Querung für Fuß- und Radverkehr Ortstermin vom 24.02.2026

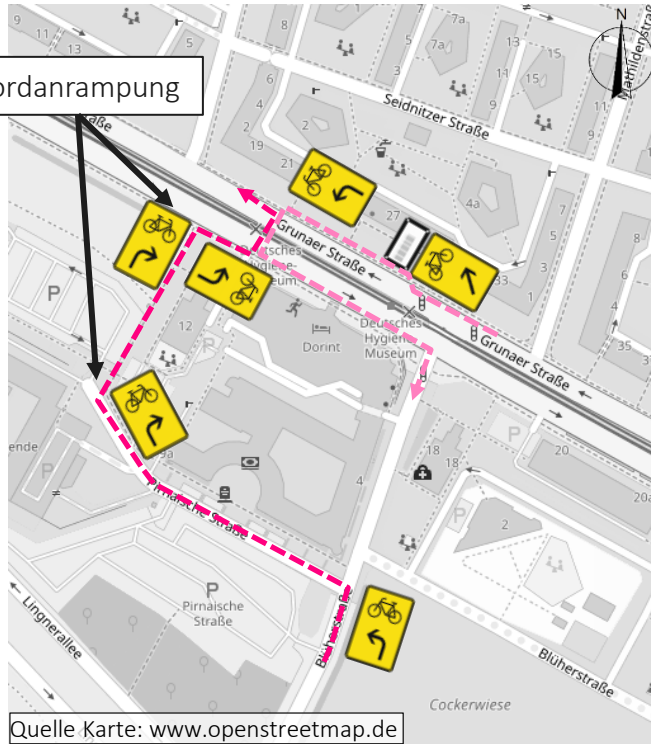


Umleitung der LA-Radfahrer aus Blüherstraße in die Grunaer Straße stadteinwärts.

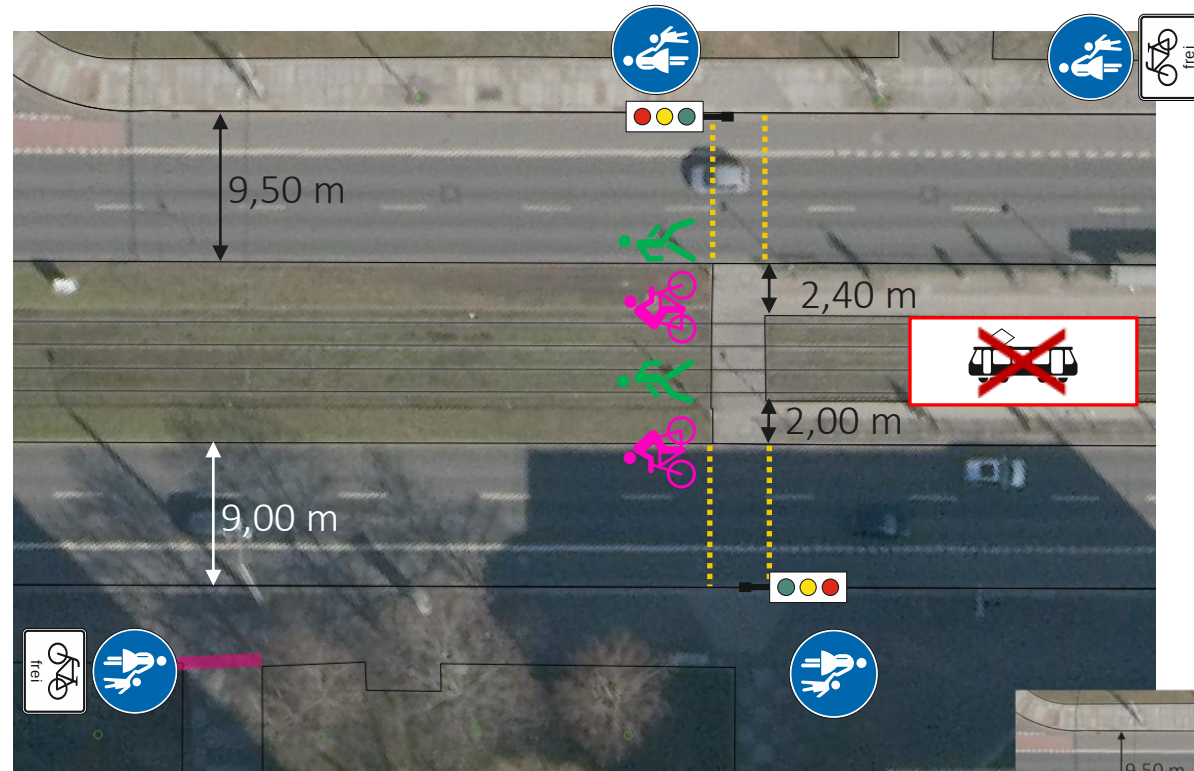

Querungsmöglichkeit (Straßenbahn verkehrt nicht → Aufstellfläche auf dem Gleis)

Für den Fall Bau an zwei Wochenenden und Straßenbahn verkehrt: Reduktion auf 1 Fahrstreifen um Aufstellfläche gewährleisten.

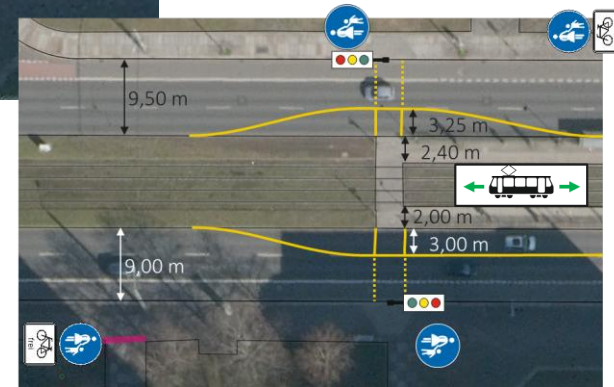

2 LU-Maßnahme Pirnaischer Platz – Gleisüberfahrten St. Petersburger Straße

Variante 1: Sperrung je einer Richtungsfahrbahn der St. Petersburger Straße

Variante 3: Einengung auf 1 Fahrstreifen bei beiden Richtungsfahrbahnen der St. Petersburger Straße


Variante 3 - Möglicher Bauablauf

KW	41		42							43						
Tag	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Datum	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Pirnai. Platz			Bph 1.1				Bph. 1.2					Bph 2.1		Bph 2.2		
Blüher- straße																
Veran- staltung							1 Heimspiel Dynamo - Magdeburg									Mara- thon


Baustart in Abhängigkeit
der Operativplanung
Vrsl. Freitag 18:00

Puffer zum Marathon




V3 – Phase 1.1

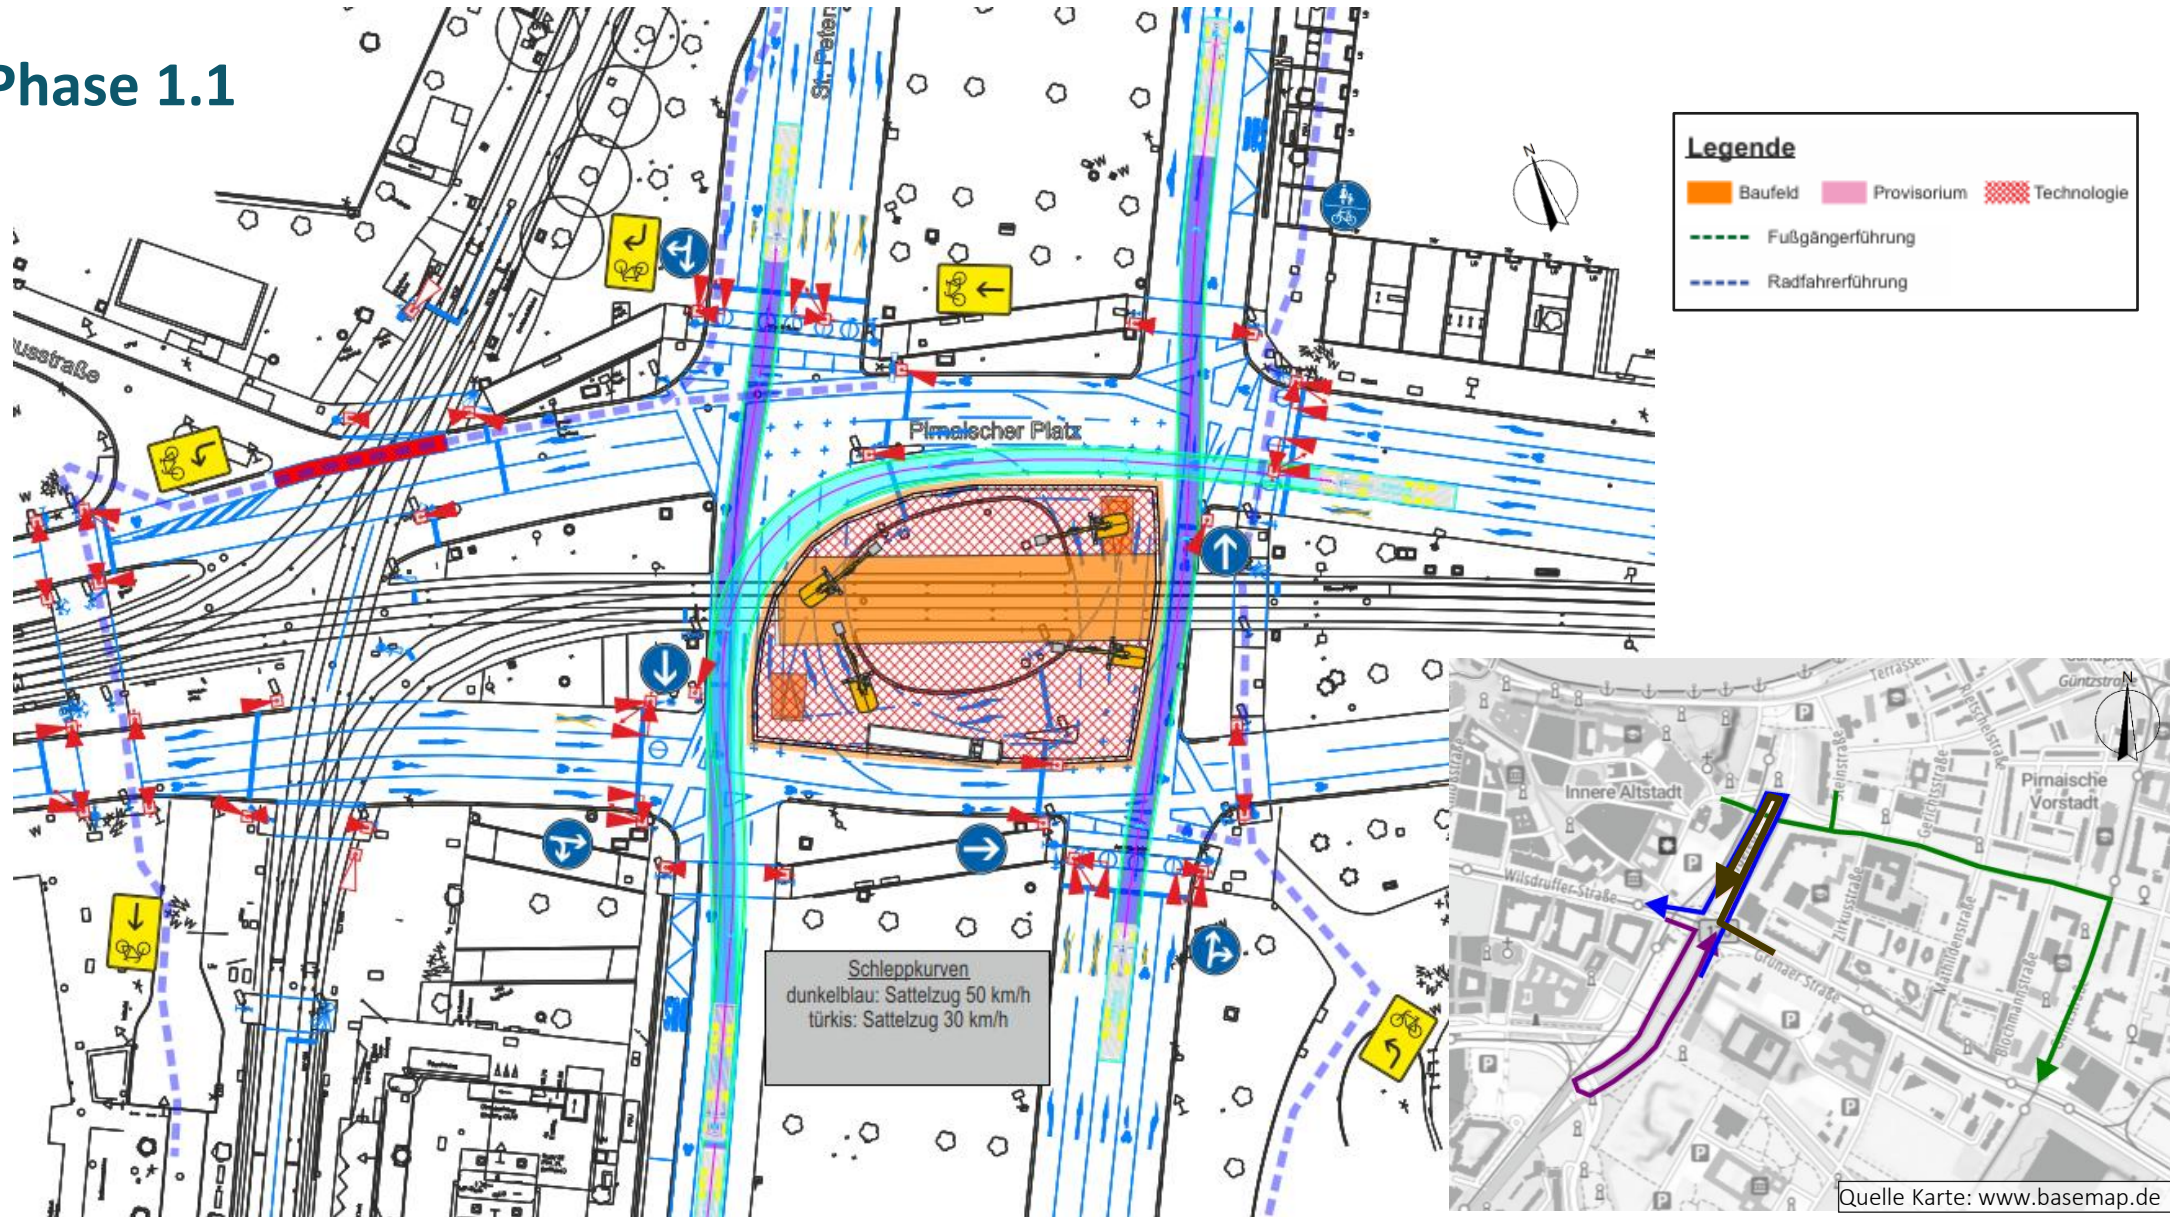

V3 – Phase 1.2

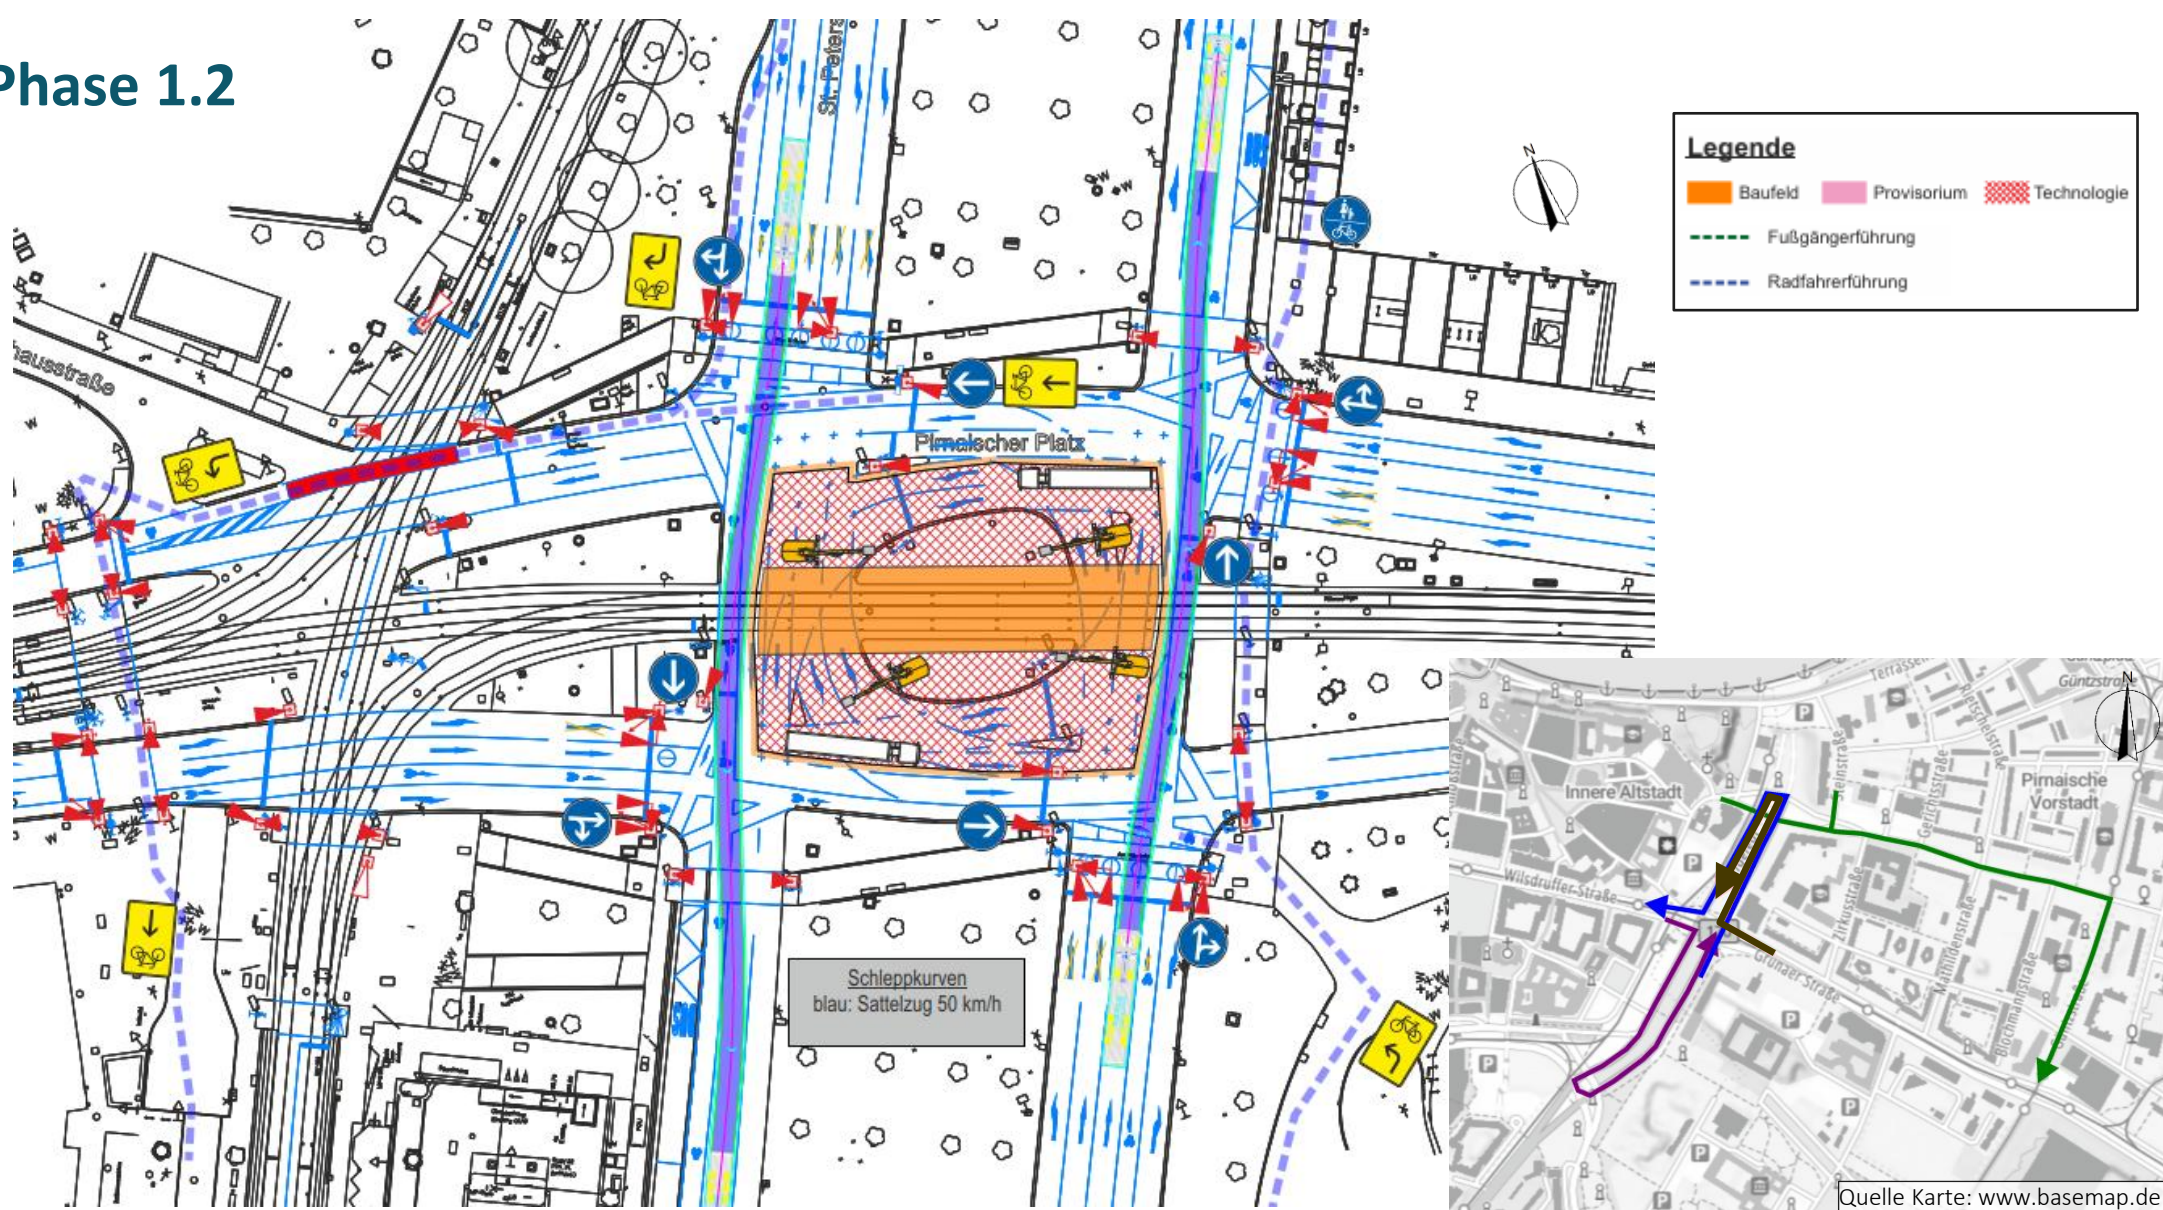


V3 – Phase 1.2

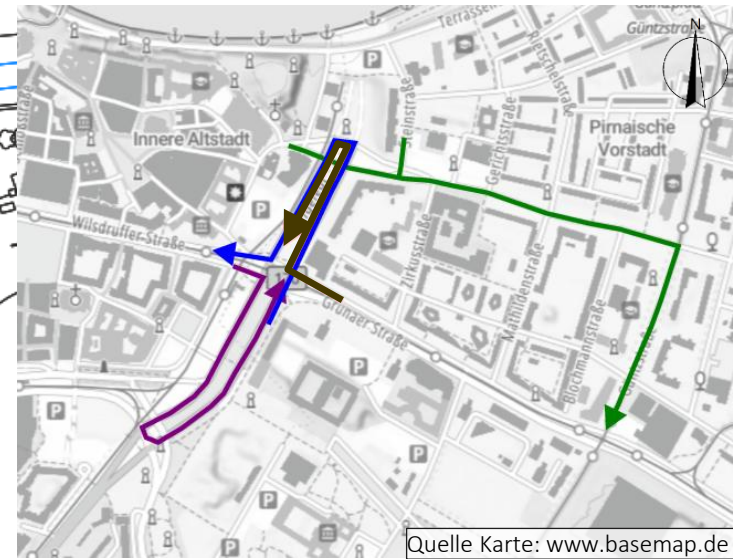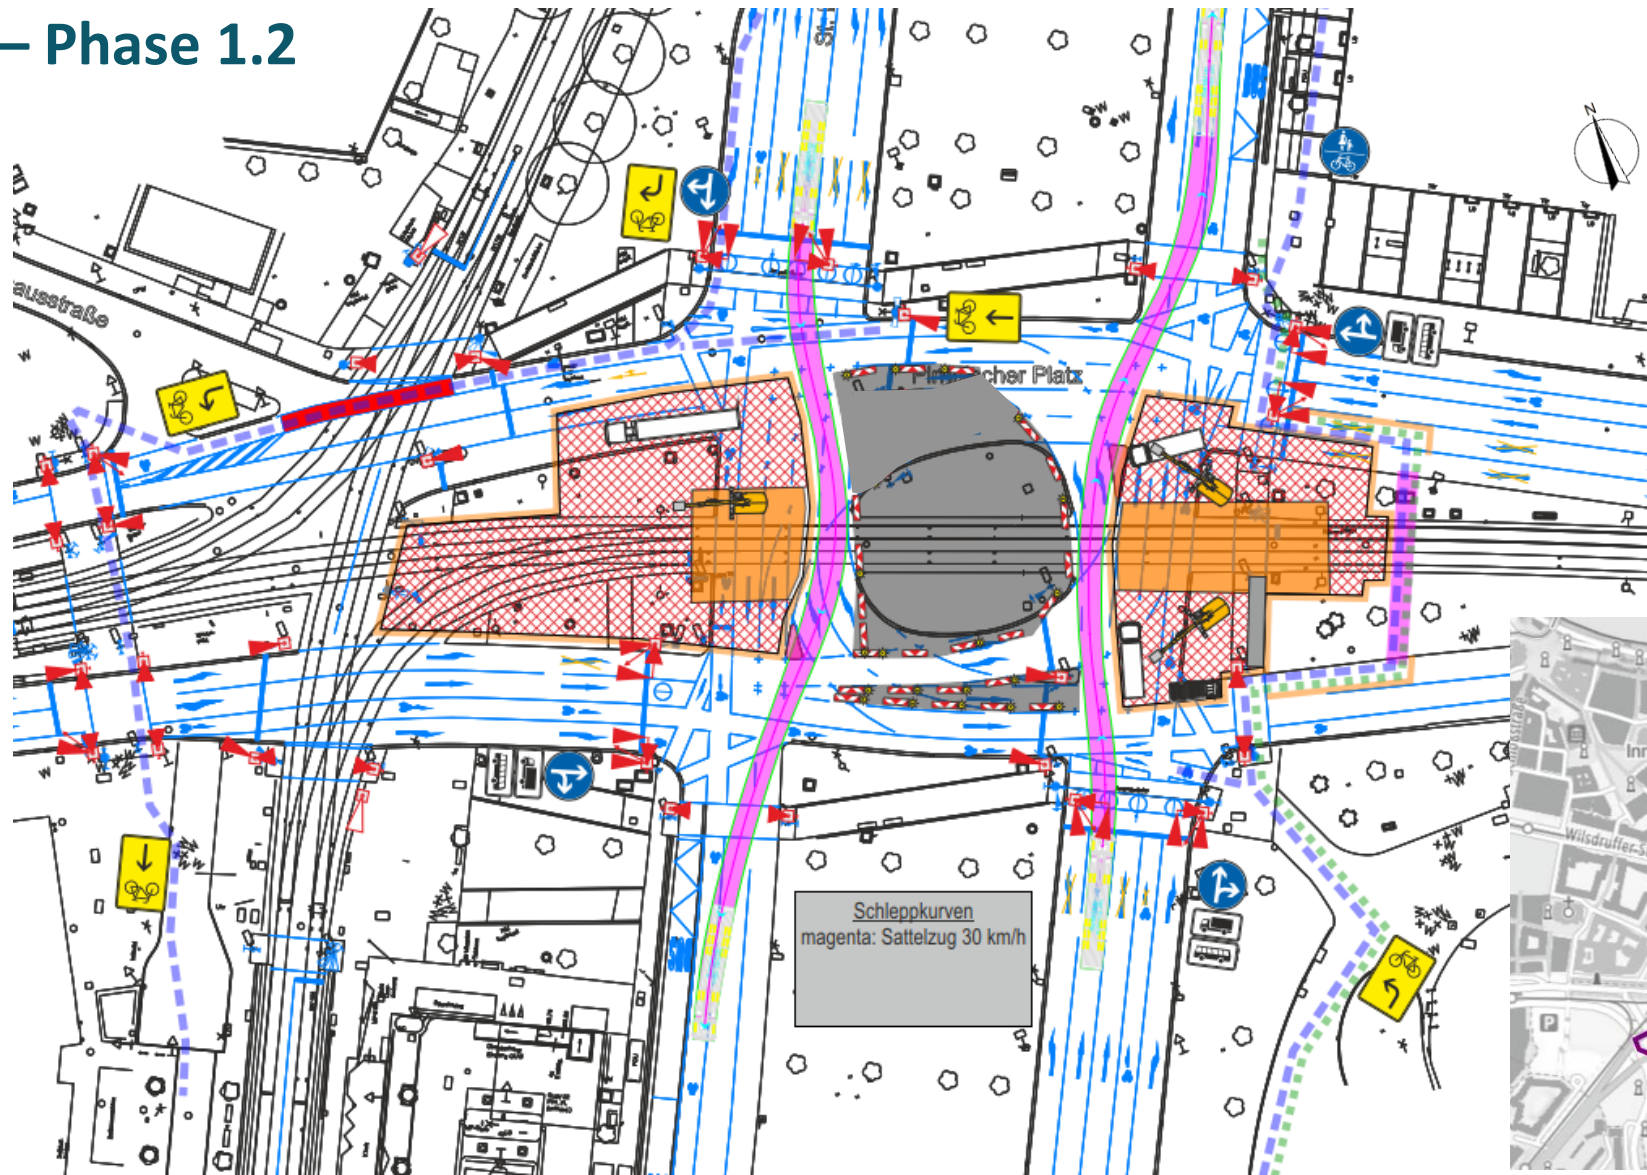

Quelle Karte: www.basemap.de

V3 – Phase 2.2

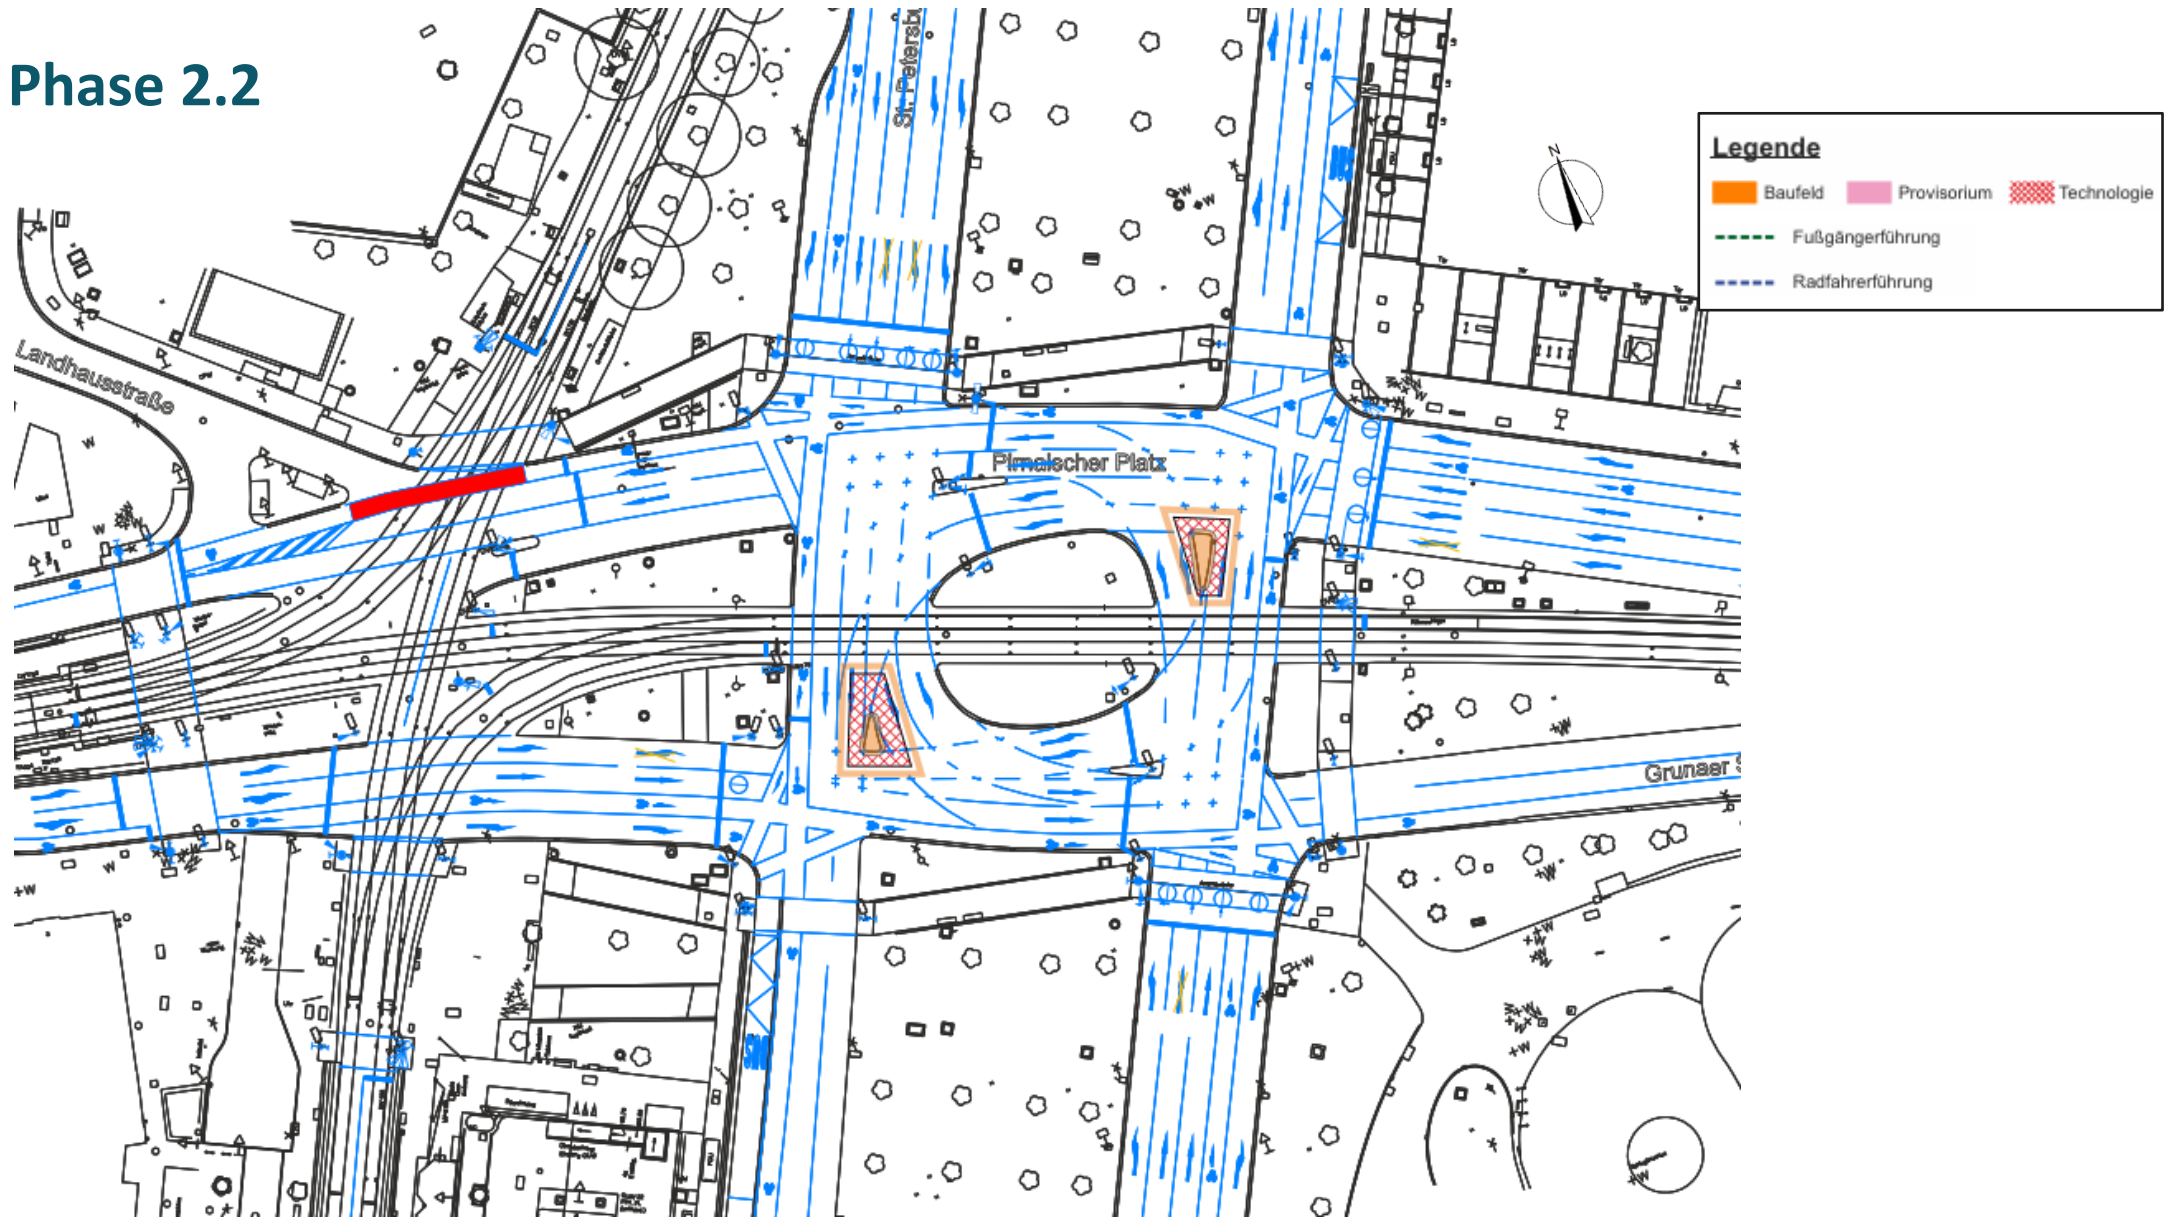

Mögliche Umleitungsführungen

Legende



St.Petersburger Straße



Blüherstraße

