



MITTEL- UND REALSCHULE OBERRONING





BAUABSCHNITT 1A

ABBRUCHARBEITEN
JAN 2026 - APR 2026

NEBENGEBÄUDE,
GARAGEN, MUSIKSAAL,
TEILE D. KLOSTERMAUER

ARTENSCHUTZRECHTL.
MASSNAHMEN
JAN 2026 - FEB 2026

DESCHKA BRETTEN,
SPATZENTURM,
MAUERSEGLERTURM,
NISTKÄSTEN

UMVERLEGUNG
TRINKWASSERLEITUNG
JAN 2026 - JUN 2026





BAUABSCHNITT 1B

NEUBAU C1 + C2 + E + N
JUN 2026 - NOV 2028


ERWEITERUNGSBAU C1
SPORTHALLE C2
ENERGIEZENTRALE E
NEBENGEBÄUDE N

PROVISORIUM FÜR
BAUSTELLENZUFAHRT

NEUBAU BRÜCKE
AUG 2027 - JUN 2027

AUSSENANLAGEN BA1
APR 2028 - NOV 2028

MIT BUSBUCHT &
PROVISORISCHEN
ZUGANG ZU BAUTEILEN

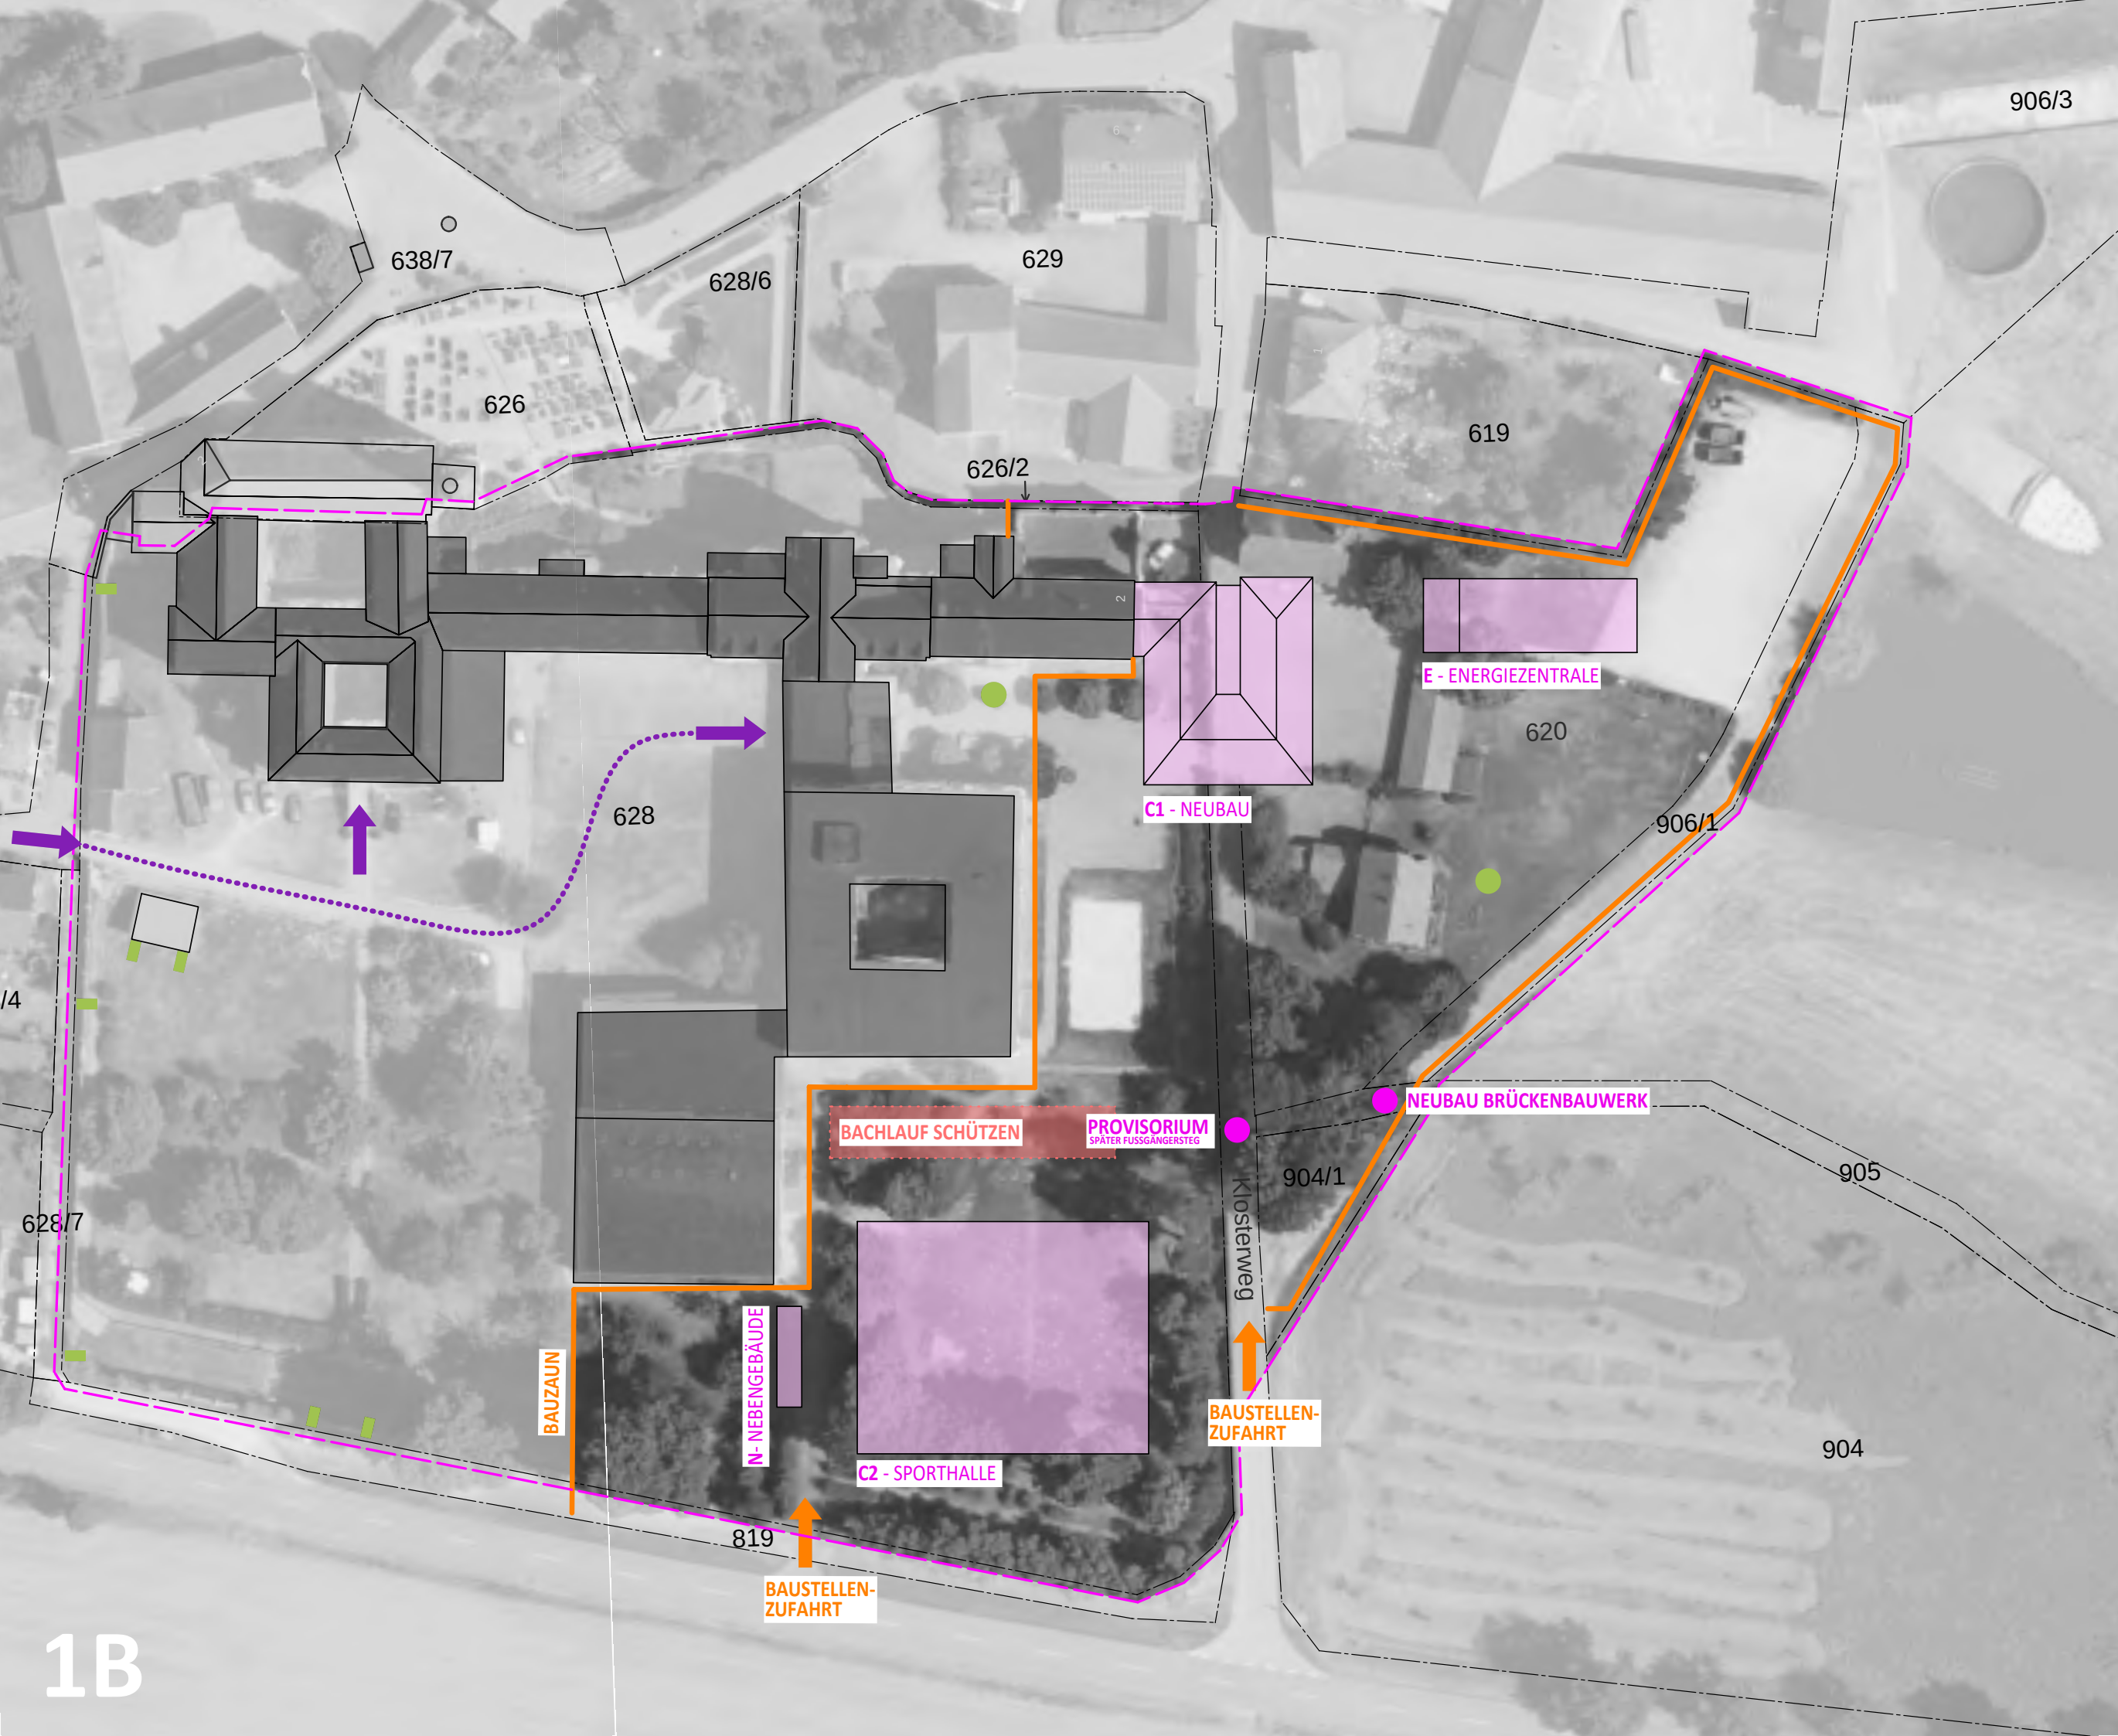



BAUABSCHNITT 2

ABBRUCH
JAN 2029 - APR 2029

NEBENGEBÄUDE,
EHMALIGE KÜCHE,
VERBINDUNGSBAU

SANIERUNG A + B
JAN 2029 - DEZ 2030

BAUTEILE A + B

AUSSENANLAGEN BA2
JUN 2030 - NOV 2030

ZUGANGSBEREICHE FÜR
BAUTEILE A + B;
NORDHOF, SCHWESTERN-
FRIEDHOF,
KLOSTERGARTEN





BAUABSCHNITT 3

ABBRUCH
JAN 2031 - APR 2031

BAUTEIL D

AUSSENANLAGEN BA3
MAI 2031 - SEP 2031

FERTIGSTELLUNG
AUSSENANLAGEN MIT
FREISPORTFLÄCHEN,
LEHRERPARKPLATZ
KLOSTER





SCHNABEL ARCHITEKTEN GMBH
MARKTSTRASSE 35
93444 BAD KÖTZTING

T 09941 94 43- 0

GESCHÄFTSFÜHRER
DIPL.-ING. ARCHITEKT CHRISTOF BAYER
DIPL.-ING. ARCHITEKT MARKUS WEBER
AMTSG. REGENSBURG HRB 9970
STEUER-NR. 211/138/50180

INFO@SCHNABEL-PARTNER.DE
SCHNABEL-PARTNER.DE
