

Am Wehrgraben

VER535

VER535 KR B DN 400 mm
Pos: 8 - 10: Fehlen von Teilen, Länge = 200mm, Mit Steinen abgedeckt



1: 0,70 m i.F.: Fehlen von Teilen 20 cm → wird ggf. abgerissen wegen Neubau




2: 1,80 m i.F.: Schadhafter Anschluss



3: 2,80 m i.F.: fremde Leitungen/Kabel durchqueren Rohrleitung → Alte Gasleitung außer Betrieb von enercity → Ausbauen lassen von enercity → wird ggf. abgerissen wegen Neubau

VER535NN03

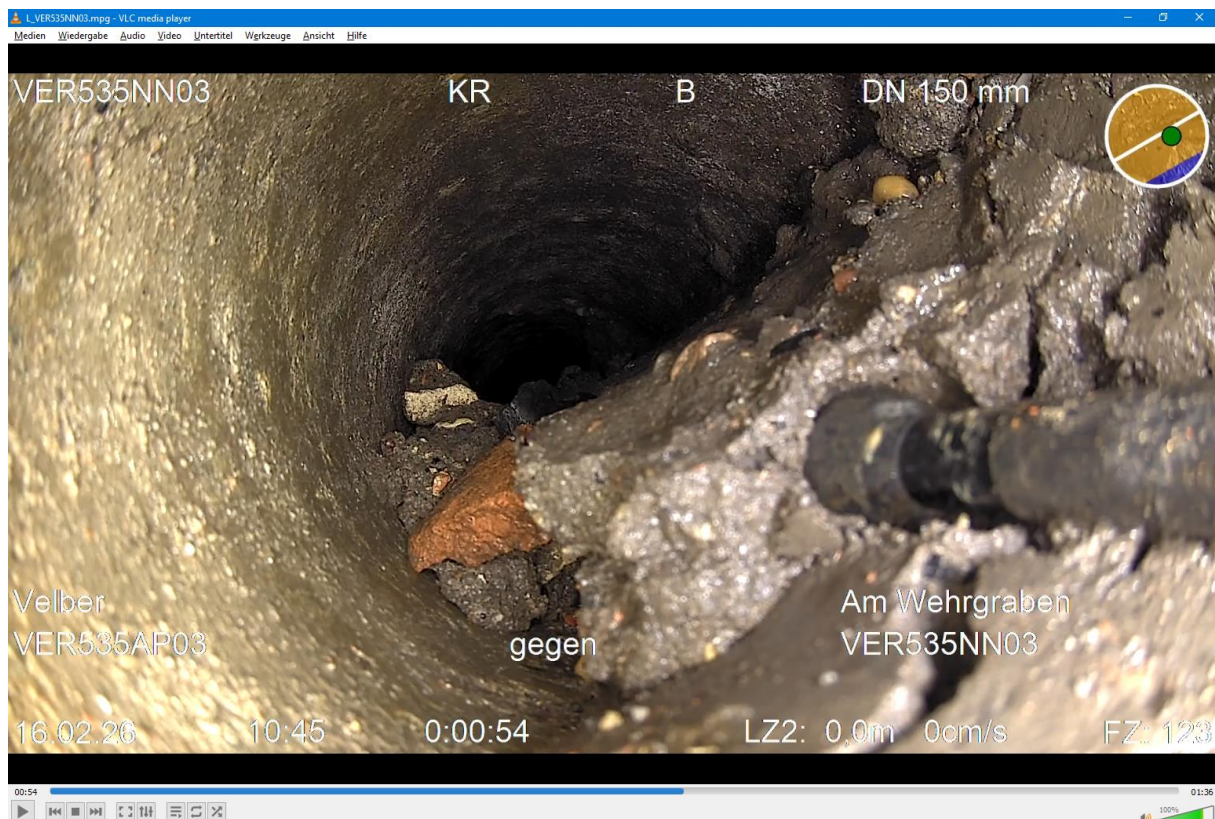

4: 0,00 m g.F.: Ablagerungen 40 % → Spülen möglich?

VER536



5: 21,80 m i.F.: klaffender Riss, komplex



6: 22,20 m i.F.: Fehlen von Teilen

VER540NN01

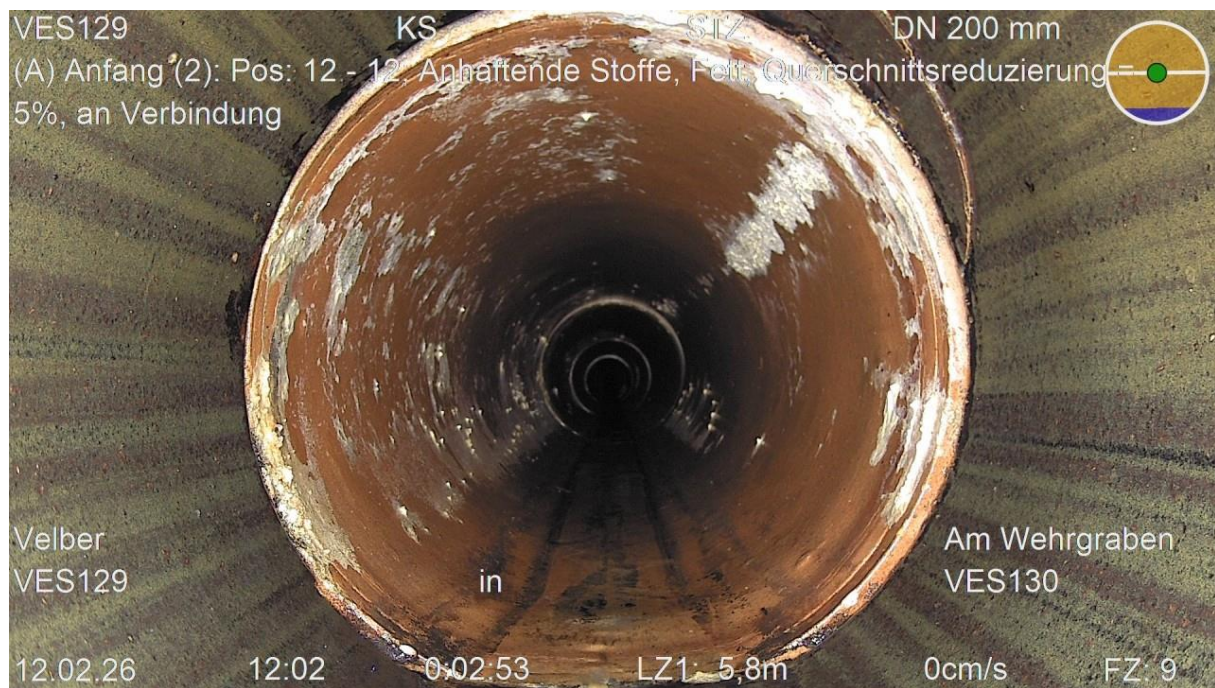


Bild aus Schacht




7: 0,00 m i.F.: Abbruch der Inspektion, da kein Reinkommen in die Leitung (DN100)

VES129



11: 5,80 m g.F.: Riss oben rechts

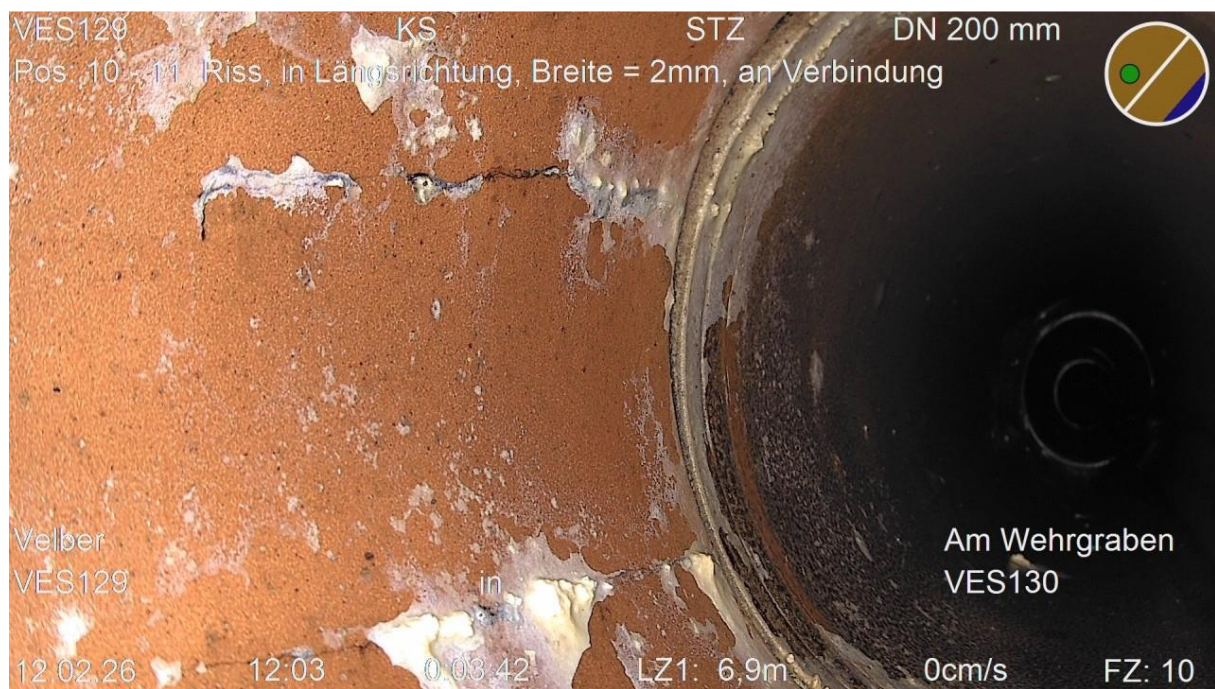


12: 6,90 m g.F.: Risse

VES133



13: 24,30 m i.F.: Risse und Anhaftende Stoffe

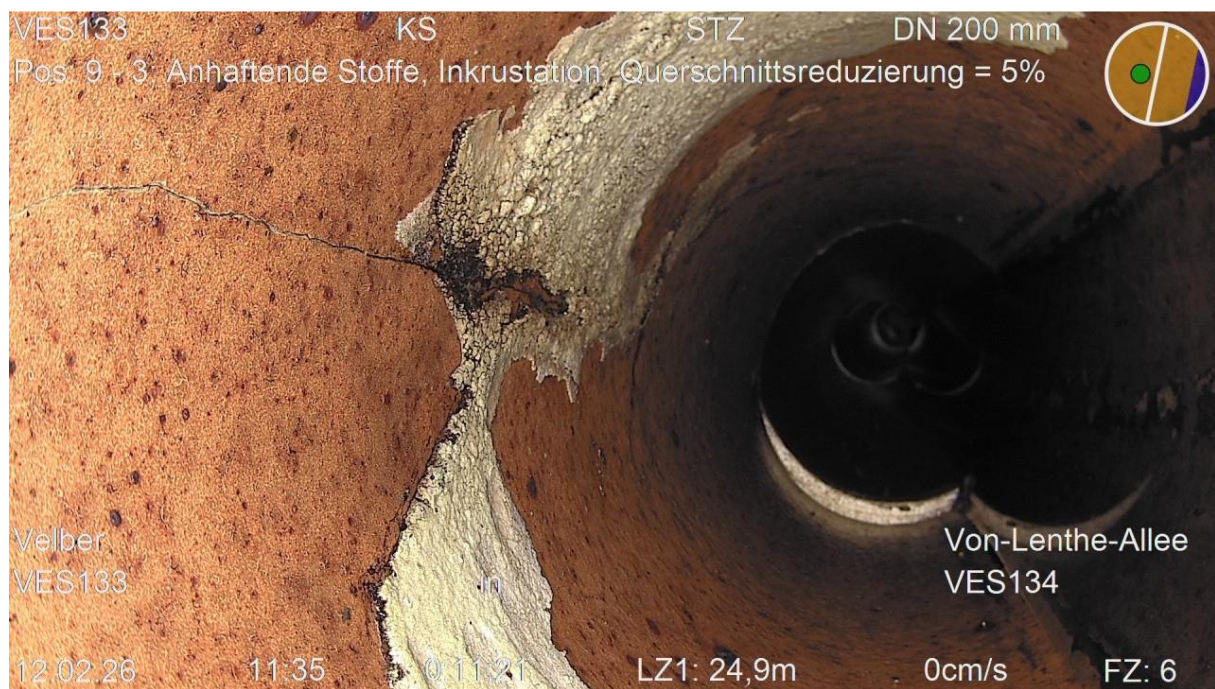


14: 24,90 m i.F.: Risse und Anhaftende Stoffe



15: 28,30 m i.F.: Fehlen von Teilen

VES129 (Schacht)

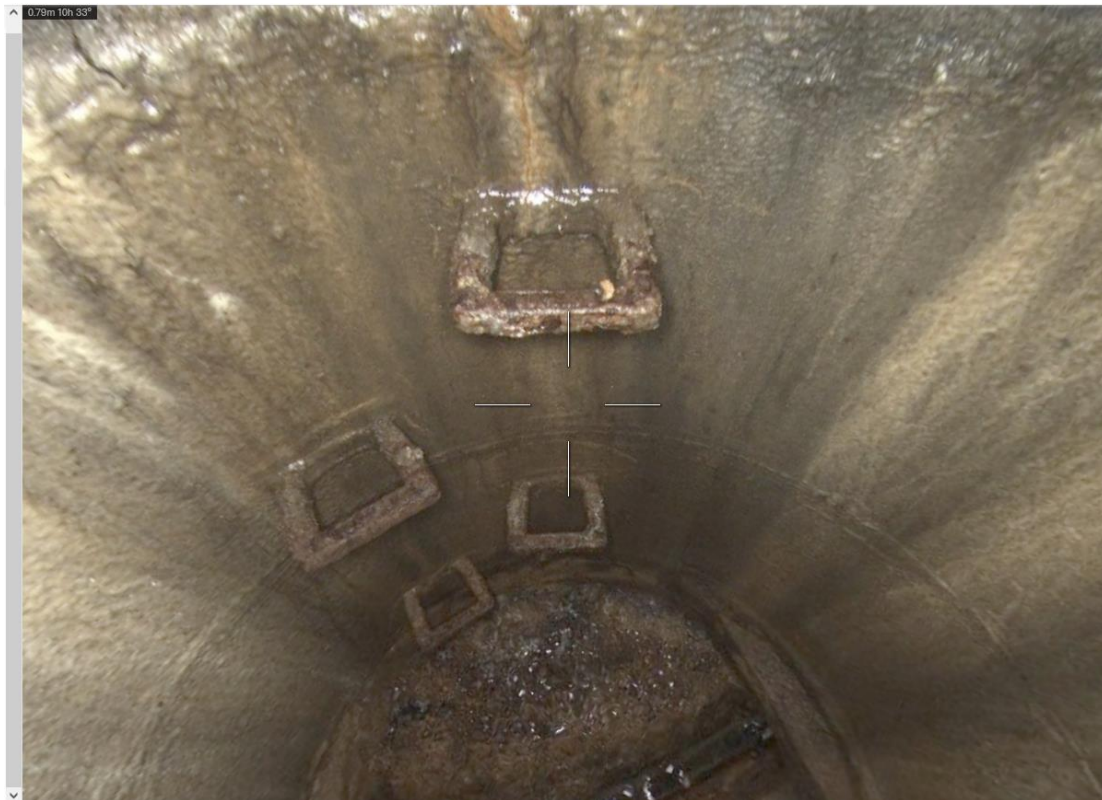

16: Schadhafte Steigeisen
