

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1062-74-03

OAK OP - Neubau von OP-Sälen

Bauvorhaben

**Neubau von OP-Sälen
in Modulbauweise am
Ostalb-Klinikum Aalen
-**

Leistung (LV)

350

Putzarbeiten/WDVS

Ausführungsbeginn

siehe FB 214.H

Ausführungsende

siehe FB 214.H

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

siehe FB 211

Abgabezeit

siehe FB 211

Abgabeort

Vergabeplattform

Zuschlagsfrist

siehe FB 211

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 29

FG Leistungsverzeichnis öffentlich Rev. Nr. 1 /Stand: 0

Leistungsverzeichnis

Projekt (1062-74-03)

OAK OP - Neubau von OP-Sälen

Leistung (LV)

350 Putzarbeiten/WDVS

Bauvorhaben

**Neubau von OP-Sälen
in Modulbauweise am
Ostalb-Klinikum Aalen**

Bauherr

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
vertreten d. Christoph Riess
Im Kälblesrain 1
73430 Aalen

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Markus Schumacher

Ausschreibung / Ansprechpartner

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, brutto:

Summen angeboten

.....
Anbieter - Ort, Datum

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotsprüfung in EUR

.....

.....

.....

Summen geprüft

.....
Prüfer - Ort, Datum

Stempel

.....
Prüfer - Unterschrift

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe FB 211) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | 5,00 % |
| - Bauleistungsversicherung | 0,10 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,20 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,20 % |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11122PP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		A Baubeschreibung	5
		B Allgemeine Vorbemerkungen	6
		C Zusätzliche Vertragsbedingungen	6
		D Besondere Vertragsbedingungen	10
		E Hinweis zur Rechnungsstellung	10
		F Zusätzlich technische Vertragsbedingungen	11
		G Anlagen	11
001	Titel	Baustelleneinrichtung	11
002	Titel	WDVS Wand	12
003	Titel	WDVS Decke	22
005	Titel	Anstrich Aussenputz	27
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

A Baubeschreibung

A Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben:

Name und Anschrift des Auftraggebers/Rechnungsanschrift:

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
Im Kälblesrain 1
73430 Aalen

Angaben zur Örtlichkeit:

Beschreibung des Bauvorhabens:

Neubau von OP-Sälen in Modulbauweise
Im Bereich direkt neben dem Haupteingang (westlich des Forum) soll in Ebene 4 ein neuer Anbau mit 5 OP's errichtet werden.
In Ebene 3 (Niveau Haupteingang) befinden sich Technikräume sowie die Stahlbeton-Stützenkonstruktion für die Betondecke, auf welcher die OP-Station in Modulbauweise errichtet werden soll.

Der Anbau wird teilweise auf Fundamente und teilweise auf dem Bestandskeller abgelastet. Die Fundamente tragen die Lasten über Mikropfähle ins Erdreich ab.

Weiterhin wird es kleine Anpassungsarbeiten im Bestand geben.

Die Technikräume auf Ebene 3 (Haupteingangsebene) erhalten ein WDVS sowie die komplette Decke über der Ebene 3 (Deckenunterseite des "Tisches") inkl. der Unterzüge.

Anschrift der Baustelle:

Ostalb Klinikum
Im Kälblesrain 1
73430 Aalen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Ostalb Klinikum (OP, Notaufnahme, Haupteingang)

Anzahl und Höhe der Geschosse:

Neubau

- EG Technikräume in Massivbauweise(Ebene 3)
- aufgeständertes 1. OG (OP-Bereich - Ebene 4)
- 2. OGTechnikebene Lüftungszentrale (Ebene 5)

Angaben zur Baustelle:

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:

In in Ebene 3 und Ebene 4

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

A Baubeschreibung

Zufahrtmöglichkeiten:

Siehe beigefügten Baustelleneinrichtungsplan

ACHTUNG: Zufahrt zur Notaufnahme ist direkt angrenzend zum Baufeld und muss jederzeit frei bleiben.

Lage und Transportwege auf der Baustelle:

Siehe beigefügten Baustelleneinrichtungsplan

Baustelleneinrichtung:

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:

Wasser: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlüsse sind durch den AN herzustellen

Strom: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlüsse sind durch den AN herzustellen

Abwasser: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlüsse sind durch den AN herzustellen

Art / Lage der Lagerplätze:

Siehe beigefügten Baustelleneinrichtungsplan

Angaben zur Ausführung:

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig.

Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Vom Auftraggeber werden keine Container gestellt.

Für das Aufstellen und Entsorgen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.

B Allgemeine Vorbemerkungen

Siehe Formblatt 212.

Zusätzlich ist Grundlage für die Vergabe und Ausführung die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB/B und VOB/C mit den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) als Ganzes, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung

C Zusätzliche Vertragsbedingungen

Die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers, ohne

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS
C Zusätzliche Vertragsbedingungen		
gesonderte Vergütung, umfasst auch: 1. Die Ruhezeitenverordnungen der zuständigen Gemeinde bzw. des Bauvorhabens sind zu beachten! In der Regel sind zwischen 19.00 Uhr bis 7.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr lärmverursachende Arbeiten zu unterlassen. 2. Die Terminvorgaben und der Ablaufrahmen nach beiliegendem Bauzeitenplan sind grundsätzlich einzuhalten und sind als Minimalforderung für die Besetzung der Baustelle anzusehen. Verzögerungen müssen durch umgehende Verstärkung der Baustellenbesetzung aufgeholt werden! 3. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle über die örtlichen Verhältnisse zu informieren. 4. Die Ausführung hat zügig und ohne Unterbrechung zu erfolgen. 5. Die Vornahme notwendig werdender Sicherungsarbeiten der eigenen Leistungen gegen Frost und sonstige Witterungseinflüsse sowie Sicherungsarbeiten gegen Schäden, die durch andere am Bau beteiligte Unternehmen entstehen können. 6. Die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen zur Einhaltung polizeilicher, berufsgenossenschaftlicher und sonstiger amtlicher Vorschriften (wie Umweltschutz u.a.), welche die Baustelle betreffen. 7. Der Auftragnehmer hat ferner alle notwendigen Unterlagen für die Anmeldungsanzeige, genehmigungs- und überwachungs- pflichtigen Anlagen an die Aufsichtsstellen bzw. Genehmigungsbehörden (z.B. Bauaufsicht, TÜV, Gewerbe- und Ordnungsamt) ohne Entgelt zu liefern. Alle behördlichen Abnahmen hat der Auftraggeber zu veranlassen. Die Abnahmegebühren trägt der Bauherr. 8. Die für die Arbeiten des Auftragnehmers notwendige Bauleitung und verantwortliche Fachbauleitung. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 9. Bei Einreichung von Nachtragsangeboten sind diese fortlaufend (für jedes einzelne Gewerk extra) zu nummerieren, ebenso die Positionen. Diese sind außerdem mit dem Vorzeichen "N" zu versehen. Zusätzlich zu den Einheitspreisen sind die Maße anzugeben und die Summen auszuwerfen.		

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS						
C Zusätzliche Vertragsbedingungen								
10. Ein Anschlusspunkt für Baustrom und Bauwasser werden jeweils bauseits gestellt. Die Kosten des Verbrauchs trägt der Auftraggeber. Ausgenommen sind Verbrauchskosten für die Benutzung von Unterkünften des Auftragnehmers. Die Kosten hierfür sind in die Vorhalteposition der Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen: <table><tr><td>Baustrom:</td><td>0,2%</td></tr><tr><td>Bauwasser:</td><td>0,2%</td></tr></table> Sonstige Gemeinschaftskosten Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Leistung zur Verfügung: Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen: <table><tr><td>Bauleistungsversicherung:</td><td>0,01%</td></tr></table>			Baustrom:	0,2%	Bauwasser:	0,2%	Bauleistungsversicherung:	0,01%
Baustrom:	0,2%							
Bauwasser:	0,2%							
Bauleistungsversicherung:	0,01%							
11. Verteilung der Gefahr nach § 7 VOB/B: Vom Auftraggeber beige stellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.								
12. Die Gerüste dürfen, soweit sie am Bauwerk vorhanden sind, mit voller Verantwortung des Auftragnehmers benützt werden. Notwendige Änderungen und Ergänzungen, auch über den Rahmen der VOB hinaus, sind vom Auftragnehmer durchzuführen.								
13. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vorgehaltenen sanitären Anlagen während der Bauzeit mit zu benutzen.								
14. Für die Einrichtung und Sicherung von Aufenthalts- bzw. Lagerräumen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.								
15. Werden vom Auftragnehmer Schäden an der Leistung anderer Gewerke verursacht, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese nach angemessener Frist auf Kosten des Verursachers beheben zu lassen.								
16. Die Einheitspreise des Angebots verstehen sich einschließlich Materiallieferungen, Nebenarbeiten und Erschwerissen, welche zur abnahmefähigen Erstellung jedes einzelnen Gewerkes erforderlich sind, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht besonders erwähnt ist.								

350	LV	Putzarbeiten/WDVS
C Zusätzliche Vertragsbedingungen		
17. Die Beanspruchung einzelner Räume im Bauobjekt für Werkzeug und Materiallagerung während der Bauzeit, kann nur nach vorheriger Rücksprache mit der örtlichen Bauaufsicht gestattet werden. Für die Sicherheit haftet jeder Auftragnehmer für sich allein. Werden die oben genannten Räume wegen des Baufortschritts benötigt, so sind sie nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht unverzüglich zu räumen. 18. Für die ordnungsgemäße, regelmäßige Beseitigung des anfallenden Bauschutts und Verunreinigungen gemäß Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) auf entsprechende Deponien hat jeder Unternehmer selbst zu sorgen. Die bauseitigen Container stehen dafür nicht zur Verfügung! Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese Reinigung und ordnungsgemäße Entsorgung selbst zu veranlassen. Die anfallenden Kosten werden auf die verursachenden Firmen umgelegt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 19. Systemleistungen sind ausschließlich mit den Materialien des gewählten Systemanbieters zu erbringen. 20. Regiearbeiten und evtl. Nachtragsarbeiten dürfen nur nach vorhergehender Genehmigung durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten ausgeführt werden. Über alle ausgeführten Regiearbeiten muss ein Nachweis unter Angabe der Art der Arbeiten, der dafür aufgewendeten Stunden, getrennt nach Art der Arbeitskräfte sowie des Materialverbrauchs u. des Maschinen- und Geräteeinsatzes erbracht werden. 21. Entgegen dem § 17 Abs. 8 VOB/B wird vereinbart, dass die Sicherheit für Mängelansprüche (Bankbürgschaft) nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben ist und nicht nach Ablauf von 2 Jahren.		

350 LV Putzarbeiten/WDVS

D Besondere Vertragsbedingungen

D Besondere Vertragsbedingungen

Siehe Formblatt 214. H

E Hinweis zur Rechnungsstellung

Um Rechnungen zügig bearbeiten zu können sind folgende Angaben einzuhalten und zu beachten:

1 Rechnungsanforderungen

Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmens

Vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsempfängers

(Bauherr/Auftraggeber)

das Ausstellungsdatum

Angabe Leistungsdatum bzw. Leistungszeitraum

eine einmalig von dem Unternehmer vergebene Rechnungsnummer

Auftragsnummer der Vergabestelle sowie das genannte Bauvorhaben

(vgl. beiliegendes Auftragsschreiben)

International Bank Account Number (IBAN)

Bank Identifier Code (BIC)

die Menge und Art der gelieferten Artikel / Dienstleistungen mit Bezug

auf die betreffenden Positionen im Leistungsverzeichnis

das Entgelt sowie Entgeltminderungen - aufgeschlüsselt nach Steuersätzen

2 Kumulierung

Alle Rechnungen mit Anlagen sind kumuliert zu stellen und bei dem beauftragten Planungsbüro zur Rechnungsprüfung einzureichen. Aus der Rechnung müssen die Leistungen seit Baubeginn und die bereits geleisteten Abschlagszahlungen ersichtlich sein. Bei allen Teilrechnungen sowie der Schlussrechnung ist der bis zu diesem Zeitpunkt angefallene Gesamtauftragswert, abzüglich der bereits gestellten Rechnungen sowie der eventuell vereinbarten Nachlässe und Skonti auszuweisen.

3 Rechnungsbezeichnung

Um eine schnellstmögliche Rechnungsprüfung und -bearbeitung gewährleisten zu können, bitten wir um deutliche Angabe der aktuellen Rechnungsbezeichnung.

TR = Teilrechnung mit fortlaufender Nummer

SR = Schlussrechnung

RR = Regierechnung

4 Allgemeine Angaben zur Rechnungsstellung

Die Schlussrechnung kann erst nach erfolgter Abnahme und unter Einreichung eines prüffähigen Aufmaßes sowie Regieberichte, etc. bearbeitet werden. Nicht prüffähige Rechnungen werden zu unserer Entlastung zurückgesendet.

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

E Hinweis zur Rechnungsstellung

Regiepositionen können nur abgerechnet werden, wenn die dazugehörigen Regieberichte vollständig unterzeichnet mit eingereicht werden.

Zusatzarbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis angegeben wurden, müssen vorab durch ein Nachtragsangebot - mit Bezug auf die betreffenden Positionen im Leistungsverzeichnis - eingereicht und anschließend vom Bauherrn beauftragt werden.

I Zusätzlich technische Vertragsbedingungen

- nach ATV - VOB/C
 - Ausführung der Leistungen nach anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der entsprechenden, aktuell gültigen DIN-Vorschriften, den spezifischen Fachvorschriften sowie den Zulassungen und Hersteller
- Verarbeitungsrichtlinien der

G Anlagen

- Pläne Architektur:

-  OAK-BT2-ARC-A-SN-XX- -302-1-F.pdf
-  OAK-BT2-ARC-A-SN-XX- -301-1-F.pdf
-  OAK-BT2-ARC-A-GR-03- -230-1-F.pdf
-  OAK-BT2-ARC-A-GR-02- -220-1-F.pdf
-  OAK-BT2-ARC-A-AN-XX- -312-1-F.pdf
-  OAK-BT2-ARC-A-AN-XX- -311-1-F.pdf

001 Titel Baustelleneinrichtung

001.01 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die Durchführung der WDVS zur Errichtung des Bauvorhabens, mit An- und Abfuhr sämtlicher erforderlicher Maschinen, fahrbare Gerüste, Geräte und Werkzeuge und sonstiger Betriebsmittel in ausreichender Anzahl und gesamtem Umfang. Abbauen und Abfahren des Materials nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Räumen der Baustelle mit allen Nebenarbeiten.

Die Absicherung der Baustelle gemäß UVV für die eigenen Arbeiten ist vom AN für die eigene Bauzeit sicherzustellen. Abbau nach der regulären

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS
001	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungszeit ist einzukalkulieren. Der AN hat bei der Bauleitung die Lage der Baustelleneinrichtung vor Einrichten der Objektüberwachung genehmigen zu lassen. Das Nachführen der Baustelleneinrichtung im Bauablauf ist mit einzukalkulieren. Inkl. Baustromunterverteiler für die eigene Bauzeit und die unterschiedlichen Geschosse Baustrom inkl. Hauptanschluss wird bauseits gestellt, ebenso der WC-Container und der Bauzaun 1 Psch			Übertrag: <

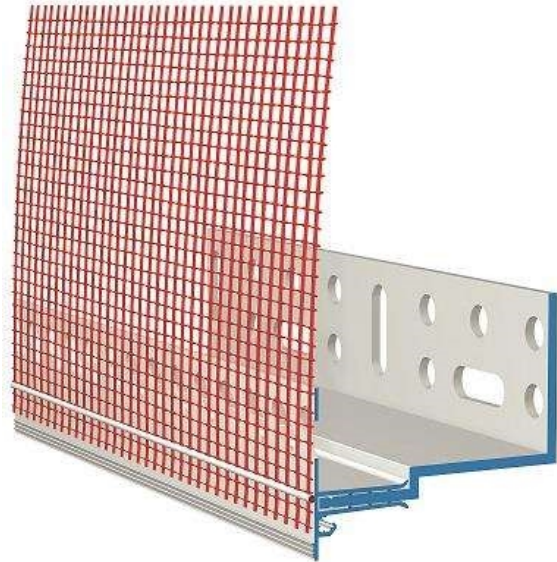
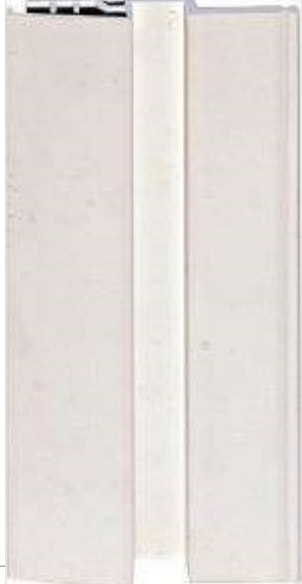
Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. System: '.....' (vom Bieter auszufüllen)				
Hinweis Hinweis Die Ausführung der Positionen Untergrundvorbereitung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß und Freigabe durch die örtliche Bauleitung. Dehnfugen hängen vom gewählten System und den Herstellervorgaben ab. Aus diesem Grund sind die Dehnfugen in die EP-Preise zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet VORARBEITEN				
002.01	Untergrund prüfen Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm ² aufweist. Die dauerhafte Verträglichkeit zwischen einer eventuell vorhandenen Beschichtung und dem Klebemörtel ist zu prüfen. Mit dem Klebemörtel dürfen Unebenheiten bis maximal 1 cm/m, bei geklebten, bis maximal 2 cm/m, bei geklebten und gedübelten Systemen ausgeglichen werden. Hinweis: Der Untergrund ist auf Verwendbarkeit sowie nach den Kriterien der allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen zu prüfen. Darüber hinaus ist die DIN 18345 zu berücksichtigen.			
		125 m ²	EP.....	GP
002.02	Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) entfernen sowie sonstige Unebenheiten und Teile auf der Fläche beseitigen.			
		125 m ²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	DÄMMARBEITEN			
002.03	Sockelprofil therm Anbringen des unteren Abschlusses des WDVS mit Hilfe eines zweiteiligen Sockelprofils aus Kunststoff (wärmebrückenminimierend) mit aufsteckbarem Tropfkanteprofil und verschweißtem Arm.-Gewebe. Wandbefestigung waage- und fluchtrecht mit Kragenkopfnageldübeln (ca. 3 Stk./m). Unebenheiten sind mit Ausgleichsstücken auszugleichen. Bei Dämmdicken > 160 mm Verlängerung (Breite 4 cm) zum Aufstecken auf das Sockelprofil verwenden. Dämmstoffdicke: 120 mm Richtfabrikat: Baunit oder gleichwertig SockelProfil therm AusgleichStücke NagelDübel ND-K angeb. Fabrikat: '.....'			
	 			
		45 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
002.04	Anschluss an Fenster und Türen mit Anputzleiste Herstellen eines flexiblen Putzanschlusses an Fensterelementen, Türanlagen, anderen klebegeeigneten Bauteilen gem. Herstellervorschrift mit einer zweiteiligen, selbstklebenden und beweglichen Anputzleiste mit Schutzlippe zur Ausbildung einer dauerelastischen, schlagregendichten und witterungsbeständigen Bewegungsfuge. Richtfabrikat: Baunit oder gleichwertig angeb. Fabrikat: '.....'			
				
		18 m	EP.....	GP
002.05	WDVS Dämmschicht Mineralwolle WLG 035 Anbringen einer Mineralwollgedämmplatte mit geringerer Rohdichte nach DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP und DI/WI, beidseitig beschichtet, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K). Verbesserung des Schalldämm-Maßes. Verdübelung oberflächenbündig mit Dübelteller Platten mit dem systemzugehörigen, mineralischen - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Klebspachtel fluchtrecht und planeben nach den Bestimmungen der gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufkleben und verdübeln Liefern, Einbauen und verdübeln Rohdichte: 85 kg/m³ nach DIN EN 1602 Dicke: 120 mm WLG 035 angebt. Fabrikat: '.....'			Übertrag:
		125 m²	EP.....	GP
002.06	Armierungsschicht/Gewebespachtelung Armierungsschicht/Gewebespachtelung Herstellen einer zusätzlichen Unterputzlage unter der Armierungsschicht zur Verbesserung der mechanischen Stabilität gegen Stoßbeanspruchungen. Einbettung eines schiebefesten, alkalibeständigen und verstärkten Textilgewebe mit systemzugehörigen Armierungsmörtel nach Herstellervorschrift auf Stoß. Passend zum angebotenen System Liefern und einbauen Angeb. Fabrikat: '.....'			
		125 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS
002	Titel	WDVS Wand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
002.07	Armierungsgewebestreifen bündiger Sockelausildung Armierungsgewebestreifen bei bündiger Sockelausildung Zusätzlichen Armierungsgewebestreifen, ca 30 cm breit, bei bündigem Sockelübergang im Bereich der Plattenstöße der Sockeldämmplatte und der WDVS Dämmplatte als zusätzliche Armierung einbauen. angeb. Fabrikat: '.....'	45 lfdm	EP.....	GP
002.08	Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS Gewebe-Eckwinkel mit Kunststoffschiene (Kantenprofil) an allen Kanten / Leibungen / Ecken, lot- und fluchtrecht im Armiermörtel ansetzen.	15 m	EP.....	GP
002.09	WDVS Verdübelung SchraubDübel WDVS Verdübelung SchraubDübel oberflächenbündige Montage Verdübelung der Fassadendämmplatten gem. gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit nach ETA zugelassenen SchraubDübeln mit dazugehörigem Verschlusselement als oberflächenbündige Montage. Verdübelung erfolgt durch das Gewebe. Dübel gem. Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Dübellastklasse: = 0,75 kN Untergrund: Betondecke Anzahl der Dübel (Stk./m²) nach der Dübel-/Systemlastklasse gem. dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS (DIN EN 1991-1-4) bzw stat. Nachweis Verdübelungsschema nach Herstellerrichtlinien. Dübelanzahl: '.....' Stk./m² Dübellänge: '.....' mm Tellerdurchmesser: min 60 mm Schaftdurchmesser: min 8 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	angebt. Fabrikat: '.....'			
		125 m²	EP.....	GP
002.10	Putzanschlüsse an Durchdringungen Erstellen einer Anschlussabdichtung/eines Putzanschlusses an Durchdringungen mit vorkomprimiertem Fugendichtband zur Ausbildung einer dauerelastischen, schlagregendichten und witterungsbeständigen Bewegungsfuge, gem. Herstellervor- schrift.			
	Richtfabrikat: Baunit oder gleichwertig			
	angeb. Fabrikat: '.....'			
				
		5 m	EP.....	GP
	GRUNDIERUNG			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
002.11	Grundierung Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie als Haftvermittler für den nachfolgenden Oberputz auf die Armierungsschicht aufbringen. Inkl. Leibungen und Kleinflächen. passend zum angebotenen System liefern und einbauen Angeb. Fabrikat: '.....'	125 m²	EP.....	GP
OBERPUTZ				
A0001	Oberputz, Silikat, AW, 3mm Ausführungsbeschr. Auftragen und strukturieren eines Oberputzes aus einem hoch wasserdampfdurchlässigen (diffusionsoffenen), voll deckenden pastösen Oberputz. Oberputz: Silikatputz, pastös Körnung: 3 mm Struktur: Kratzstruktur Sonderausstattung: algizid-/fungizid ausgerüstet Farbton: rot, wie Bestand Hersteller/Fabrikat: Baunit / Silikatputz oder gleichwertig passend zum System Angeb. Fabrikat: '.....'			
002.12	Oberputz, Silikat, AW, Wände <i>wie beschrieben</i> Bauteil: Wände	125 m²	EP.....	GP
002.13	Oberputz Silikatputz, außen, Leibungen 230mm <i>wie beschrieben</i> Bauteil: Leibungen bis ca. 200mm Tiefe	18 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	SOCKEL			
002.14	Sockel-/Perimeterdämmung 035 Sockel-/Perimeterdämmung 035 Anbringen von Sockel,- und Perimeterdämmplatten aus EPS, stumpf, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, Brandklasse E (DIN EN 13501-1), Wärmeleitzahl 035 Verarbeitung und Befestigung nach Herstellervorschrift, gewaffelte Strücktur für Sockelputz Dämmstoffdicke 120 mm Dämmhöhe: 40 cm ü. GOK	18 m²	EP.....	GP
002.15	Zulage Verdübelung Sockel-/Perimeterdämmung Zulage Verdübelung Sockel-/Perimeterdämmung oberflächenbündige Montage Dübelung mindestens 15 cm über GOK Verdübelungsschema nach Herstellerrichtlinien. Verankerungstiefe: mind. 25 mm Dübelanzahl: 4 Stk./m² Tellerdurchmesser: 60 mm Schaftdurchmesser: 8 mm angeb. Fabrikat: '.....'	18 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
002.16	Vollflächige zementfreie Armierungsschicht Vollflächige zementfreie Armierungsschicht für Putzsystem Sockel WDVS Vollflächige Armierungsschicht aus zementfreier gebrauchsfertiger Klebe- / Armierungsmasse und Armierungsgewebe aus alkalibeständigem Glasfasergewebe auf Systemdämmplatten liefern und auftragen. Systemzugehörigen, vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel auf Systemdämmplatte volldeckend auftragen, alkalibeständiges Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. 10 cm Mindestmaß der Überlappung von Armierungsstößen. Verarbeitung nach Herstellerangaben Angeb. Fabrikat: '.....'	18 m²	EP.....	GP
002.17	Sockelarmierung und Oberputzlage Oberputzlage Kalk-Zement-Putz, zur Herstellung von fein gefilzten Oberflächen auf mineralischen Untergründen, für außen und innen. Speziell als Oberputz mit hervorragender Untergrundhaftung, , vor allem für den Sockelbereich oder als feiner Oberputz im Innen- und Feuchtbereich geeignet. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2. Filzputzlage Mindestgesamtputzdicke nach Herstellerangaben angeb. Fabrikat: '.....'	18 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
002	Titel	WDVS Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
002.18	Flexible Dichtungsschlämme Sockel Flexible Dichtungsschlämme Sockel Sockelabdichtung mit flexibler, mineralischer Dichtungsschlämme liefern und fachgerecht einbauen.Zum Schutz des Sockels und erdberührten Bereichen gegen Spritzwasser, Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Abdichtung vom erdberührten Bereich bis min. 50 mm über OK Fertiggelände. Untergrund : Sockeloberputz Dichtschlämme passend zum System Angeb. Fabrikat: '.....'			
		18 m²	EP.....	GP
Summe Titel 002			WDVS Wand, Netto:	
003	Titel WDVS Decke			
	Hinweis Hinweis Die Ausführung der Positionen Untergrundvorbereitung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß und Freigabe durch die örtliche Bauleitung. Die Decke ist ca. 2,50 m über GOK. Alles Hilfsmittel wie Gerüste und dgl. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet VORARBEITEN LEITSYSTEM <u>Leitsystem:</u> Baumit oder gleichwertig <u>Untergrund:</u> Beton			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
003	Titel	WDVS Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. System: '.....' (vom Bieter auszufüllen)				
003.01	Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) entfernen. Anfallender Bauschutt und Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht nach behördlichen Vorgaben zu entsorgen.			
		1.550 m²	EP.....	GP
003.02	Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) entfernen sowie sonstige Unebenheiten und Teile auf der Fläche beseitigen.			
		1.550 m²	EP.....	GP
DÄMMARBEITEN				
003.03	WDVS Dämmschicht Mineralwolle, WLG 035 Anbringen einer Mineralwollgedämmplatte nach DIN EN 13162, Euroklasse A1 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), Anwendungstyp WAP nach DIN V 4108-10, einseitig beschichtet. Platten mit dem systemzugehörigen, mineralischen Klebspachtel auf die unbeschichtete Seite der Dämmplatte (vorab einmassieren) nach den Bestimmungen der gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufkleben. Zusätzliche Verdübelung in seperater Position. Dämmstoffdicke: 120mm WLG 035 angebot. Fabrikat: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
003	Titel	WDVS Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1.550 m²	EP.....	GP
003.04	Armierungsschicht Gewebespachtelung Armierungsschicht dünn-schichtig Aufbringen einer Armierungsschicht, bestehend aus einem systemzugehörigen mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel mit eingebettetem Armierungsgewebe, Ausführung nach Herstellervorschrift, Schichtdicke ca. 3 - 5 mm. angebot. Fabrikat Kleber: '.....' angebot. Fabrikat Gewebe: '.....'			
		1.550 m²	EP.....	GP
003.05	Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS Gewebe-Eckwinkel mit Kunststoffschiene (Kantenprofil) an allen Kanten / Leibungen / Ecken, lot- und fluchtrecht im Armiermörtel ansetzen.			
		525 m	EP.....	GP
003.06	Nachweis zur statisch relevanten Verdübelung des WDVS Nachweis zur statisch relevanten Verdübelung des WDVS an der StB-Decke nach DIN EN 1991-1-4 1055-4 Nachweis zur statisch relevanten Verdübelung des WDVS nach DIN EN 1991-1-4. Ermittlung der notwendigen Dübelmengen im Nachweisverfahren für das ausgeschriebene WDVS.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
003	Titel	WDVS Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
003.07	WDVS Verdübelung SchraubDübel WDVS Verdübelung SchraubDübel oberflächenbündige Montage Verdübelung der Fassadendämmplatten gem. gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit nach ETA zugelassenen SchraubDübeln mit dazugehörigem Verschlusselement als oberflächenbündige Montage. Verdübelung erfolgt durch das Gewebe. Dübel gem. Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Dübellastklasse: = 0,75 kN Untergrund: Betondecke Anzahl der Dübel (Stk./m²) nach der Dübel-/Systemlastklasse gem. dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS (DIN EN 1991-1-4) bzw stat. Nachweis Verdübelungsschema nach Herstellerrichtlinien. Dübelanzahl: '.....' Stk./m² Dübellänge: '.....' mm Tellerdurchmesser: min 60 mm Schaftdurchmesser: min 8 mm angebot. Fabrikat: '.....'			
		1.550 m²	EP.....	GP
003.08	Zulage für Unterzüge unter Decke Zulage Unterzüge unter Decke für WDVS und Gewebespachtelung Maße b/h 40/40 bis 60/40 cm			
		250 lfdm	EP.....	GP
	OBERPUTZ			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
003	Titel	WDVS Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
A0002	Oberputz, Silikat, AW, 3mm			
Ausführungsbeschr.	Auftragen und strukturieren eines Oberputzes aus einem hoch wasserdampfdurchlässigen (diffusionsoffenen), voll deckenden pastösen Oberputz.			
	Oberputz:	Silikatputz, pastös		
	Körnung:	3 mm		
	Struktur:	Kratzstruktur		
	Sonderausstattung:	algizid-/fungizid ausgerüstet		
	Farbton:	rot, wie Bestand		
	Hersteller/Fabrikat:	Baumit / Silikatputz oder gleichwertig passend zum System		
	Angebot. Fabrikat: '.....'			
003.09	Oberputz, Silikat, AW, Decke wie beschrieben			
	Bauteil:	Decke		
		1.550 m²	EP.....	GP
003.10	Anputzleiste an unbekleidete Stahlbetonstützen und Anputzleiste an unbekleidete Stahlbetonstützen und Stahlbetonwände mittels Anputzleiste.			
	Anputzleiste liefern und nach Herstellervorgaben einbauen			
		115 lfdm	EP.....	GP
003.11	Zulage für Unterzüge unter Decke Zulage Unterzüge unter Decke für Oberputz			
	Maße b/h 40/40 bis 60/40 cm			
		250 lfdm	EP.....	GP
003.12	Zulage für Arbeiten im beengten Bereich Zulage für Arbeiten im beengten Bereich Lichte Höhe 1,20-1,70 m			
		50 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
003	Titel	WDVS Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
003.13	Putzanschlüsse an Durchdringungen Erstellen einer Anschlussabdichtung/eines Putzanschlusses an Durchdringungen mit vorkomprimiertem Fugendichtband zur Ausbildung einer dauerelastischen, schlagregendichten und witterungsbeständigen Bewegungsfuge, gem. Herstellervor- schrift. Richtfabrikat: Baunit oder gleichwertig angebot. Fabrikat: '.....'			
				
		6 m	EP.....	GP
Summe Titel 003			WDVS Decke, Netto:	
005	Titel Anstrich Aussenputz			
005.01	Egalisationsanstrich, Silikat, Wände/Decke Einmaliger Egalisationsanstrich auf vorgenannter Putzbeschichtung im gleichen Farbton mit geeigneter Fassadenfarbe, hoch wasserdampf- und CO ² -durchlässig, wetterbeständig. Ausführung gemäß Herstellervorschrift. Bauteil: Außenwände, verputzt Untergrund: glatte, mineralische Flächen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
005	Titel	Anstrich Aussenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Farbton: farbneutral-gebrochener Mittelweißton bzw nach Wahl AG			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		1.675 m²	EP.....	GP
005.02	Zulage Egalisationsanstrich (2.Anstrich) Egalisationsanstrich gemäß Verarbeitungsrichtlinie. Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m² pro Anstrich			
		1.675 m²	EP.....	GP
005.03	Egalisationsanstrich, Silikat, Sockel Einmaliger Egalisationsanstrich auf vorgenannter Putzbeschichtung im gleichen Farbton mit geeigneter Fassadenfarbe, hoch wasserdampf- und CO²-durchlässig, wetterbeständig. Ausführung gemäß Herstellervorschrift.			
	Bauteil: Außenwände, verputzt Untergrund: glatte, mineralische Flächen			
	Farbton: grau-eleganter Schiefertone bzw nach Wahl AG			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		18 m²	EP.....	GP
Summe Titel 005		Anstrich Aussenputz, Netto:		

LV-Zusammenfassung

OAK OP - Neubau von OP-Sälen (1062-74-03)

350	LV	Putzarbeiten/WDVS		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
001	Titel	Baustelleneinrichtung	11	
002	Titel	WDVS Wand	12	
003	Titel	WDVS Decke	22	
005	Titel	Anstrich Aussenputz	27	
Summe LV 350 Putzarbeiten/WDVS				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
