


Bohrplatz Startseite 30m x 36m


- 1 - Bohranlage 4m x 14m
- 2 - Bohrgestänge 10m 350kg/Stck. Biegeradius min. 150m
- 3 - Recycler 20 Fuß Container (2,45 x 6,058m x 2,9m)
- 3a - Recyclingplatz befestigt und mit Radlader befahrbar (Größe ist abhängig vom Rohrvolumen)
- 4 - HD - Pumpe 20 Fuß Container
- 5 - Mischanlage 20 Fuß Container
- 6 - Puffertank 20 Fuß Container
- 7 - Bentonitlager (Größe ist abhängig vom Rohrvolumen)
- 8 - Notstromgenerator 200 KVA
- 9 - Werkstatt 20 Fuß Container
- 9a - Materiallager (Räumer, Dieselfass usw.)
- 10 - Personalcontainer 20 Fuß Container
- 11 - Startgrube 10m x 10m x 2m (Das Fassungsvermögen ist abhängig vom Rohrdurchmesser und der Bohrlänge)
- 12 - Abstell- und Rangierfläche LKW, Tieflader usw. so wie zur Ver- und Entsorgung. Mit Ausnahme der Bohranlage werden alle übrigen Bauteile mit einem 80t Kran verladen. (Fahrzeuggewicht 48t ges./12t pro Achse)

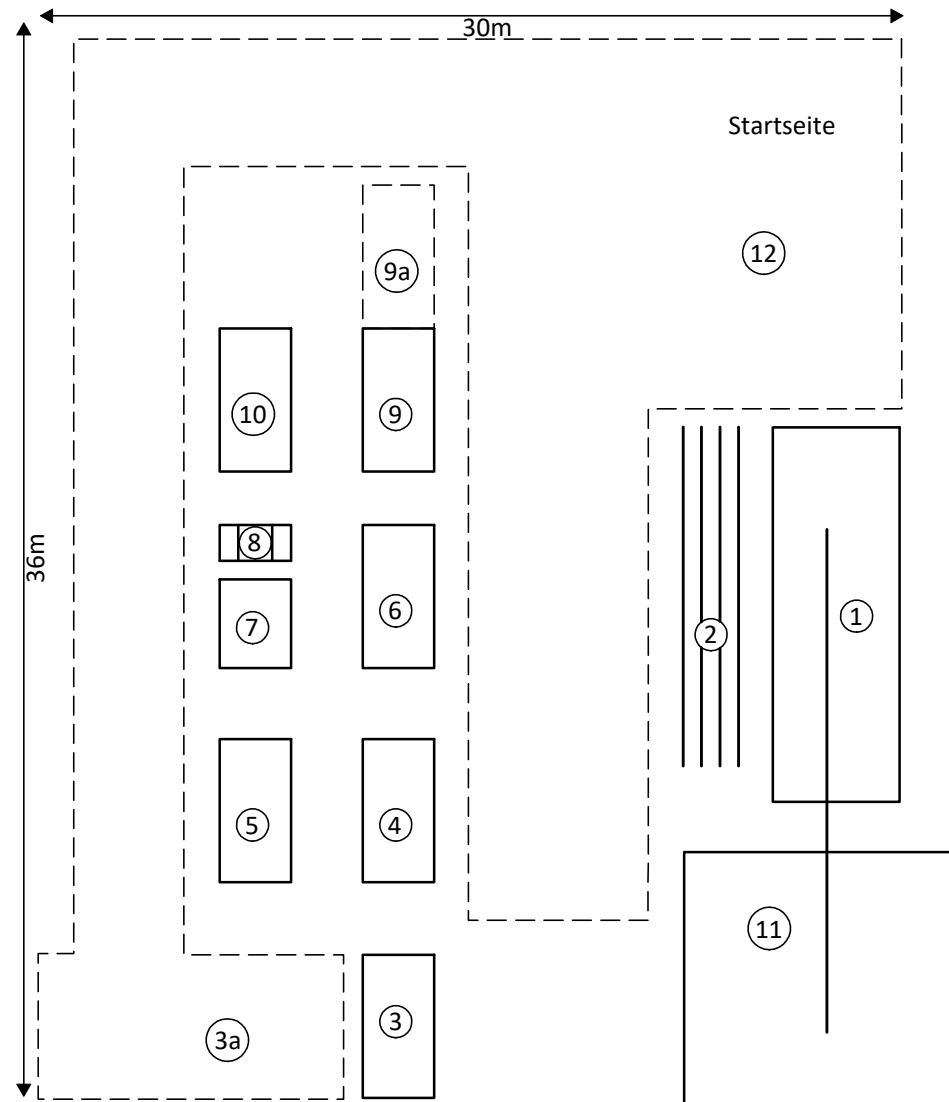

Erneuerung der TW-VL Gosewinkel - Groß Medewege - Nordstadt - Ausführungsplanung -		 Schliemannstraße 9, 18211 Bargeshagen Telefon (038203) 411-0 Fax 411-20		Der Auftraggeber:/der Antragsteller:  WAG Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG Eckdrift 43-45 19061 Schwerin	
Maßstab:	Schema Baustelleneinrichtung Großbohranlage Startseite (Rigside)	Bearbeiter		Pollentzke	Los Anlage 5 Blatt 1
ohne		Gezeichnet	10.11.2025	Horn	
		Geändert			

Bohrplatz Zielseite 30m x 30m

- 1 - Zielgrube 10m x 10m x 2m (Das Fassungsvermögen ist abhängig vom Rohrdurchmesser und der Bohrlänge)
- 2 - Recycler 20 Fuß Container
- 2a - Recyclingplatz befestigt und mit Radlader befahrbar (Größe ist abhängig vom Rohrvolumen)
- 3 - Saugwagen (möglichst Rückspüleleitung einrichten)
- 4 - LKW mit Ladekran
- 5 - Tieflader
- 6 - Bohrgestänge 10m, 350kg/Stck. Biegeradius min. 150m
- 7 - Notstromgenerator 120 KVA
- 8 - Rohrlagerplatz

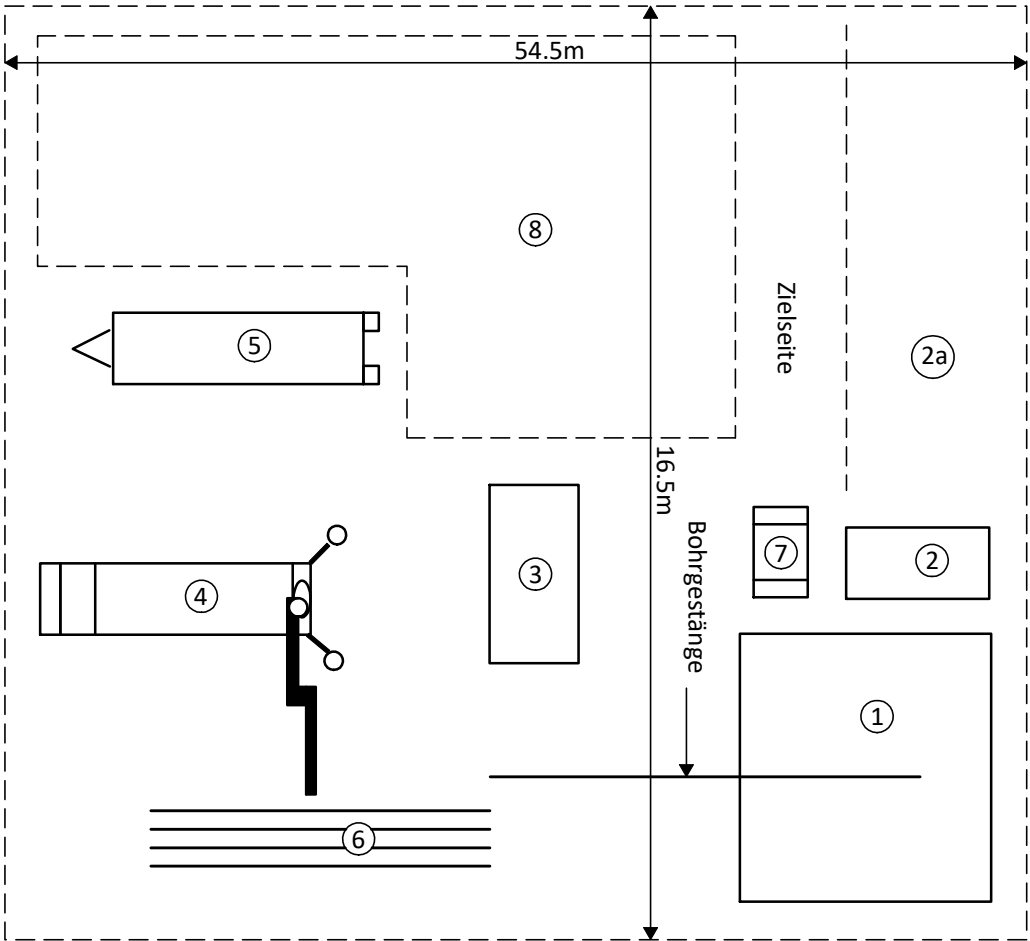

Erneuerung der TW-VL Gosewinkel - Groß Medewege - Nordstadt - Ausführungsplanung -		 aqua consult Ingenieur GmbH Schliemannstraße 9, 18211 Bargeshagen Telefon (038203) 411-0 Fax 411-20		Der Auftraggeber:/der Antragsteller:  WAG Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG Eckdrift 43-45 19061 Schwerin	
Maßstab:	Schema Baustelleneinrichtung Großbohranlage Zielseite (Pipeside)	Bearbeiter		Pollentzke	Los
ohne		Gezeichnet	10.11.2025	Horn	Anlage 5
		Geändert			Blatt 2
