Dekarbonisierung Kläranlage Bad Kissingen: BAUZEITENPLAN Rechengebäude & Hebeanlage

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
13.2	**Ausführung Rechengebäude & Hebeanlage lt:**	277at	Mo, 10.11.25	Di, 15.12.26
13.2.1	KickOff Mobile Anlagen	1at	Mo, 10.11.25	Mo, 10.11.25
13.2.2	Werksplanung Mobile Anlagen	14at	Di, 11.11.25	Fr, 28.11.25
13.2.3	Lieferzeit Mobile Anlagen	46at	Mo, 01.12.25	Fr, 06.02.26
13.2.4	KickOff Gerüstplattform	1at	Di, 10.02.26	Di, 10.02.26
13.2.5	Werksplanung + Lieferzeit Gerüstplattform	10at	Mi, 11.02.26	Di, 24.02.26
13.2.6	KickOff Abbruch	1at	Di, 10.02.26	Di, 10.02.26
13.2.7	Abbruchkonzept & Freigabe Abbruch	15at	Mi, 11.02.26	Di, 03.03.26
13.2.8	KickOff Hallenbau	1at	Di, 10.03.26	Di, 10.03.26
13.2.9	Werksplanung & Planfreigabe Hallenbau	25at	Mi, 11.03.26	Do, 16.04.26
13.2.10	Prüffähige Statik Hallenbau	20at	Fr, 17.04.26	Mo, 18.05.26
13.2.11	PRÜFSTATIK Hallenbau	20at	Di, 19.05.26	Mi, 17.06.26
13.2.12	Lieferzeit Hallenbau	35at	Mo, 29.06.26	Fr, 14.08.26
13.2.13	**KickOff Bauarbeiten**	1at	Di, 24.03.26	Di, 24.03.26
13.2.14	Werksplanung Bauarbeiten	25at	Mi, 25.03.26	Do, 30.04.26
13.2.15	KickOff Betonsanierung	1at	Di, 14.07.26	Di, 14.07.26
13.2.16	Werksplanung Betonsanierung	25at	Mi, 15.07.26	Di, 18.08.26
13.2.17	**KickOff** Sanierung Schneckenpumpen (inkl. Tröge)	1at	Di, 05.05.26	Di, 05.05.26
13.2.18	**Werksplanung & Lieferzeit Sanierung Schneckenpumpen**	140at	Mi, 06.05.26	Fr, 20.11.26
13.2.19	KickOff Maschinen- und Anlagentechnik	1at	Di, 09.06.26	Di, 09.06.26
13.2.20	Werksplanung Aggregate Gebläseraum	20at	Mi, 10.06.26	Di, 07.07.26
13.2.21	Lieferzeit Aggregate Gebläseraum	70at	Mi, 08.07.26	Di, 13.10.26
13.2.22	Werksplanung restl. Maschinen- und Anlagentechnik	40at	Mi, 10.06.26	Di, 04.08.26
13.2.23	Lieferzeit restl. Maschinen- und Anlagentechnik	95at	Mi, 05.08.26	Di, 15.12.26
13.2.24	Werksplanung + Lieferzeit ET	43at	Mi, 05.08.26	Fr, 02.10.26

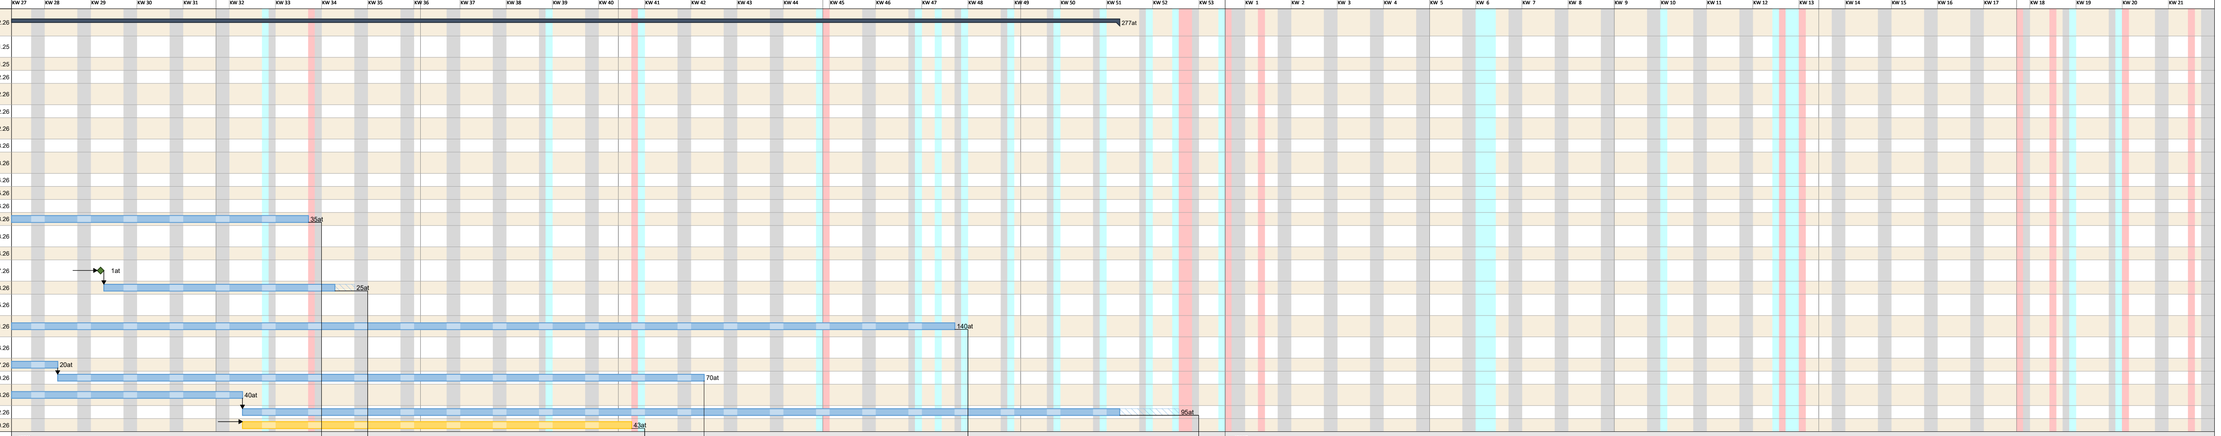

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
16				
17	**Bau / Montage Rechengebäude**	341at	Mo, 02.03.26	Fr, 09.07.27
17.1	Montage Gerüstplattform	5at	Mo, 02.03.26	Fr, 06.03.26
17.2	Errichtung Mobile Anlage inkl.Probebetrieb	10at	Mo, 16.03.26	Fr, 27.03.26
17.3	Abklemmen/ Freischalten durch ET	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
17.4	Aufstellung Fassadengerüst	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26
17.5	Demontage / Abbruch Rechenhalle	41at	Mo, 13.04.26	Fr, 12.06.26
17.6	Demontage Schneckenpumpen	5at	Do, 07.05.26	Mi, 13.05.26
17.7	BAU: Öffnung Falttor Maschinenraum	5at	Mo, 18.05.26	Fr, 22.05.26
17.8	BAU: Bodenplatte, E-Raum + Lagerraum + Stütze	45at	Mo, 15.06.26	Fr, 14.08.26
17.9	BAU: Perimeterdämmung (in Abstimmung mit Hallenbau und Tiefbau BA2)	10at	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26
17.10	BAU: Gerinnedecke Maschinenraum	16at	Mo, 30.11.26	Mo, 21.12.26
17.11	BAU: Fliesen, Verputzarbeiten	20at	Mo, 01.02.27	Fr, 26.02.27
17.12	Hallenbau: Kontrolle Aufmaß, evt. Anpassung Pläne	10at	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26
17.13	Hallenbau	64at	Mo, 17.08.26	Do, 12.11.26
17.14	Betonsanierung Rechenhalle Aussenwände	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26
17.15	Betonsanierung Hebeanlage	25at	Mo, 07.09.26	Fr, 09.10.26
17.16	Betonsanierung Gebläseraum	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
17.17	Betonsanierung Maschinenraum	20at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
17.18	Betonsanierung Rechenhalle innen	52at	Mo, 30.11.26	Fr, 12.02.27
17.19	**Sanierung Schneckentröge**	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26
17.20	Demontage & Montage MT Gebläseraum TEIL1	20at	Mi, 14.10.26	Di, 10.11.26
17.21	Demontage & Montage MT Gebläseraum TEIL2	13at	Mi, 02.12.26	Fr, 18.12.26
17.22	Montage MT Rechenhalle	78at	Mo, 28.12.26	Di, 20.04.27
17.23	**Montage Schneckenpumpen**	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
17.24	**Kalt-Inbetriebnahme Schneckenpumpen**	1at	Mo, 07.12.26	Mo, 07.12.26
17.25	Schlosserarbeiten (MT)	55at	Mi, 21.04.27	Fr, 09.07.27
17.26	Schaltanlagenbau (im Werk) ET	23at	Mo, 05.10.26	Mi, 04.11.26
17.27	Montage NSV-Schaltanlage ET	35at	Do, 05.11.26	Mi, 23.12.26
17.28	ET Anbindung & IB Aggregate Gebläseraum TEIL1	15at	Mi, 11.11.26	Di, 01.12.26
17.29	ET Anbindung & IB Aggregate Gebläseraum TEIL2	10at	Do, 24.12.26	Mo, 11.01.27
17.30	ET Anbindung & IB Schneckenpumpen	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
17.31	Installation & IB restl. ET	83at	Di, 12.01.27	Di, 11.05.27
17.32	**Inbetriebnahme Hebe- und Rechenanlage**	4at	Mi, 12.05.27	Di, 18.05.27
17.33	Demontage Mobile Anlage	10at	Mi, 19.05.27	Mi, 02.06.27

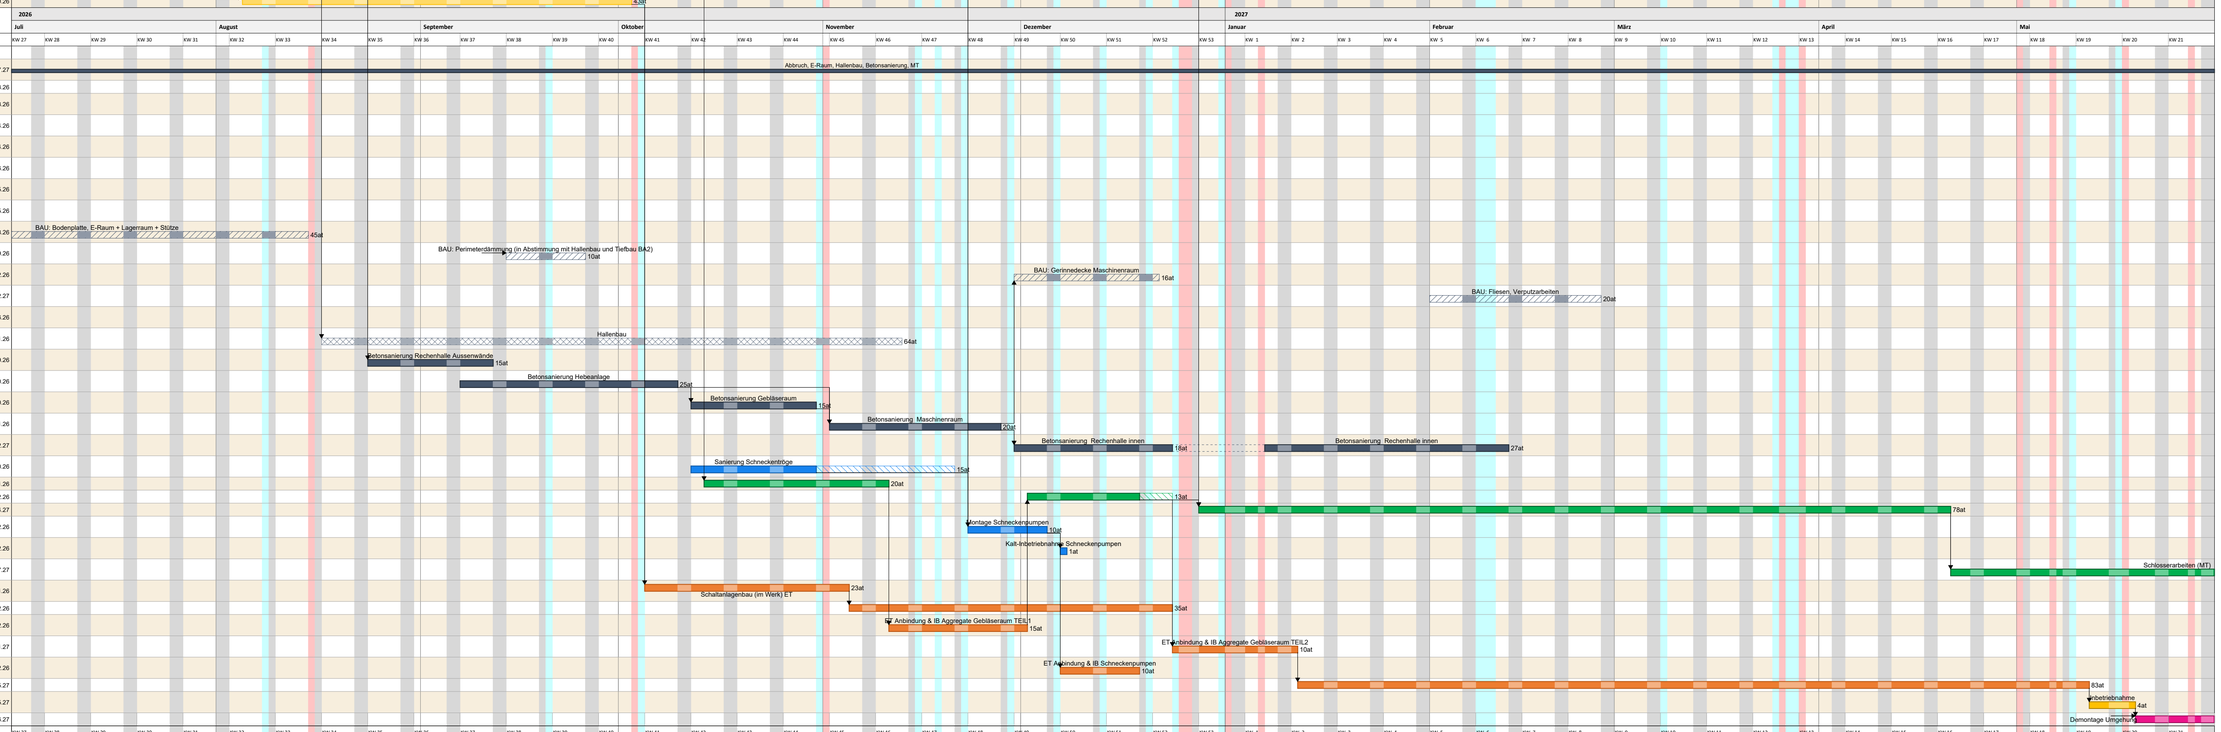

Projektzeitrahmen von Mo, 01.07.24 bis Mi, 31.05.28
Kalender: Bayern (angepasst)
Druckdatum: 12.05.2026 10:49
Bearbeiter: sh01

Dipl.-Ing. Dr. Stefan Haider
Utzmannsbach 39
91245 / Simmelsdorf
e-Mail: office@h2office.com
