STADTWERKE BAD SAULGAU

Saulgauer Wärme GmbH & Co. KG - Kommunale Wärmeversorgung

Gesamtprojektterminplan Modul 2 BEW

Stand: Fre 17.04.26

ENTWURF

Nr.	Vorg	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Verantwortlichkeiten	Vorgänger	Nachfolger	% Abgeschloss
1		1	**Sitzungstermine Gemeinderat**	195 Tage?	Don 12.03.26	Don 17.12.26				0%
2		1.1	TA	1 Tag?	Don 12.03.26	Don 12.03.26				0%
3		1.2	GR	1 Tag?	Don 26.03.26	Don 26.03.26			43EE	0%
4		1.3	GR	1 Tag?	Don 30.04.26	Don 30.04.26				0%
5		1.4	TA	1 Tag?	Don 07.05.26	Don 07.05.26			70AA	0%
6		1.5	GR	1 Tag?	Don 21.05.26	Don 21.05.26				0%
7		1.6	GR	1 Tag?	Don 02.07.26	Don 02.07.26			72AA	0%
8		1.7	TA	1 Tag?	Don 09.07.26	Don 09.07.26				0%
9		1.8	GR	1 Tag?	Don 30.07.26	Don 30.07.26			77AA	0%
10		1.9	GR	1 Tag?	Don 24.09.26	Don 24.09.26			98AA	0%
11		1.10	TA	1 Tag?	Don 01.10.26	Don 01.10.26				0%
12		1.11	GR	1 Tag?	Don 22.10.26	Don 22.10.26			79AA	0%
13		1.12	TA	1 Tag?	Don 05.11.26	Don 05.11.26				0%
14		1.13	GR	1 Tag?	Don 19.11.26	Don 19.11.26				0%
15		1.14	TA	1 Tag?	Don 10.12.26	Don 10.12.26				0%
16		1.15	GR	1 Tag?	Don 17.12.26	Don 17.12.26			85	0%
17		2	**SWBSW | Stadtwerke Bad Saulgau - Wärmeversorgung**	1774 Tage?	Mon 16.06.25	Die 08.06.32				12%
18		2.1	**Meilensteine BEW Fördermodul 2 / LPH 5-8**	1607 Tage?	Mon 16.06.25	Fre 17.10.31				9%
19		2.1.1	Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn	0 Tage	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25				100%
20		2.1.2	Eingang Zuwendungsbescheid	1 Tag?	Mit 17.12.25	Mit 17.12.25				100%
21		2.1.3	**Bewilligungszeiträume Modul 2**	1008 Tage?	Mon 16.06.25	Fre 15.06.29				14%
22		2.1.3.1	**1. Förderjahr**	249 Tage?	Mon 16.06.25	Mon 15.06.26			24;23	75%
23		2.1.3.2	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Die 16.06.26	Mon 19.10.26		22		0%
24		2.1.3.3	**2. Förderjahr**	253 Tage	Die 16.06.26	Die 15.06.27		22	26;25	0%
25		2.1.3.4	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Mit 16.06.27	Die 19.10.27		24		0%
26		2.1.3.5	**3. Förderjahr = 1. Baujahr**	255 Tage	Mit 16.06.27	Don 15.06.28		24	28;27;63AA	0%
27		2.1.3.6	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Fre 16.06.28	Fre 20.10.28		26		0%
28		2.1.3.7	**4. Förderjahr = 2. Baujahr**	251 Tage	Fre 16.06.28	Fre 15.06.29		26	32;29;30EE;64AA	0%
29		2.1.3.8	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Sam 16.06.29	Fre 19.10.29		28		0%
30		2.1.3.9	Ende - Bewilligungszeitraum Modul 2	0 Tage	Fre 15.06.29	Fre 15.06.29		28EE		0%
31		2.1.4	**Verlängerung**	598 Tage	Mon 18.06.29	Fre 17.10.31				0%
32		2.1.4.1	**5. Förderjahr = 3. Baujahr**	251 Tage	Mon 18.06.29	Sam 15.06.30		28	34;65AA;33	0%
33		2.1.4.2	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Son 16.06.30	Mon 21.10.30		32		0%
34		2.1.4.3	**6. Förderjahr = 4. Baujahr**	256 Tage	Mon 17.06.30	Son 15.06.31		32	66AA;35	0%
35		2.1.4.4	Aktivierung Verwendungsnachweis, Vorlage Anlagen	90 Tage	Mon 16.06.31	Fre 17.10.31		34		0%
36		2.2	**Genehmigung Heizkraftwerk**	1770 Tage?	Mon 23.06.25	Die 08.06.32				14%
37		2.2.1	Tag der Bewilligung	1 Tag?	Mon 23.06.25	Mon 23.06.25	LRA			0%
38		2.2.2	Bewilligungszeitraum	758 Tage?	Mon 23.06.25	Don 22.06.28			39EE-10 Tage	0%
39		2.2.3	Spätester Baubeginn	1 Tag?	Fre 09.06.28	Fre 09.06.28		38EE-10 Tage	119	0%
40		2.2.4	**SWBS-kelag - GEMEINSAME NÄCHSTE SCHRITTE NACH WORKSHOP 26+27.02**	1 Tag?	Mon 23.02.26	Mon 23.02.26				28%
41		2.2.4.1	Abschluss Wirtschaftlichkeitsrechnung (siehe Notizen)	15 Tage?	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26	KEW		47;46	80%
42		2.2.4.2	**Vertriebsplanung**	1595 Tage?	Mon 02.03.26	Die 08.06.32	SWBS			28%
43		2.2.4.2.1	Partnerauswahl	1 Tag?	Don 26.03.26	Don 26.03.26	Gemeinderat	3EE		100%
44		2.2.4.2.2	**Kundenclusterung (Schlüsselkunden)**	30 Tage	Mon 02.03.26	Die 14.04.26	SWBS			0%
45		2.2.4.2.3	**Auswirkungen auf Bauabschnittsplanung berücksichtigen (siehe Notizen)**	42 Tage	Mon 02.03.26	Don 30.04.26	SWBS			0%
46		2.2.4.2.4	Preisschiene, Terminschiene	30 Tage	Mon 23.03.26	Mit 06.05.26	SWBS	41		0%
47		2.2.4.2.5	Preisfestsetzung (Preisblätter)	20 Tage	Mon 23.03.26	Die 21.04.26	SWBS	41	49;48	0%
48		2.2.4.2.6	Vorbereitung Vertrieb (siehe Notizen)	55 Tage	Mit 22.04.26	Mon 13.07.26	SWBS	47	49	0%
49		2.2.4.2.7	**Vertriebsstart (siehe Notizen)**	1500 Tage	Die 14.07.26	Die 01.06.32	SWBS	48;47	50AE;51AE	0%
50		2.2.4.2.8	**Schlüsselkunden vertraglich gesichert**	192 Tage?	Mon 30.03.26	Don 31.12.26	SWBS	49AE		100%
51		2.2.4.2.9	**Neukunden: 20 GWh (unterzeichnet) (siehe Notizen = 30 GWh mit Bestandskunden)**	445 Tage?	Mon 30.03.26	Fre 31.12.27	SWBS	49AE		100%
52		2.2.4.3	**Einstieg KEW in Gesellschaft**	147 Tage?	Mon 02.03.26	Mit 30.09.26	KEW			36%
53		2.2.4.3.1	Klärung Rahmenbedingungen	100 Tage	Mon 02.03.26	Mon 27.07.26	KEW			25%
54		2.2.4.3.2	**LOI Erstellung für die Absicht des Einstiegs und Umrisse des Projekts (siehe Notizen)**	30 Tage	Mon 02.03.26	Die 14.04.26	KEW			25%
55		2.2.4.3.3	Vorbereitung Gesellschaftsverträge	1 Tag?	Mon 02.03.26	Mon 02.03.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG,			100%
56		2.2.4.3.4	**Entscheidung**	22 Tage?	Die 01.09.26	Mit 30.09.26	KEW			100%
57		2.2.4.4	**Streckung Förderzeitraum (siehe Notizen)**	24 Tage?	Mon 02.03.26	Fre 03.04.26	SWBS			5%
58		2.2.4.4.1	Mittelverschiebung auf einen realistischen Projektzeitplan (+2 Jahre)	15 Tage?	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26	SWBS			7%
59		2.2.4.4.2	Finanzierungsplan & Projektentwicklungskosten	20 Tage?	Mon 02.03.26	Fre 27.03.26	SWBS		60	5%
60		2.2.4.4.3	Erstellung Antrag auf Verlängerung um 2 Jahre incl. Übertragung Mittel	4 Tage	Mon 30.03.26	Don 02.04.26	Rödl&Partner, IfaS	59	61	0%
61		2.2.4.4.4	**Abgabe Antrag Verlängerung incl. Übertrag Mittel**	0 Tage?	Fre 03.04.26	Fre 03.04.26	Rödl&Partner	60		100%
62		2.2.5	**Baujahre unter Berücksichtigung Verlängerung Förderzeitraum**	1015 Tage	Mit 16.06.27	Son 15.06.31				0%
63		2.2.5.1	Erstes Baujahr	255 Tage	Mit 16.06.27	Don 15.06.28		26AA		0%
64		2.2.5.2	Zweites Baujahr	251 Tage	Fre 16.06.28	Fre 15.06.29		28AA	120EE-20 Tage	0%
65		2.2.5.3	Drittes Baujahr	251 Tage	Mon 18.06.29	Sam 15.06.30		32AA		0%
66		2.2.5.4	Viertes Baujahr	256 Tage	Mon 17.06.30	Son 15.06.31		34AA	126EE-20 Tage	0%
67		2.2.6	**Wärmepumpe Sonnenhoftherme mit Min.-Netz**	733 Tage?	Mon 16.03.26	Mit 07.02.29	SWBS			0%
68		2.2.6.1	**Beauftragung Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe (LPH (3) 5-9)**	733 Tage?	Mon 16.03.26	Mit 07.02.29	SWBS			0%
69		2.2.6.1.1	Einholung Honorarvorschlag LPH 3 (Entwurf) Kaskade	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26				0%
70		2.2.6.1.2	Vergabe Planung Kaskade	1 Tag?	Don 07.05.26	Don 07.05.26	Gemeinderat	5AA	71	0%
71		2.2.6.1.3	Planung Variante Kaskade	30 Tage	Fre 08.05.26	Die 23.06.26	IB	70		0%
72		2.2.6.1.4	Entscheidung Kaskade / Einzelanlage - Baubeschluss	1 Tag?	Don 02.07.26	Don 02.07.26		7AA		0%
73		2.2.6.1.5	Vorbereitung Vergabe LPH 5-9	30 Tage	Mit 01.04.26	Mon 18.05.26	Rödl&Partner, SWBS		74	0%
74		2.2.6.1.6	Vorinformation	15 Tage	Die 19.05.26	Mit 10.06.26	Rödl&Partner, SWBS	73	75	0%
75		2.2.6.1.7	Aufforderung zur Interessensbestätigung = Einleitung Teilnahmewettbewerb	30 Tage	Don 11.06.26	Mit 22.07.26	Rödl&Partner, SWBS	74	76	0%
76		2.2.6.1.8	Mitwirkung Vergabe LPH 5-9	5 Tage	Don 23.07.26	Mit 29.07.26	Rödl&Partner, SWBS	75		0%
77		2.2.6.1.9	Vergabe Planungsauftrag	1 Tag?	Don 30.07.26	Don 30.07.26		9AA	78	0%
78		2.2.6.1.10	Ausführungsplanung	40 Tage	Fre 31.07.26	Don 24.09.26	IB	77	81AA+20 Tage	0%
79		2.2.6.1.11	Vorstelllung Planung, Baubeschluss	1 Tag?	Don 22.10.26	Don 22.10.26	Gemeinderat	12AA	80	0%
80		2.2.6.1.12	Übertrag Anlagenrechtsbescheid auf die Projektgesellschaft	1 Tag?	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26	SWBS	79		0%
81		2.2.6.1.13	Vorbereitung Vergabe Anlagenbau	10 Tage	Fre 28.08.26	Don 10.09.26	IB, Rödl&Partner, SWBS	78AA+20 Tage	82	0%
82		2.2.6.1.14	Vorinformation	15 Tage	Fre 11.09.26	Don 01.10.26	IB, Rödl&Partner, SWBS	81	83	0%
83		2.2.6.1.15	Aufforderung zur Interessensbestätigung = Einleitung Teilnahmewettbewerb	30 Tage	Fre 02.10.26	Don 12.11.26	IB, Rödl&Partner, SWBS	82	84	0%
84		2.2.6.1.16	**Mitwirkung Vergabe Anlagenbau**	10 Tage	Fre 13.11.26	Don 26.11.26	IB, Rödl&Partner, SWBS	83		0%
85		2.2.6.1.17	Vergabe	0 Tage	Don 17.12.26	Don 17.12.26	Gemeinderat	16	86;87	0%
86		2.2.6.1.18	Anlagenbau	540 Tage	Fre 18.12.26	Mit 07.02.29	Firma N.N.	85		0%
87		2.2.6.1.19	Wärmenetz (Zieglersche, ...???)	100 Tage	Fre 18.12.26	Fre 14.05.27	Firma N.N.	85		0%
88		3	**Wärmenetzsystem; Bauabschnitte 1+2 (Heizwerk + BA1/2 Wärmenetz); Bauabschnitte 3+4 (BA3/4 Wärmenetz)**	1280 Tage?	Mit 08.04.26	Mit 30.04.31				0%
89		3.1	**Bauabschnitte 1,2, 3 und 4: Ausschreibung und Vergabe der Planerleistungen LPH 5-8 bzw. 9**	129 Tage?	Mit 08.04.26	Fre 09.10.26				0%
90		3.1.1	Erstellung Vergabeunterlagen, Vorbereitung Vergabe	15 Tage	Mit 08.04.26	Die 28.04.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG		91EA+10 Tage	0%
91		3.1.2	Teinahmewettbewerb	30 Tage	Fre 15.05.26	Mon 29.06.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	90EA+10 Tage	92	0%
92		3.1.3	Abgabe Erstangebot	25 Tage	Die 30.06.26	Mon 03.08.26	Ingenieurbüro´s	91	93	0%
93		3.1.4	Prüfung Erstangebote	5 Tage	Die 04.08.26	Mon 10.08.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	92	94	0%
94		3.1.5	Verhandlungstermine	5 Tage	Die 11.08.26	Mon 17.08.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	93	95	0%
95		3.1.6	Überarbeitung Unterlagen	5 Tage	Die 18.08.26	Mon 24.08.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	94	96	0%
96		3.1.7	Einreichung Letztangebote	10 Tage	Die 25.08.26	Mon 07.09.26	Ingenieurbüro´s	95	97	0%
97		3.1.8	Auswertung Finale Angebote	5 Tage	Die 08.09.26	Mon 14.09.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	96		0%
98		3.1.9	Beschluss: a) Gesamtbeauftragung = Vergabe: Stufenweise Planung; b) 1. Stufe, Planung: BA 1+2+3+4, LPH 5	1 Tag	Don 24.09.26	Don 24.09.26	Saulgauer Wärme GmbH & CoKG (Gemeinderat Bad Saulgau/Kelag)	10AA	99	0%
99		3.1.10	Zuschlag-, Infofrist an Bieter	10 Tage	Fre 25.09.26	Don 08.10.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	98	100	0%
100		3.1.11	Vertragsschluss mit Planer	1 Tag?	Fre 09.10.26	Fre 09.10.26	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	99	102	0%
101		3.2	**Bauabschnitt 1+2+3+4 (BA 1+2+3+4 Wärmenetz, BA 1+2**	664 Tage?	Mon 12.10.26	Mit 30.05.29				0%
102		3.2.1	Ausführungsplanung LPH 5 BA 1+2+3+4 (Wärmenetz) und BA 1+2 Heizwerk	80 Tage	Mon 12.10.26	Mit 03.02.27	Ingenieurbüro´s	100	122	0%
103		3.2.2	Beschluss: a) Bau; b) 2. Stufe, Vorbereitung Vergabe: BA1+2+3+4, LPH 6	1 Tag	Don 18.02.27	Don 18.02.27	Saulgauer Wärme GmbH & CoKG (Gemeinderat		104	0%
104		3.2.3	Vorbereitung Vergabe Bauleistung LPH 6 BA 1+2+3+4	40 Tage	Fre 19.02.27	Mon 19.04.27	Ingenieurbüro´s	103	105	0%
105		3.2.4	Beschluss: a) Bau BA 1+2; b.) Ausschreibung, BA 1+2+3+4; c) 3. Stufe, Mitwirkung Vergabe: BA 1+2, LPH 7	1 Tag?	Die 20.04.27	Die 20.04.27	Saulgauer Wärme GmbH & CoKG (Gemeinderat Bad Saulgau/Kelag)	104	107	0%
106		3.2.5	**Vergabeverfahren Bau BA 1 + BA 2 + BA 3 + BA 4**	130 Tage?	Mit 21.04.27	Fre 22.10.27				0%
107		3.2.5.1	Erstellung Vergabeunterlagen, Vorbereitung Vergabe	20 Tage	Mit 21.04.27	Don 20.05.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG,	105	108	0%
108		3.2.5.2	Teinahmewettbewerb	30 Tage	Fre 21.05.27	Fre 02.07.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	107	109	0%
109		3.2.5.3	Abgabe Erstangebot	25 Tage	Mon 05.07.27	Fre 06.08.27	Baufirmen	108	110	0%
110		3.2.5.4	Prüfung Erstangebote	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	109	111	0%
111		3.2.5.5	Verhandlungstermine	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	110	112	0%
112		3.2.5.6	Überarbeitung Unterlagen	5 Tage	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	111	113	0%
113		3.2.5.7	Einreichung Letztangebote	10 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	Baufirmen	112	114	0%
114		3.2.5.8	Auswertung Finale Angebote	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	113		0%
115		3.2.5.9	Beschluss: Vergabe a) Bauleistung BA 1+2 (Heizwerk und Wärmenetz); b) Planung: 4. Stufe: BA 1+2, LPH 8+9	1 Tag	Don 07.10.27	Don 07.10.27	Saulgauer Wärme GmbH & CoKG (Gemeinderat Bad Saulgau/Kelag)		116	0%
116		3.2.5.10	Zuschlag-, Infofrist an Bieter Bauleistung	10 Tage	Fre 08.10.27	Don 21.10.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	115	117	0%
117		3.2.5.11	Vertragsschluss mit Baufirmen	1 Tag?	Fre 22.10.27	Fre 22.10.27	Rödl&Partner, Saulgauer Wärme GmbH & CoKG	116		0%
118		3.2.6	**Bauphase BA 1+2**	390 Tage	Don 11.11.27	Mit 30.05.29				0%
119		3.2.6.1	Spätester Beginn Bau Heizwerk mit Technischer Ausrüstung (= LPH 8 Objektüberwachung für Planer)	1 Tag	Mon 12.06.28	Mon 12.06.28		39		0%
120		3.2.6.2	**Bau Heizwerk + Wärmenetz (= LPH 8 Objektüberwachung für Planer)**	390 Tage	Don 11.11.27	Mit 30.05.29	Baufirmen, Ingenieurbüro´s	64EE-20 Tage		0%
121		3.3	**Bauabschnitt 3+4 (Wärmenetz)**	1071 Tage	Don 04.02.27	Mit 30.04.31				0%
122		3.3.1	Ausführungsplanung LPH 5 BA 3 +4	60 Tage	Don 04.02.27	Fre 30.04.27	Ingenieurbüro´s	102	123EA+220 Tage	0%
123		3.3.2	Beschluss: a) Bau; b.) Vergabe Bauleistung; c) Beauftragung Planer: 5. Stufe: BA 3+4, LPH 8+9	1 Tag	Mon 13.03.28	Mon 13.03.28	Saulgauer Wärme GmbH & CoKG (Gemeinderat	122EA+220 Tage	124	0%
124		3.3.3	Vertragsschluss mit Baufirmen	20 Tage	Die 14.03.28	Mon 10.04.28	Rödl&Partner, SWBS	123		0%
125		3.3.4	**Bauphase BA 3+4**	770 Tage	Die 11.04.28	Mit 30.04.31				0%
126		3.3.4.1	Bau Wärmenetz (= LPH 8 Objektüberwachung für Planer)	770 Tage	Die 11.04.28	Mit 30.04.31	Ausführende, IB	66EE-20 Tage		0%

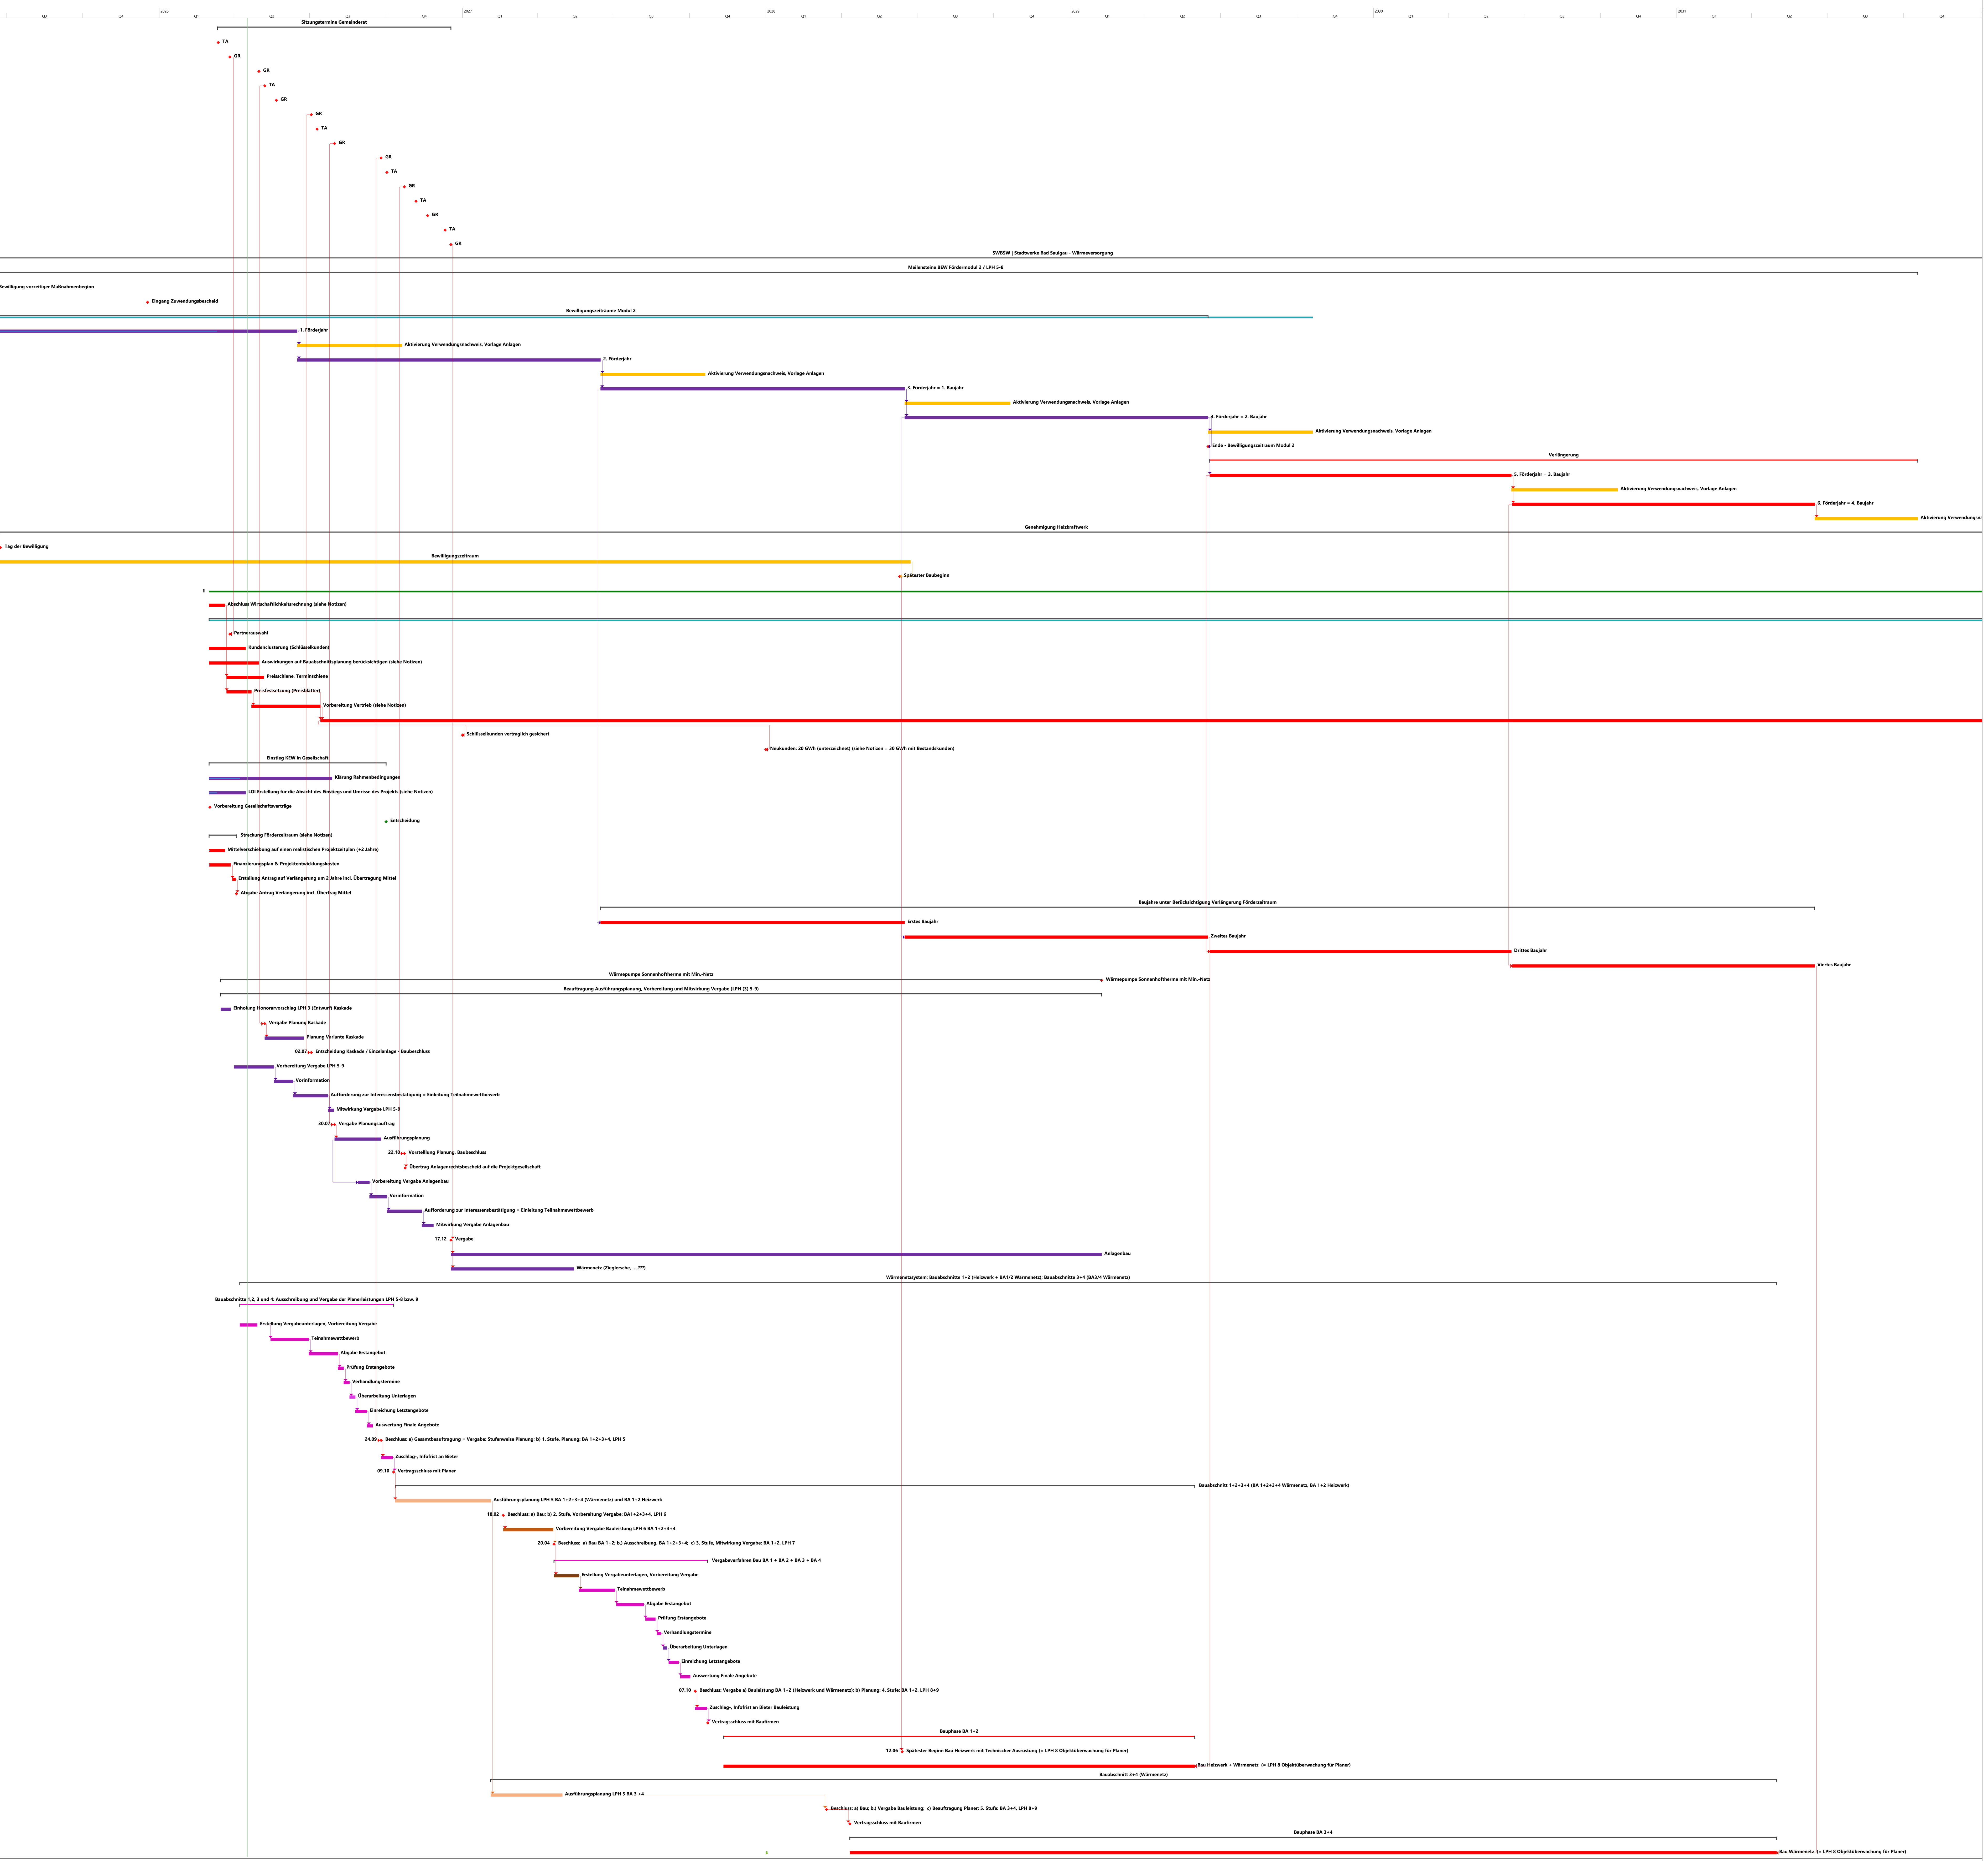

Projekt: Erweiterung des bestehenden Fernwärmenetzes
Datum: Fre 17.04.26
THOST PM: Hoj

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Geplant | Geplanter Meilenstein | Geplanter Sammelvorgang | In Arbeit
