Hockey- und Tennisclub Uhlenhorst Mülheim

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Bauherr**	**413t**	**Mon 03.03.25**	**Mon 07.12.26**
19	**Projektsteuerer**	**85t**	**Mon 01.06.26**	**Die 29.09.26**
24	**Bauaufsicht**	**202t**	**Mit 21.10.26**	**Die 31.08.27**
28	**Feuerwehr**	**10t**	**Die 17.08.27**	**Mon 30.08.27**
30	**Architekt Leistungsphase 5 / 6 ff.**	**246t**	**Mon 22.09.25**	**Die 29.09.26**
42	**Schadstoffgutachten (Dauer angenommen)**	**20t**	**Mit 04.03.26**	**Die 31.03.26**
44	**Tragwerksplanung**	**98t**	**Fre 07.11.25**	**Mon 13.04.26**
50	**Außenanlagen-Planer**	**111t**	**Die 02.12.25**	**Fre 29.05.26**
55	**TGA-Planer**	**166t**	**Mon 29.09.25**	**Die 16.06.26**
63	**Außenanlagen**	**368t**	**Mon 12.01.26**	**Die 20.07.27**
69	**Veröffentlichung**	**45t**	**Don 02.04.26**	**Don 11.06.26**
72	**Erdarbeiten**	**114t**	**Mit 17.06.26**	**Mit 25.11.26**
81	**Rohbau**	**111...**	**Mon 02.01.84**	**Don 03.12.26**
101	**Zimmerer**	**45t**	**Don 08.10.26**	**Fre 11.12.26**
102	Sanierung Holztragwerk	12t	Mon 16.11.26	Die 01.12.26
103	Portal Bauteil C einbauen	5t	Mit 02.12.26	Die 08.12.26
104	Koppelpfetten neu und ergänzen	5t	Don 22.10.26	Mit 28.10.26
105	neue Fachwerkwände Bauteil A1	10t	Don 08.10.26	Mit 21.10.26
106	Decke/ Wand Bauteil A2-C2	5t	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
107	VOB-Abnahme Zimmerer	1t	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
108	**Dachdecker**	**66t**	**Don 22.10.26**	**Mon 08.02.27**
117	**Fassadenbauer**	**42t**	**Mon 16.11.26**	**Die 26.01.27**
122	**Stahlbau**	**35t**	**Mon 07.12.26**	**Fre 05.02.27**
123	Vordach aufmessen	3t	Die 08.12.26	Don 10.12.26
124	Vordach montieren	10t	Fre 15.01.27	Don 28.01.27
125	Technik-Montagegestell montieren	3t	Die 15.12.26	Don 17.12.26
126	Treppe Seminar-01 aufmessen	1t	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26
127	Treppe Seminar-01 montieren	3t	Die 12.01.27	Don 14.01.27
128	VOB-Abnahme Stahlbau gesamt	1t	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27
129	**Fenster + Außentüren**	**65t**	**Mon 19.10.26**	**Die 02.02.27**
137	**Trockenbau**	**156t**	**Mon 16.11.26**	**Die 20.07.27**
138	Wände einseitig und UK Vorwände für Installateure (Bauteil B)	15t	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
139	Wände 2.Seite beplanken, fertigstellen (Bauteil B)	15t	Mon 22.03.27	Mon 19.04.27
140	GK Decken bauen (Bauteil B)	10t	Mon 22.03.27	Mon 12.04.27
141	Rasterdecke UK bauen (Bauteil B)	10t	Die 04.05.27	Don 20.05.27
142	Deckenplatten einlegen (Bauteil B)	2t	Fre 16.07.27	Mon 19.07.27
143	Deckenplatten einlegen (Bauteil C)	2t	Don 24.06.27	Fre 25.06.27
144	Trockenbau Rest (Bauteil B)	15t	Die 20.04.27	Mit 12.05.27
145	Brandschutzverkleidungen/ BS-Decken (Bauteil C)	15t	Die 04.05.27	Mon 31.05.27
146	Wände einseitig und UK Vorwände für Installateure (Bauteil A/ C)	10t	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
147	Innenputz / Beiputz (Bauteil C)	7t	Die 20.04.27	Mit 28.04.27
148	Trockenbau Bauteil A/ C 2. Seite schließen	10t	Die 20.04.27	Mon 03.05.27
149	Aussenwände Bauteil A innen beplanken	12t	Mon 16.11.26	Die 01.12.26
150	VOB-Abnahme Trockenbau gesamt	1t	Die 20.07.27	Die 20.07.27
151	**Heizung-/ Sanitär / Klima / Lüftung**	**216t**	**Mon 07.09.26**	**Don 05.08.27**
152	Deinstallation Technik Bauteil A/C	5t	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
153	Rohinstallation Technikraum	25t	Don 22.10.26	Fre 27.11.26
154	Installation Heiz-/ Lüftungsleitungen komplett mit Inbetriebnahme, Bauteil D	20t	Fre 22.01.27	Don 18.02.27
155	Rohinstallation Bauteil B	15t	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
156	Rohinstallation Bauteil A/ C	15t	Mon 22.03.27	Mon 19.04.27
157	Feininstallation mit Inbetriebnahme, Bauteile B - A/C	15t	Die 13.07.27	Mon 02.08.27
158	Fußbodenheizung mit Dämmung Bauteil B	5t	Die 20.04.27	Mon 26.04.27
159	Hygiene-Erstinspektion Trinkwasserinstallation	1t	Die 03.08.27	Die 03.08.27
160	Sachverständigenabnahme Lüftungsanlage Versammlungsstätte	1t	Mit 04.08.27	Mit 04.08.27
161	VOB-Abnahme Heizung/Sanitär gesamt	1t	Don 05.08.27	Don 05.08.27
162	**Elektroinstallation**	**234t**	**Mon 07.09.26**	**Die 31.08.27**
163	Deinstallation Technik Bauteil A/C	5t	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
164	Rohinstallation Technikraum	25t	Don 22.10.26	Fre 27.11.26
165	Installation komplett mit Inbetriebnahme, Bauteil D	20t	Fre 22.01.27	Don 18.02.27
166	Rohinstallation Bauteil B	15t	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
167	Rohinstallation Bauteil A/ C	15t	Mon 22.03.27	Mon 19.04.27
168	Feininstallation mit Inbetriebnahme, Bauteile B - A/C	15t	Die 13.07.27	Mon 02.08.27
169	Sachverständigenabnahme BMA mit Nacharbeiten	10t	Die 03.08.27	Mon 16.08.27
170	Sachverständigenabnahme SiBe und Sicherheitsstromversorgungsanlage mit Nacharbeiten	5t	Die 17.08.27	Mon 23.08.27
171	Sachverständigenabnahme elektrische Anlagen mit Nacharbeiten	5t	Die 24.08.27	Mon 30.08.27
172	VOB-Abnahme Elektro gesamt	1t	Die 31.08.27	Die 31.08.27
173	**Estrich**	**14t**	**Die 27.04.27**	**Mit 19.05.27**
177	**Innentüren**	**72t**	**Die 20.04.27**	**Mit 04.08.27**
184	**Schreiner**	**36t**	**Mit 19.05.27**	**Fre 09.07.27**
188	**Fliesen**	**31t**	**Don 13.05.27**	**Die 29.06.27**
193	**Oberboden**	**49t**	**Mit 19.05.27**	**Mit 28.07.27**
201	**Maler**	**56t**	**Die 20.04.27**	**Die 13.07.27**

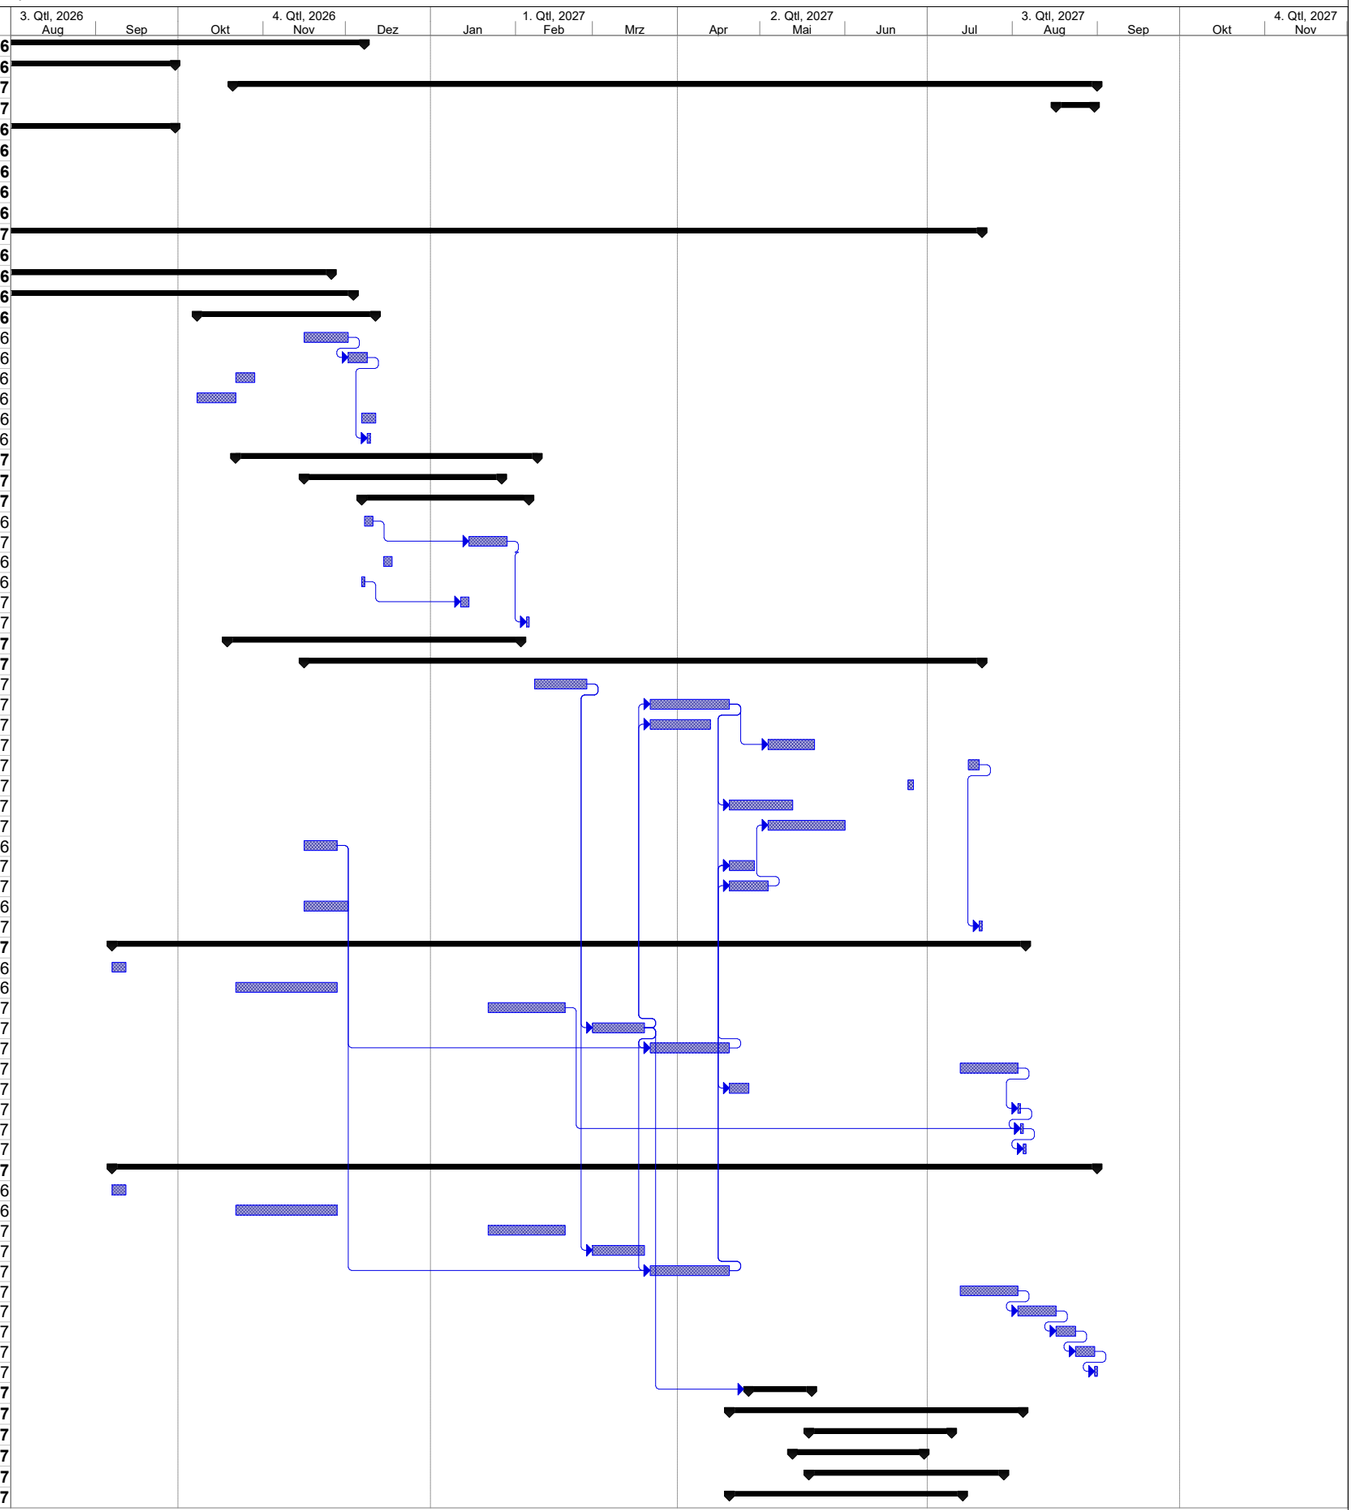

HTC Uhlenhorst MH -Sportstätten-Erweiterung
11:05.2026 Index-1f Bauzeitenplan

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Ende		Geplanter Meilenstein	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Geplanter Sammelvorgang	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Geplant		Stichtag	

Die Bauzeiten sind abhängig von der Witterung, Handwerker-, Fachplaner und Materialkapazitäten sowie Genehmigungszeiträumen und können deshalb variiieren.

Hockey- und Tennisclub Uhlenhorst Mülheim

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
207	**Ausstattung**	**38t**	**Fre 25.06.27**	**Die 17.08.27**
213	**Nutzung**	**33t**	**Don 15.07.27**	**Die 31.08.27**
214	Hockeyhalle nutzbar	0t	Die 31.08.27	Die 31.08.27
215	Atheltikbereich nutzbar	0t	Die 17.08.27	Die 17.08.27
216	Tennishalle	0t	Don 15.07.27	Don 15.07.27



HTC Uhlenhorst MH -Sportstätten-Erweiterung
11:05.2026 Index-1f Bauzeitenplan

Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Ende	Geplanter Meilenstein
Unterbrechung	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Geplanter Sammelvorgang
Meilenstein	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	In Arbeit
Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Geplant	Stichtag

Die Bauzeiten sind abhängig von der Witterung, Handwerker-, Fachplaner und Materialkapazitäten sowie Genehmigungszeiträumen und können deshalb variiieren.
