
Universitätsklinikum Tübingen
Anbau Kinderklinik
Ersatzgebäude Großgerätezentrum


Rahmenterminplan Vergaben und Ausführung

ERNST² ARCHITEKTEN AG
fürTiemann Petri Koch Planungsgesellschaft mbH
Freie Architekten BDA


Nr.	Vorgangsname	Bearbeiter	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**RTP TPK**		**798 Tage**	**08.09.2025**	**22.12.2028**		
2	Index 10		0 Tage	27.08.2026	27.08.2026		
3	Index 11 Ebenenplanung von oben nach unten, nach Abstimm, BPfT, SRM, SSB, (INM fehlt)		0 Tage	09.09.2026	09.09.2026		
4	**LPH 3 Entwurfsplanung**	**alle Planer**	**243 Tage**	**08.09.2025**	**28.08.2026**		
54	**Kosten Einrichtung**	**TPK, U2**	**20 Tage**	**31.08.2026**	**25.09.2026**		
55	**Kosten Lose Einrichtung**	**TPK**	**20 Tage**	**31.08.2026**	**25.09.2026**		
56	**Kosten medizinische Einrichtung**	**U2**	**20 Tage**	**31.08.2026**	**25.09.2026**		
57	**LPH 4 Genehmigungsplanung**	**TPK, INM**	**40 Tage**	**06.07.2026**	**28.08.2026**		
64	Genehmigung Bauantrag (Annahme)		130 Tage	31.08.2026	19.03.2027	61	70
65	**LPH 5 AFU**	**alle Planer**	**278 Tage**	**01.09.2026**	**19.11.2027**		
180	AFU Einrichtung	TPK	20 Tage	22.11.2027	17.12.2027	179	
181	**LPH 6 Ausschreibung**		**510 Tage**	**09.11.2026**	**22.12.2028**		
182	**Vorgänge TPK RTP**		**510 Tage**	**09.11.2026**	**22.12.2028**		
183	**Auschreibungen Hochbau/ KG300**	**E2**	**510 Tage**	**09.11.2026**	**22.12.2028**		
184	Ausschreibung Vorbereitende Maßnahmen Baufeld	E2	20 Tage	09.11.2026	04.12.2026	72	220
185	Ausschreibung Rohbau, Verbau, Baugrube, Abbruch, Drainage, Wasserhaltung, Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen	E2	50 Tage	11.01.2027	19.03.2027	122	187;221;188
186	weitere		170 Tage	22.03.2027	17.12.2027		
208	**Ausschreibungen TGA/ KG400, Außenanlagen/ KG500**		**480 Tage**	**21.12.2026**	**22.12.2028**		
209	Ausschreibung KG410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	INM	100 Tage	22.02.2027	23.07.2027		
210	Ausschreibung KG420 Wärmeversorgungsanlagen	INM	100 Tage	22.02.2027	23.07.2027		
211	Ausschreibung KG430 Raumlufttechnische Anlagen	INM	100 Tage	22.02.2027	23.07.2027		
212	Ausschreibung KG470 med. Gase	INM	100 Tage	22.02.2027	23.07.2027		
213	Ausschreibung KG480 Gebäude-u. Anlagenautomation	INM	100 Tage	22.02.2027	23.07.2027		
214	Ausschreibung KG460 Förderanlagen	SRM	50 Tage	21.12.2026	12.03.2027		215
215	Ausschreibung KG440 Starkstromanlagen	SRM	60 Tage	15.03.2027	18.06.2027	214	216
216	Ausschreibung KG450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	SRM	80 Tage	21.06.2027	29.10.2027	215	
217	Ausschreibung KG473 HF-Kabine	U2	30 Tage	01.11.2027	10.12.2027		
218	Ausschreibung KG500 Außenanlagen	AO	50 Tage	16.10.2028	22.12.2028		
219	**LPH 7 Vergabe**		**140 Tage**	**07.12.2026**	**16.07.2027**		
220	Vergabe Vorbereitende Maßnahmen Baufeld		40 Tage	07.12.2026	12.02.2027	184	
221	Vergabe Rohbau inkl. Verbau und Baugrube		75 Tage	22.03.2027	16.07.2027	185	856
222	**LPH 6/7 E2**		**1409 Tage?**	**20.09.2024**	**10.06.2030**		

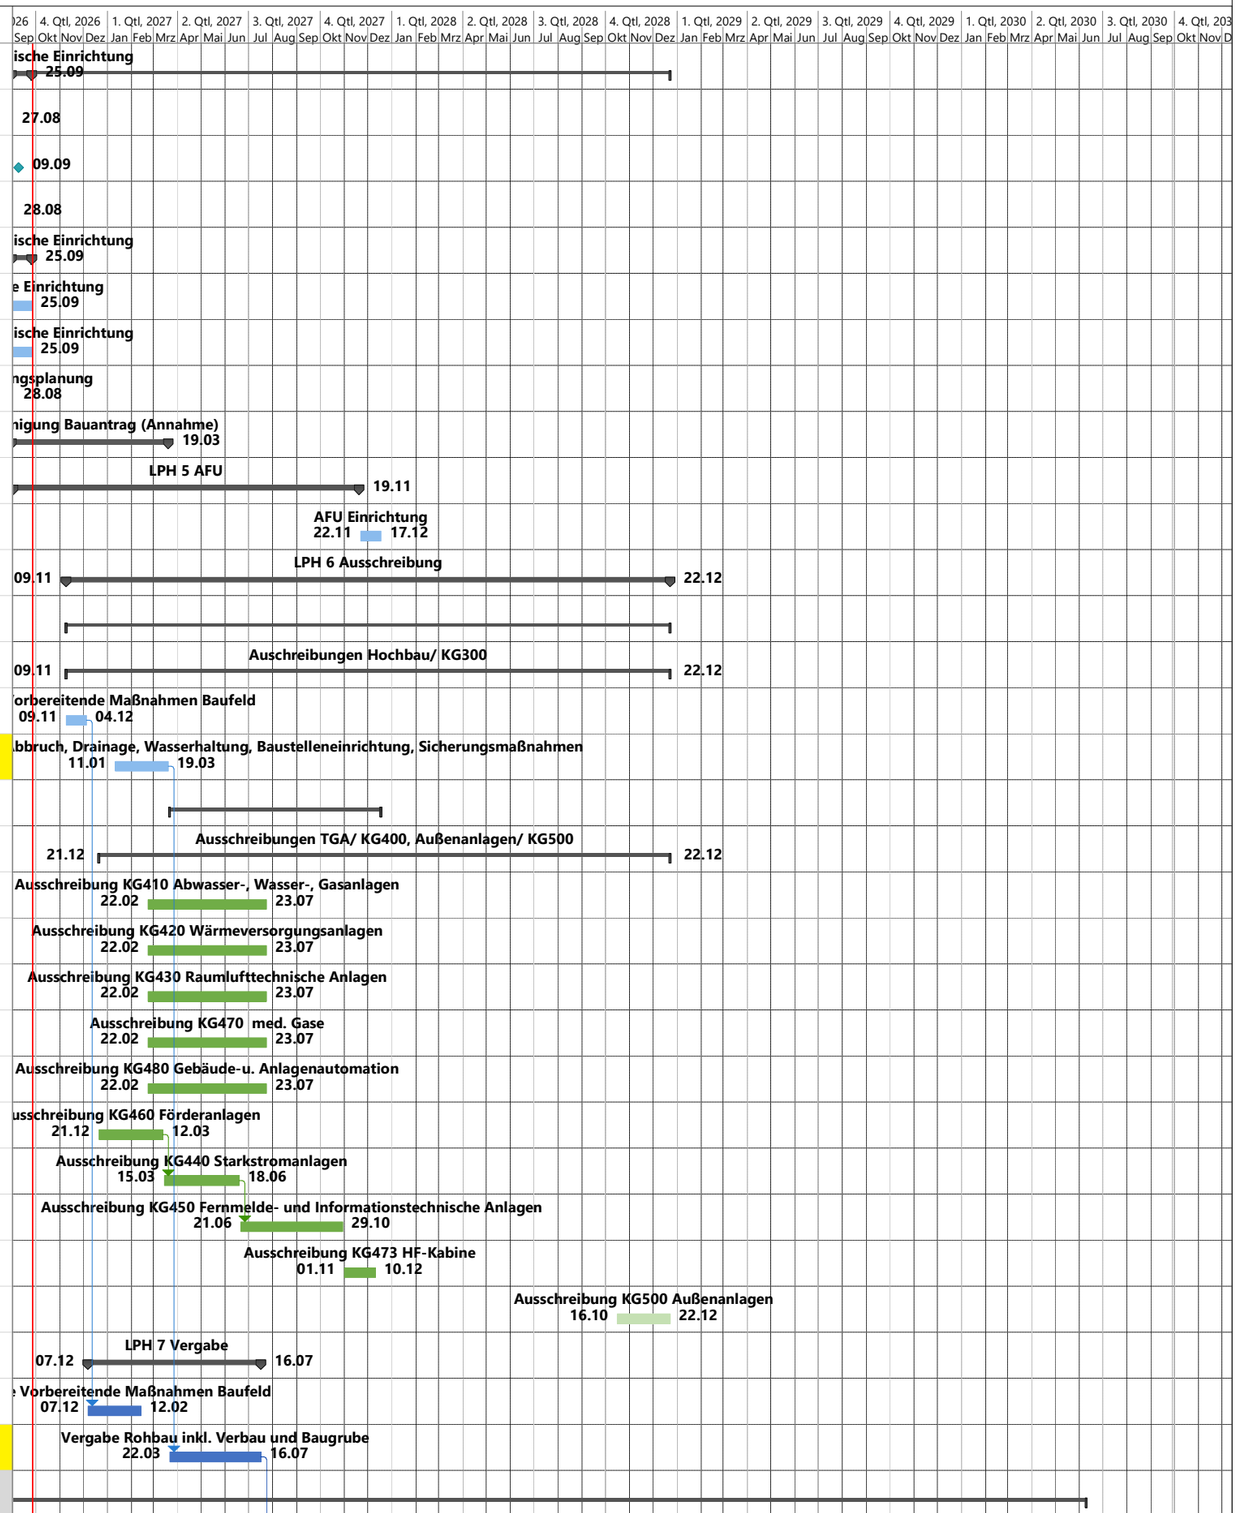

Nr.	Vorgangsname	Bearbeiter	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
223	**Hochbau**		**1409 Tage**	**20.09.2024**	**10.06.2030**		
224	**Ausschreibung Vorbereitende Maßnahmen Baufeld**		**111 Tage**	**02.10.2026**	**05.04.2027**		
225	Bereitstellung Planung		0 Tage	02.10.2026	02.10.2026	226AE	
226	LV Erstellung		30 Tage	02.10.2026	20.11.2026	227AE	225AE
227	Bereitstellung Unterlagen final		0 Tage	20.11.2026	20.11.2026	228AE	226AE
228	Vorlauf Veröffentlichung		15 Tage	20.11.2026	11.12.2026	229AE	227AE
229	Angebotsfrist		35 fTage	11.12.2026	15.01.2027	230AE	228AE
230	Submission		0 Tage	15.01.2027	15.01.2027	231AE	229AE;236
231	Prüfung		2 Tage	15.01.2027	19.01.2027	232AE	230AE
232	Prüfung fbT		15 Tage	19.01.2027	09.02.2027	233AE	231AE
233	Vergabevorschlag		0 Tage	09.02.2027	09.02.2027	234AE	232AE
234	Entscheidung und Information Bieter		2 Tage	09.02.2027	11.02.2027	235AE	233AE
235	Widerspruchsfrist		10 Tage	11.02.2027	25.02.2027	237AE	234AE
236	Bindefrist		60 fTage	15.01.2027	16.03.2027	230	
237	Beauftragung		2 Tage	25.02.2027	01.03.2027	238AE	235AE
238	Puffer / Vorlauf		20 Tage	01.03.2027	05.04.2027	849AE	237AE
239	**Ausschreibung Rohbau, Verbau, Baugrube, Abbruch, Drainage, Wasserhaltung, Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen, Stahlbau,**		**146 Tage**	**27.11.2026**	**19.07.2027**		
240	Bereitstellung Planung		0 Tage	27.11.2026	27.11.2026	241AE	
241	LV Erstellung		60 Tage	27.11.2026	05.03.2027	242AE	240AE
242	Bereitstellung Unterlagen final		0 Tage	05.03.2027	05.03.2027	243AE	241AE
243	Vorlauf Veröffentlichung		15 Tage	05.03.2027	26.03.2027	244AE	242AE
244	Angebotsfrist		35 fTage	26.03.2027	30.04.2027	245AE	243AE
245	Submission		0 Tage	30.04.2027	30.04.2027	246AE	244AE;251
246	Prüfung		2 Tage	30.04.2027	04.05.2027	247AE	245AE
247	Prüfung fbT		15 Tage	04.05.2027	01.06.2027	248AE	246AE
248	Vergabevorschlag		0 Tage	01.06.2027	01.06.2027	249AE	247AE
249	Entscheidung und Information Bieter		2 Tage	01.06.2027	03.06.2027	250AE	248AE
250	Widerspruchsfrist		10 Tage	03.06.2027	17.06.2027	252AE	249AE
251	Bindefrist		60 fTage	30.04.2027	29.06.2027	245	
252	Beauftragung		2 Tage	17.06.2027	21.06.2027	253AE	250AE
253	Puffer / Vorlauf		20 Tage	21.06.2027	19.07.2027	855AE	252AE

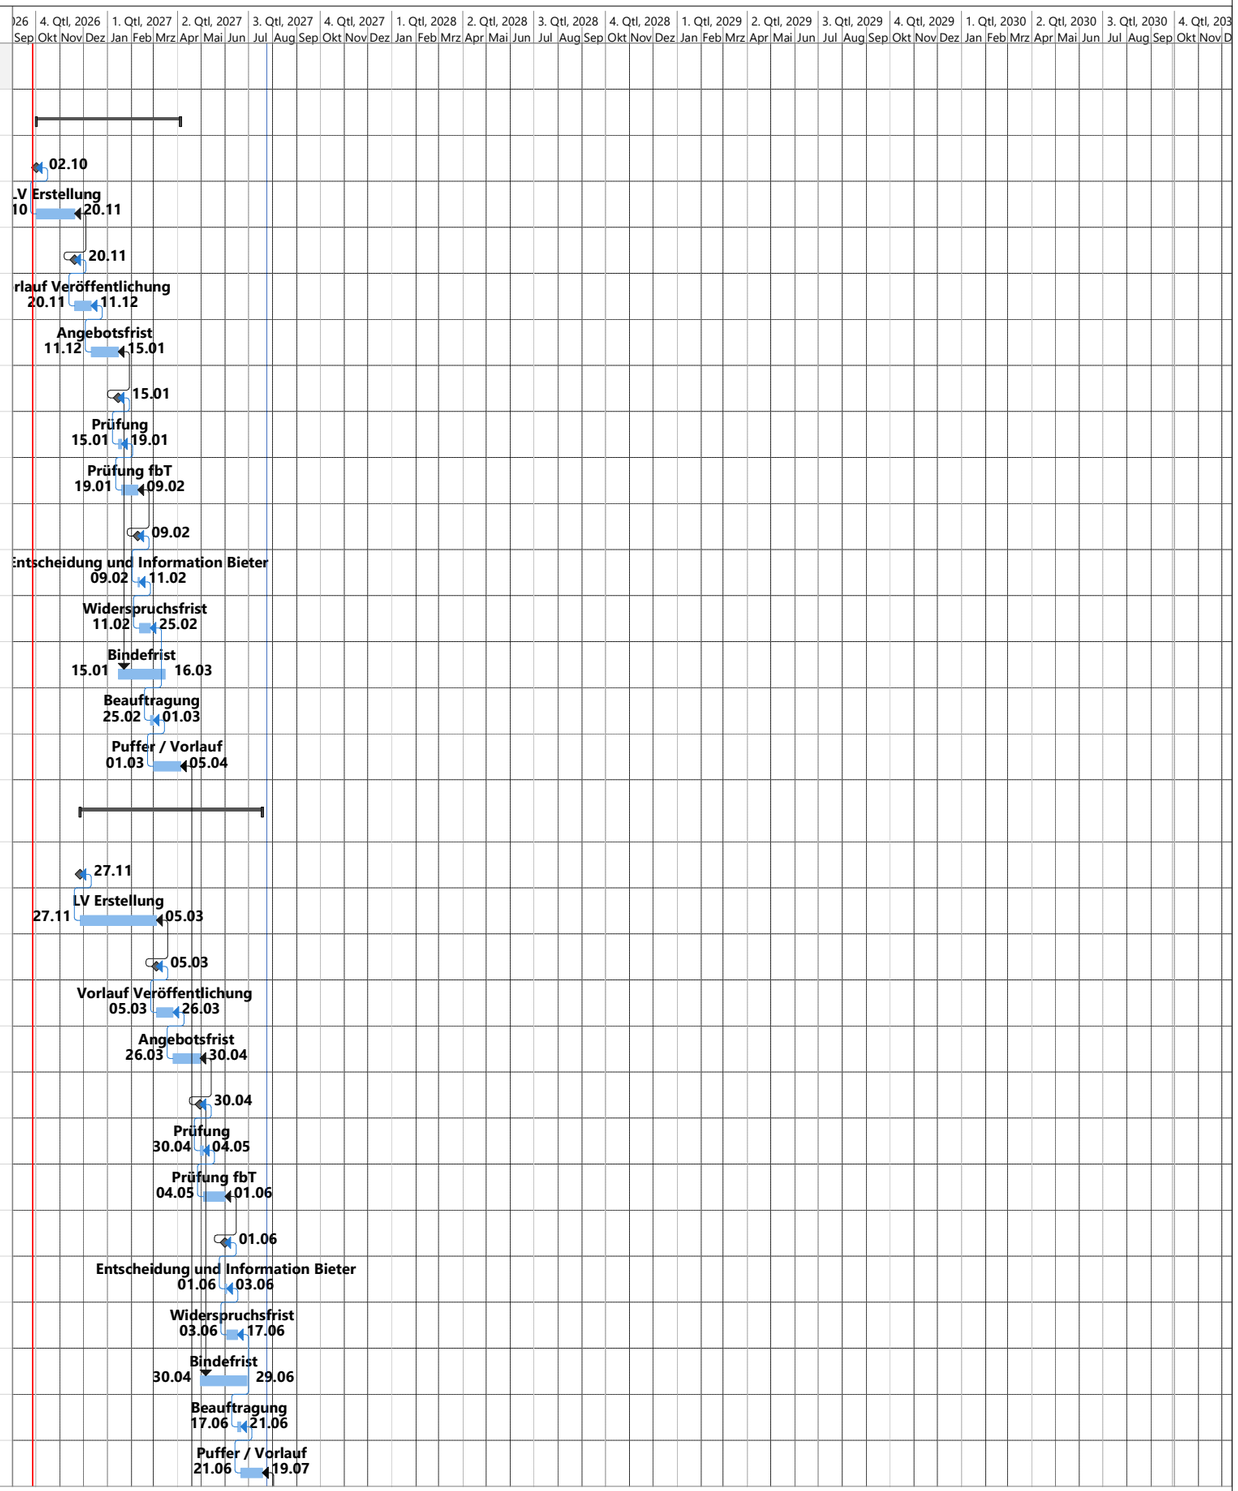

Nr.	Vorgangsname	Bearbeiter	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
254	**Ausschreibung KMF-Schadstoff-Sanierung**		**131 Tage**	**28.07.2028**	**12.02.2029**		
269	**Ausschreibung Fassade PR u Sonnenschutz und Insektengitter**		**382 Tage**	**29.04.2027**	**27.11.2028**		
287	**Ausschreibung Fassade PR u Sonnenschutz und Insektengitter**		**332 Tage**	**16.09.2027**	**22.01.2029**		
305	**Ausschreibung Gerüste**		**161 Tage**	**02.07.2027**	**20.03.2028**		
324	**Ausschreibung Dachabdichtung mit Zuarbeit Dachbegrünung**		**146 Tage**	**07.04.2028**	**30.10.2028**		
342	**Ausschreibung Trockenbau Wände, HPL-Türen, abgeh. Decken, Vollverdunklung, Strahlenschutz mit Zuarbeit Heizkühldecken**		**181 Tage**	**17.03.2028**	**27.11.2028**		
361	**Ausschreibung Schlosser Treppengeländer, Schachtbühnen etc.**		**231 Tage**	**10.03.2028**	**12.02.2029**		
384	**Ausschreibung Schwerlastdecken Radiologie**		**251 Tage**	**20.09.2024**	**08.09.2025**		
407	**Ausschreibung Malerarbeiten**		**365 Tage**	**05.05.2028**	**12.10.2029**		
426	**Ausschreibung Stahlglas- und Stalblechtüren**		**221 Tage**	**12.05.2028**	**02.04.2029**		
445	**Ausschreibung Estrich**		**226 Tage**	**05.05.2028**	**02.04.2029**		
464	**Ausschreibung Baureinigung**		**181 Tage**	**02.03.2029**	**12.11.2029**		
483	**Ausschreibung Fliesenarbeiten**		**246 Tage**	**17.11.2028**	**12.11.2029**		
502	**Ausschreibung Bodenbelagsarbeiten PVC und Teppich**		**246 Tage**	**17.11.2028**	**12.11.2029**		
521	**Ausschreibung HPL-Türen ggf. separat**		**256 Tage**	**24.03.2028**	**02.04.2029**		
540	**Ausschreibung WC-Trennwände**		**256 Tage**	**01.06.2029**	**10.06.2030**		
559	**Ausschreibung Schreiner**		**256 Tage**	**03.11.2028**	**12.11.2029**		
578	**Ausschreibung Schließenlage**		**221 Tage**	**20.07.2029**	**10.06.2030**		
597	**Beschilderung**		**196 Tage**	**24.08.2029**	**10.06.2030**		
616	**TGA**		**639 Tage**	**06.04.2027**	**12.11.2029**		
617	**Ausschreibung KG460 Förderanlagen**		**249 Tage**	**06.04.2027**	**28.04.2028**		
643	**Ausschreibung KG410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen**		**199 Tage**	**21.03.2028**	**08.01.2029**		
667	**Ausschreibung KG420 Wärmeversorgungsanlagen**		**182 Tage**	**13.04.2028**	**08.01.2029**		
691	**Ausschreibung KG430 Raumlufttechnische Anlagen**		**175 Tage**	**24.04.2028**	**08.01.2029**		
715	**Ausschreibung KG470 med. Gase**		**160 Tage**	**15.05.2028**	**08.01.2029**		
739	**Ausschreibung KG480 Gebäude-u. Anlagenautomation**		**99 Tage**	**02.05.2028**	**15.09.2028**		
755	**Ausschreibung KG440 Starkstromanlagen**		**182 Tage**	**16.03.2028**	**27.11.2028**		
779	**Ausschreibung KG450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen**		**182 Tage**	**16.03.2028**	**27.11.2028**		
803	**Ausschreibung KG473 HF-Kabine**		**257 Tage**	**02.11.2028**	**12.11.2029**		
827	**Ausschreibung KG500 Außenanlagen**		**100 Tage**	**04.12.2028**	**04.05.2029**		
844	**weitere VE KG 300 / 600**		**1 Tag?**	**08.09.2025**	**08.09.2025**		
845	Ausschreibung Lose Möbel KG600?		1 Tag?	08.09.2025	08.09.2025		

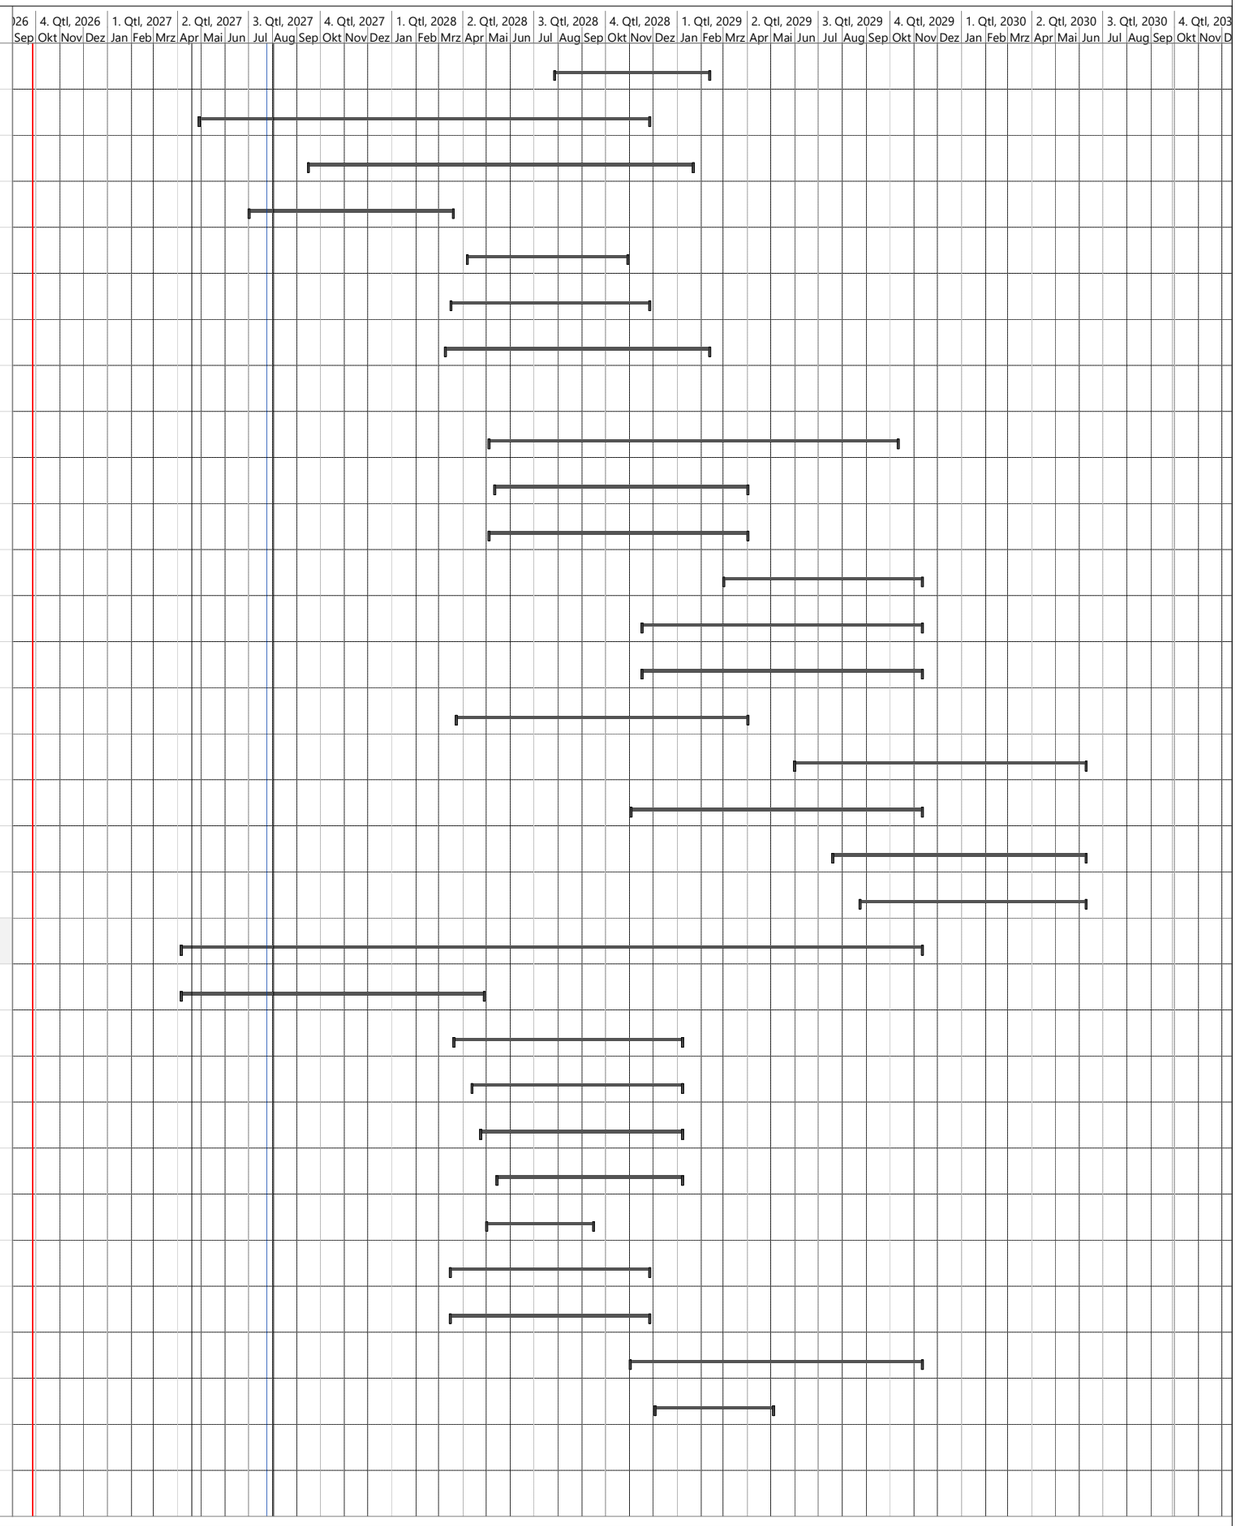

Nr.	Vorgangsname	Bearbeiter	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
846							
847	**LPH 8 Ausführung**		**860 Tage**	**05.04.2027**	**27.09.2030**		
848	Baubeginn		0 Tage	05.04.2027	05.04.2027		850AA
849	**Ausführung Vorbereitende Maßnahmen Baufeld**		**70 Tage**	**05.04.2027**	**16.07.2027**		**238AE**
850	BE und Sicherungsmaßnahmen		10 Tage	05.04.2027	16.04.2027	848AA	851
851	Rückbau Ausstattungen etc.		5 Tage	19.04.2027	23.04.2027	850	852
852	Sicherungsmaßnahmen TGA/Leitungen		20 Tage	26.04.2027	28.05.2027	851	853
853	Erdarbeiten und Schutzmaßnahmen für BE		25 Tage	31.05.2027	02.07.2027	852	854
854	BE final		10 Tage	05.07.2027	16.07.2027	853	859
855	**Verbau und Erdarbeiten**		**90 Tage**	**19.07.2027**	**10.12.2027**		**253AE**
856	Planung AN Verbau inkl. Prüfstatik		25 Tage	19.07.2027	10.09.2027	221	857;858
857	Prüfung		20 Tage	13.09.2027	08.10.2027	856	859
858	Arbeitsvorbereitung		25 Tage	13.09.2027	15.10.2027	856	859
859	Ausführung Verbau		40 Tage	18.10.2027	10.12.2027	858;857;854	860
860	Ausführung Rohbau (Beginn: Lastverteiler AWT-Tunnel Bestand)		265 Tage	13.12.2027	12.01.2029	859	861AA
861	**Rohbau**		**240 Tage**	**13.12.2027**	**24.11.2028**	**860AA**	**865**
862	UG		12 Wochen	13.12.2027	17.03.2028		863;642AE
863	OGS		36 Wochen	20.03.2028	24.11.2028	862	864EE;867EA-20 Tage;323AE
864	Stahlbau		4 Wochen	30.10.2028	24.11.2028	863EE	
865	Fassade 1 - Elemente dicht		1,5 Monate	27.11.2028	19.01.2029	861	866;869AA;286AE
866	Fassade 2 - Bekleidungen		2 Monate	22.01.2029	16.03.2029	865	875EA+35 Tage;304AE
867	Ausbau Roh 1		4,5 Monate	30.10.2028	16.03.2029	863EA-20 Tage	868AA+40 Tage;341AE;383AE
868	Ausbau Roh 2		7 Monate	08.01.2029	20.07.2029	867AA+40 Tage	666AE;690AE;714A
869	Ausbau 1		6 Monate	27.11.2028	25.05.2029	865AA	870AA+80 Tage;360AE;425AE
870	Ausbau 2		8 Monate	02.04.2029	09.11.2029	869AA+80 Tage	871;444AE;463AE;5
871	Ausbau 3		7 Monate	12.11.2029	07.06.2030	870	873;874;482AE;501
872	Ausführung C03 Radiologie		265 Tage	12.02.2029	01.03.2030	867EA-25 Tage	383AE;268AE
873	Ausstattungen		1 Monat	10.06.2030	05.07.2030	871	558AE;596AE;615A
874	IBN/Fertigstellung		4 Monate	10.06.2030	27.09.2030	871	
875	**Außenanlagen**		**0 Tage**	**04.05.2029**	**04.05.2029**	**866EA+35 Tage**	**843AE**
876							

