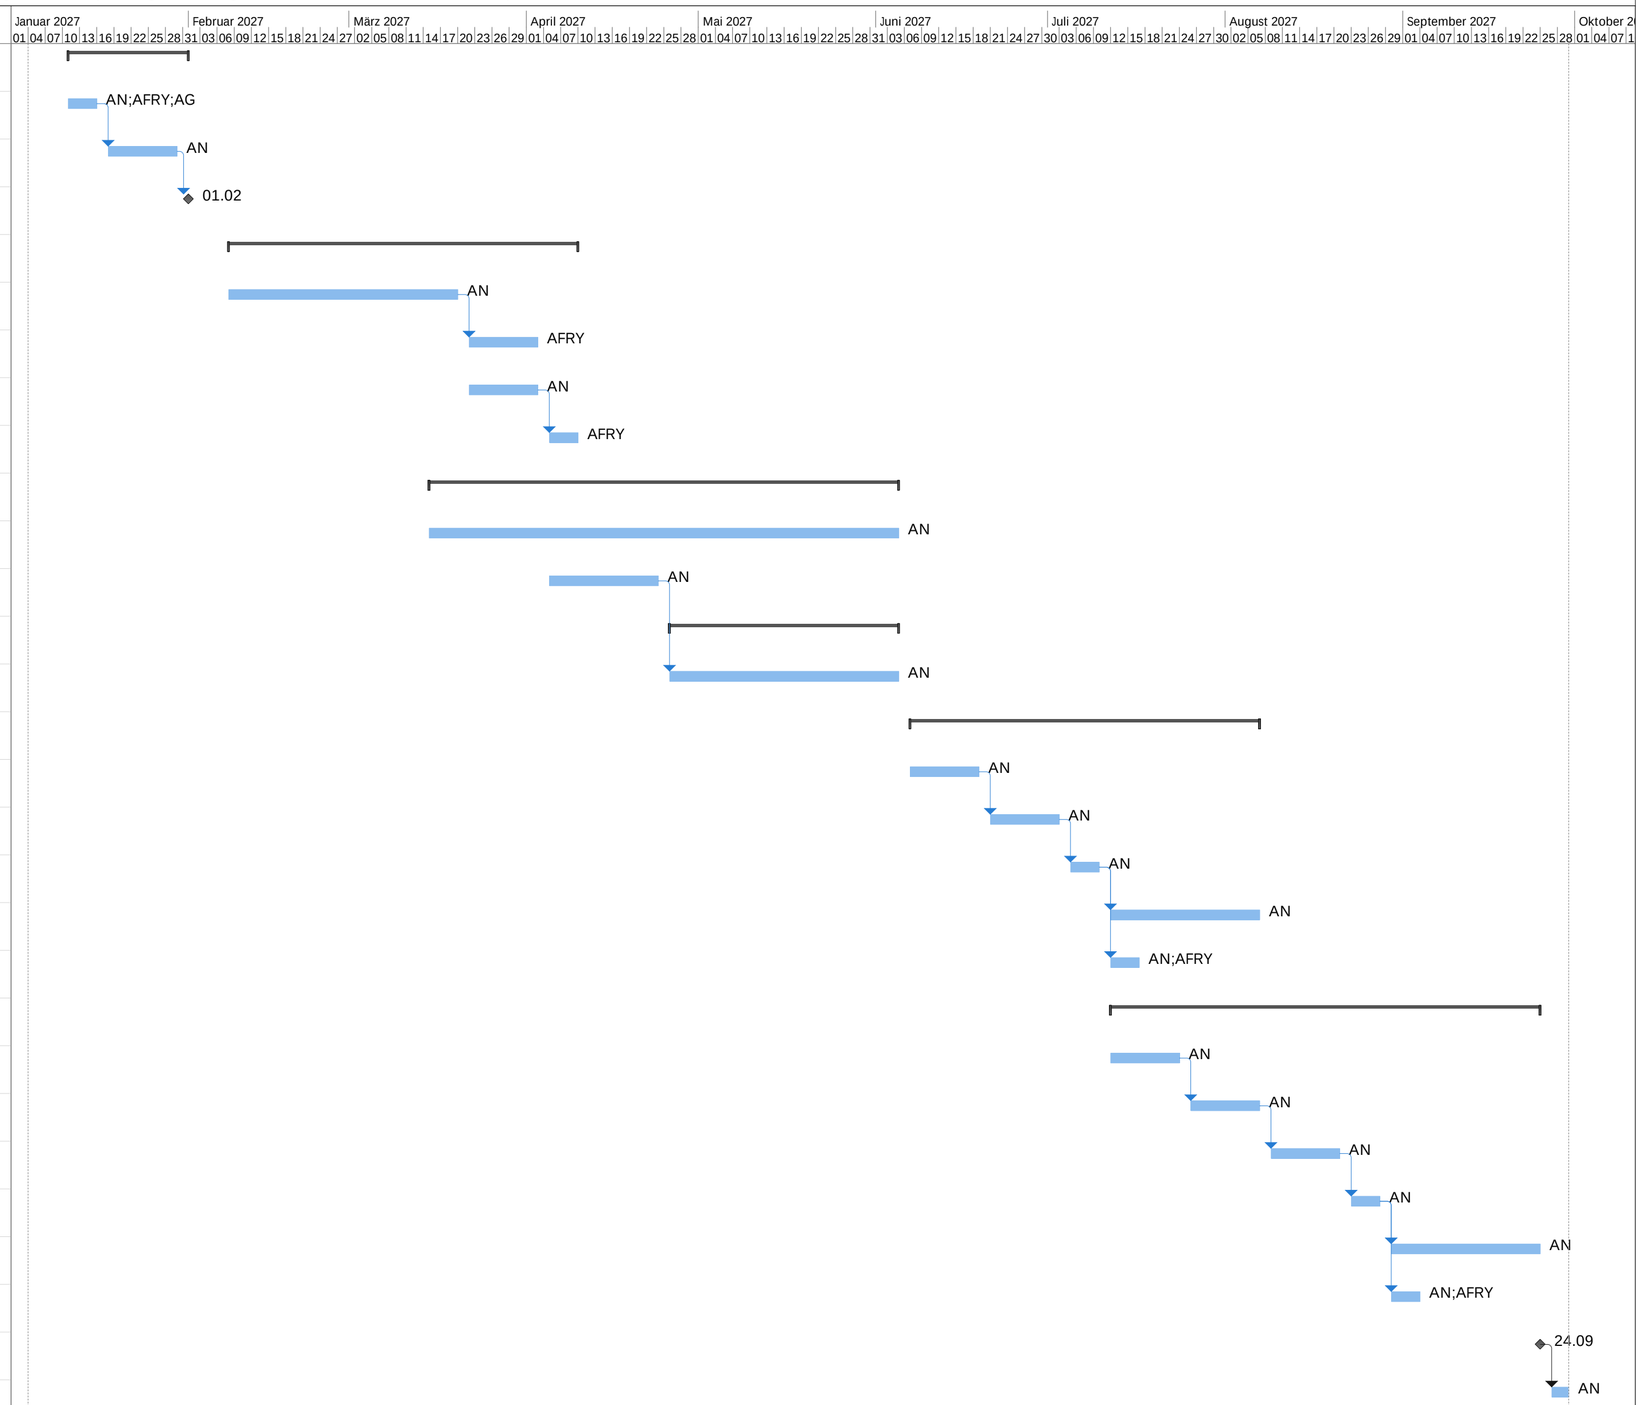Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Projektstart	15 Tage	Mon 11.01.27	Mon 01.02.27
2	Projektstartgespräch	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
3	Bestandsaufnahme	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27
4	Einreichen des Bauzeitenplans	0 Tage	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
5	Werks- und Montageplanung (WuM-Planung)	45 Tage	Mon 08.02.27	Fre 09.04.27
6	Werks- und Montageplanung (WuM-Planung)	30 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.03.27
7	Prüfen der WuM-Planung	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
8	Einreichen des Pflichtenhefts	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
9	Prüfen und Freigabe des Pflichtenhefts	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27
10	Bestellvorgang	60 Tage	Mon 15.03.27	Fre 04.06.27
11	Bestellvorgang Absperrschieber mit Elektrostellantrieb	60 Tage	Mon 15.03.27	Fre 04.06.27
12	Bestellvorgang Elektrotechnik	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
13	Schaltanlagenbau	30 Tage	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27
14	Schaltanlagenbau	30 Tage	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27
15	Hebewerk 3	45 Tage	Mon 07.06.27	Fre 06.08.27
16	Montagevorbereitung	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27
17	Umschluss und Elektromontage	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
18	Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
19	Probebetrieb	20 Tage	Mon 12.07.27	Fre 06.08.27
20	Aufmaß	5 Tage	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27
21	Pumpwerk 11 (Südost)	55 Tage	Mon 12.07.27	Fre 24.09.27
22	Montagevorbereitung	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
23	Montage der Absperrschieber	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
24	Umschluss und Elektromontage	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27
25	Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27
26	Probebetrieb	20 Tage	Mon 30.08.27	Fre 24.09.27
27	Aufmaß	5 Tage	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27
28	Abnahme	0 Tage	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27
29	Schlussrechnung	3 Tage	Mon 27.09.27	Mit 29.09.27
