Bauzeitenplan
Stand: 02.07.2026

2515_Neubau OGS Wanderup

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Projektkonzeption**	**1 Tag**	**Die 25.02.25**	**Die 25.02.25**	
8	**Vorentwurfsplanung**	**86 Tage**	**Mit 26.02.25**	**Mit 02.07.25**	
19	**Entwurfsplanung**	**93 Tage**	**Don 15.05.25**	**Mit 24.09.25**	
28	**Genehmigungsplanung Abriss**	**81 Tage**	**Don 03.07.25**	**Fre 24.10.25**	
32	**Genehmigungsplanung Neubau**	**102 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Mit 11.02.26**	
42	**Genehmigungsplanung Container**	**128 Tage**	**Don 15.05.25**	**Fre 14.11.25**	
49	**Ausführungsplanung**	**99 Tage**	**Mit 19.11.25**	**Mit 22.04.26**	
62	**Bauvorbereitung**	**409 Tage**	**Die 07.01.25**	**Die 01.09.26**	
191	**REALISIERUNG**	**607 Tage**	**Don 27.03.25**	**Fre 10.09.27**	
192	**Containergestellung**	**20 Tage**	**Mon 17.11.25**	**Fre 12.12.25**	
194	**Umbau Sporthalle**	**58 Tage**	**Mon 15.12.25**	**Die 17.03.26**	
213	**Anbau Lager Sporthalle**	**64 Tage**	**Mon 18.05.26**	**Fre 14.08.26**	
214	Erd- und Betonarbeiten	39 Tage	Mon 18.05.26	Fre 10.07.26	
215	Zimmer- und Stahlarbeiten	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	214
216	Fassadenarbeiten	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	215
217	Dacharbeiten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	215
218	Abbrucharbeiten Außenwand	5 Tage	Mon 27.07.26	Mon 03.08.26	223AE
219	Trockenbauarbeiten	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	217
220	Anputzarbeiten	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	219
221	Einbau Stahlrahmen	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26	220
222	Einbau Heizleitungen, Heizkörper, Elektro	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	219AA
223	Estricharbeiten	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	222
224	Einbau Tore	3 Tage	Fre 07.08.26	Die 11.08.26	223EA+3 Tage
225	Bodenbelagsarbeiten	2 Tage	Die 11.08.26	Mit 12.08.26	223EA+5 Tage
226	Spachtel- und Malerarbeiten	2 Tage	Don 13.08.26	Fre 14.08.26	225
227	**Abrissarbeiten**	**45 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Fre 06.03.26**	
230	**Baustelleneinrichtung Neubau**	**222 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Die 26.01.27**	
231	Erstellung Baustraße	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	229EE
232	Aufbau Sanitärcontainer	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	234AA
233	Herstellung Untergrund Kran	2 Tage	Mit 08.04.26	Fre 10.04.26	235AE
234	Baustelleneinrichtung Tiefbau	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26	238AE
235	Aufbau Kran	1 Tag	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26	
236	Abbau Kran	2 Tage	Mon 25.01.27	Die 26.01.27	351;348;347
237	**Vermessungsarbeiten**	**27 Tage**	**Don 19.03.26**	**Mit 29.04.26**	
240	**Erdarbeiten, Abwasserkanalarbeiten**	**76 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Mon 13.07.26**	
241	Aushub Baugrube	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26	
242	Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Fundam.	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	241
243	Auffüllung Ersatzboden + Planum UK Bodenplatte	3 Tage	Mit 29.04.26	Mon 04.05.26	264
244	Verlegung Grundleitungen unterhalb Gebäude	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26	243
245	Feinplanum UK Dämung Bodenplatte	2 Tage	Die 12.05.26	Mit 13.05.26	244

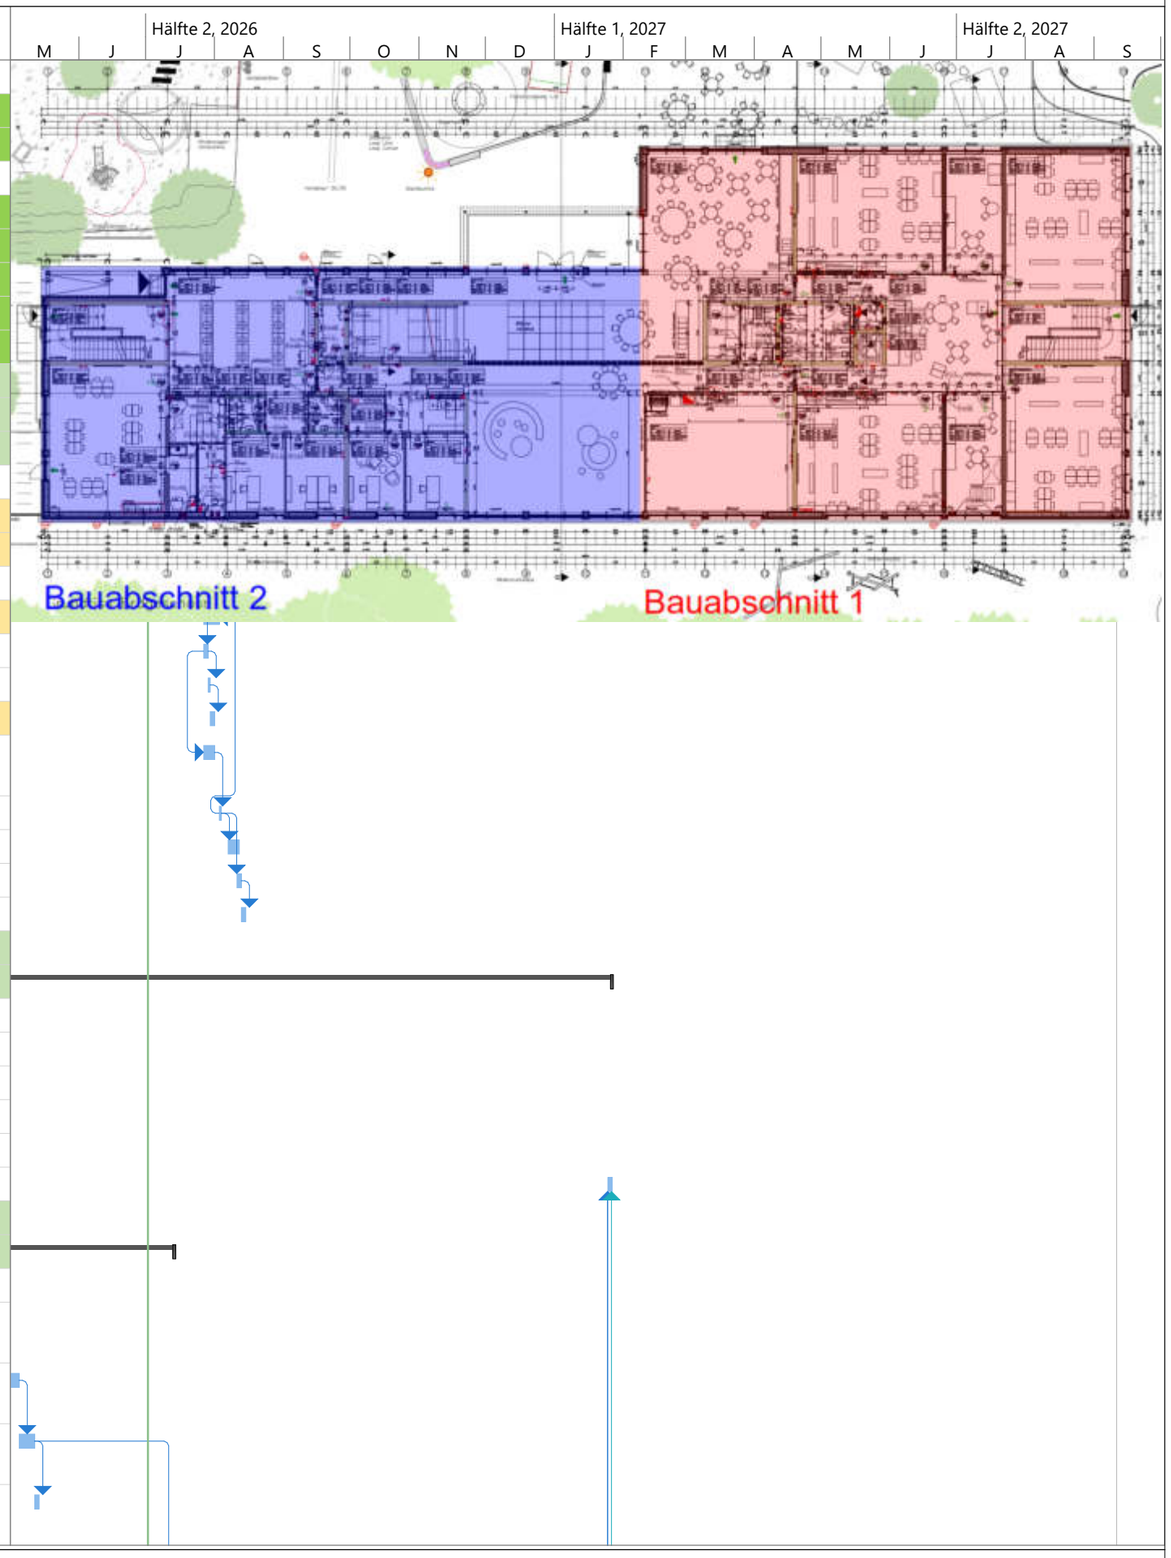

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
246	Auffüllung Fundamentgräben, BA 1	1 Tag	Die 30.06.26	Die 30.06.26	
247	Auffüllung Fundamentgräben, BA 2	1 Tag	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	244
248	**Blitzschutz- und Erdungsarbeiten**	**444 Tage**	**Don 27.03.25**	**Mit 20.01.27**	
249	Ringleitungserder	2 Tage	Mon 30.03.26	Die 31.03.26	241
250	Fundamenterder	2 Tage	Don 27.03.25	Fre 28.03.25	
251	Blitzschutzarbeiten (unter) Fassade	10 Tage	Mon 12.10.26	Mon 26.10.26	361AE
252	Fangleitungen Dach	5 Tage	Don 14.01.27	Mit 20.01.27	319
253	**Betonarbeiten**	**130 Tage**	**Die 07.04.26**	**Fre 09.10.26**	
254	Baustelleneinrichtung	9 Tage	Die 07.04.26	Fre 17.04.26	
255	Unterfahrt Aufzug	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26	
256	Streifenfundamente Takt 1 (9-19)	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	
257	**Fundamente und Unterfahrt**	**16 Tage**	**Die 07.04.26**	**Die 28.04.26**	
265	**Bodenplatte, BA 1**	**12 Tage**	**Mon 18.05.26**	**Mit 03.06.26**	
269	**Bodenplatte, BA 2**	**17 Tage**	**Don 28.05.26**	**Son 21.06.26**	
273	**Wände, Decken BA 1, Achse 12-19**	**50 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 07.08.26**	
274	Takt 1, TRH 2, Achse 17-19	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 03.07.26	267
275	Takt 2, Aufzug Achse 15/D	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	274
276	Takt 3, Wände Achse 13-15, C-E	8 Tage	Mon 13.07.26	Mit 22.07.26	275EA-5 Tage
277	Takt 4, Wände Achse 12-13, C-E	8 Tage	Mon 20.07.26	Mit 29.07.26	276EA-3 Tage
278	Takt 5, Wände Achse 13-14, A-G + Wand Achse 8, E-G	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	277EA-3 Tage
279	**Wände, Decken BA 2, Achse 1-8**	**30 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 18.09.26**	
280	Takt 6, TRH 1 Achse 1-3	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	278
281	Takt 7, F60 Wand Achse 5-6, E-G	11 Tage	Mit 26.08.26	Sam 05.09.26	280EA-3 Tage
282	Takt 8, Wände Achse 6-8, C-E	13 Tage	Mit 02.09.26	Fre 18.09.26	281EA-3 Tage
283	**Treppen**	**22 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Fre 09.10.26**	
284	Einbau Fertigteile TRH 2	2 Tage	Mit 09.09.26	Fre 11.09.26	274;304AE;307AE
285	Einbau Fertigteile TRH 1	2 Tage	Mit 07.10.26	Fre 09.10.26	280;315AE;312AE
286	Einbau Fertigteile Hauptreppe	2 Tage	Mon 21.09.26	Die 22.09.26	282
287	**Gerüste Holzbau**	**91 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mon 18.01.27**	
288	Aufbau Außengerüst EG	3 Tage	Mon 31.08.26	Don 03.09.26	306AE;303AE
289	Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Die 29.09.26	Fre 02.10.26	314AE;309AE;311
290	Aufbau Innengerüst Aula	1 Tag	Don 01.10.26	Fre 02.10.26	314AE;309AE;311
291	Abbau Innengerüst Aula	1 Tag	Don 14.01.27	Fre 15.01.27	405AE
292	Abbau Außengerüste	3 Tage	Don 14.01.27	Mon 18.01.27	319;361;343
293	**Holzbauarbeiten**	**115 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Fre 23.10.26**	
294	Abstimmung Werkplanung mit AN	15 Tage	Fre 15.05.26	Mon 08.06.26	296AE
295	Abstimmung Werkplanung mit AN	15 Tage	Fre 15.05.26	Mon 08.06.26	296AE
296	Prüfstatiker	20 Tage	Mon 08.06.26	Mon 06.07.26	297AE
297	Bestellung Holz	0 Tage	Mon 06.07.26	Mon 06.07.26	298AE
298	Lieferzeit Holz	5 Tage	Mon 06.07.26	Mon 13.07.26	299AE
299	Abbund HRB inkl. Fassade	25 Tage	Mon 13.07.26	Mon 17.08.26	303AE
300	Abbund Kassettendecken	35 Tage	Don 18.06.26	Don 06.08.26	304AE-13 Tage
301	**Richten BA 1**	**34 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Don 24.09.26**	

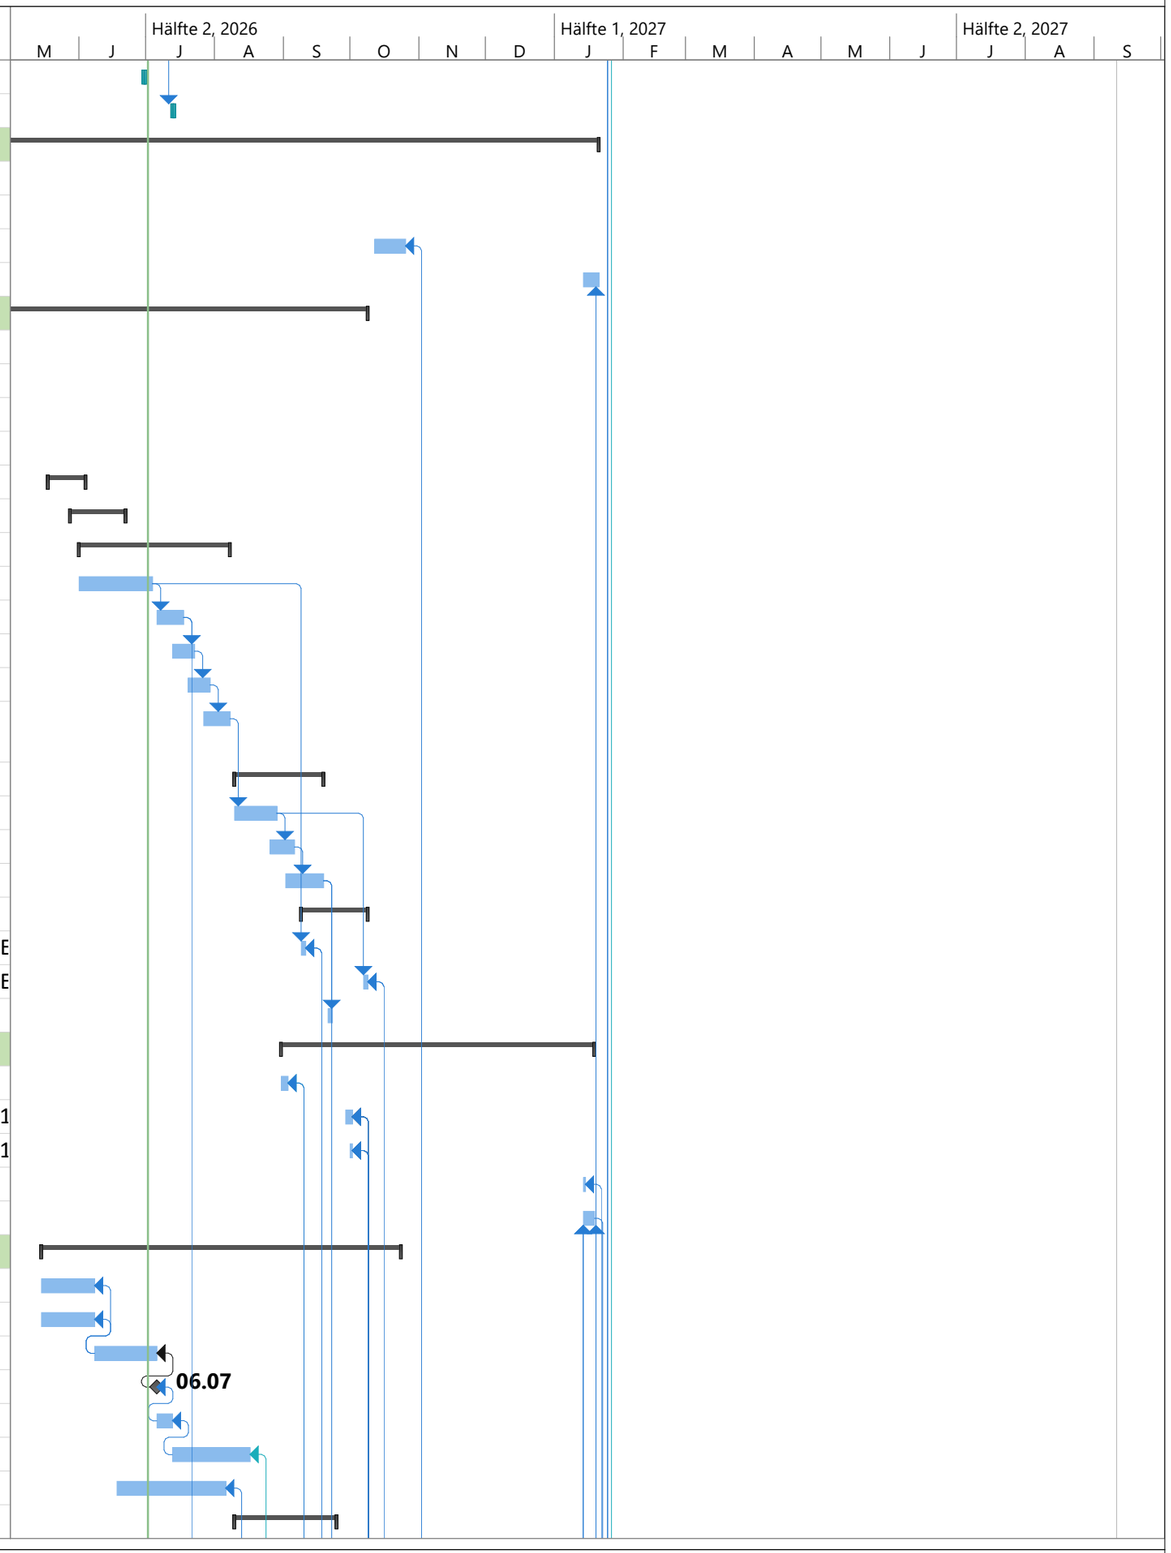

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
302	Nivellierschwellen	5 Tage	Mon 10.08.26	Mon 17.08.26	303AE
303	Wände / Stützen EG	6 Tage	Mon 17.08.26	Mon 24.08.26	
304	Kassettendecken EG Montage	4 Tage	Die 25.08.26	Fre 28.08.26	303
305	Witterungsschutz	3 Tage	Mon 31.08.26	Mit 02.09.26	304
306	Wände / Stützen OG	6 Tage	Don 03.09.26	Don 10.09.26	305
307	Kassettendecken OG Montage	3 Tage	Fre 11.09.26	Die 15.09.26	306
308	Montage Attika	4 Tage	Mon 21.09.26	Don 24.09.26	323
309	**Richten BA 2**	**37 Tage**	**Don 03.09.26**	**Fre 23.10.26**	**305**
310	Nivellierschwellen	3 Tage	Don 03.09.26	Mon 07.09.26	
311	Wände / Stützen EG	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	282
312	Kassettendecken EG Montage	2 Tage	Mon 28.09.26	Die 29.09.26	311
313	Witterungsschutz	2 Tage	Mit 30.09.26	Don 01.10.26	312
314	Wände / Stützen OG	5 Tage	Fre 02.10.26	Don 08.10.26	313
315	Kassettendecken OG Montage	2 Tage	Fre 09.10.26	Mon 12.10.26	314;311
316	Montage Attika	4 Tage	Die 20.10.26	Fre 23.10.26	331
317	**Dach**	**2 Tage**	**Die 20.10.26**	**Mit 21.10.26**	**313**
318	Dachkranz RWA	2 Tage	Die 20.10.26	Mit 21.10.26	316AA;308AA
319	Klempnerarbeiten Attika	10 Tage	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27	361
320	**Dachabdichtungsarbeiten**	**127 Tage**	**Die 07.07.26**	**Mit 13.01.27**	
321	**Bauabschnitt 1**	**19 Tage**	**Mit 16.09.26**	**Mon 12.10.26**	
322	Einbau Rauchabzug Aufzugschacht	1 Tag	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26	307
323	Dampfbremse	2 Tage	Don 17.09.26	Fre 18.09.26	322
324	Hochführen Damfbremse Attika	3 Tage	Fre 25.09.26	Die 29.09.26	308
325	Dämmung	4 Tage	Mit 30.09.26	Mon 05.10.26	324
326	Abdichtung	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	325
327	**Bauabschnitt 2**	**91 Tage**	**Die 07.07.26**	**Die 10.11.26**	
328	Abstimmung RWA-Anlage	10 Tage	Die 07.07.26	Die 21.07.26	329AE
329	Fertigung RWA-Anlage	60 Tage	Die 21.07.26	Die 13.10.26	330AE
330	Einbau RWA-Anlagen, Dachausstieg	3 Tage	Die 13.10.26	Don 15.10.26	315
331	Dampfbremse	2 Tage	Fre 16.10.26	Mon 19.10.26	330
332	Hochführen Damfbremse Attika	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	316
333	Dämmung	4 Tage	Don 29.10.26	Die 03.11.26	332
334	Abdichtung	5 Tage	Mit 04.11.26	Die 10.11.26	333
335	**Gründach, UK PV-Anlage**	**78 Tage**	**Mit 11.11.26**	**Fre 12.03.27**	
336	Schutzvlies	3 Tage	Mit 11.11.26	Fre 13.11.26	334
337	Einbau Feuchtewächter	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	336
338	Einbau Dachgeländer	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	336
339	Speichermatten	5 Tage	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	338AA+2 Tage
340	Vlies, Pflanzpads	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	339
341	Unterbau Plattenbeläge	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	340
342	Plattenbeläge	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	341
343	Einbau Substrat	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	341

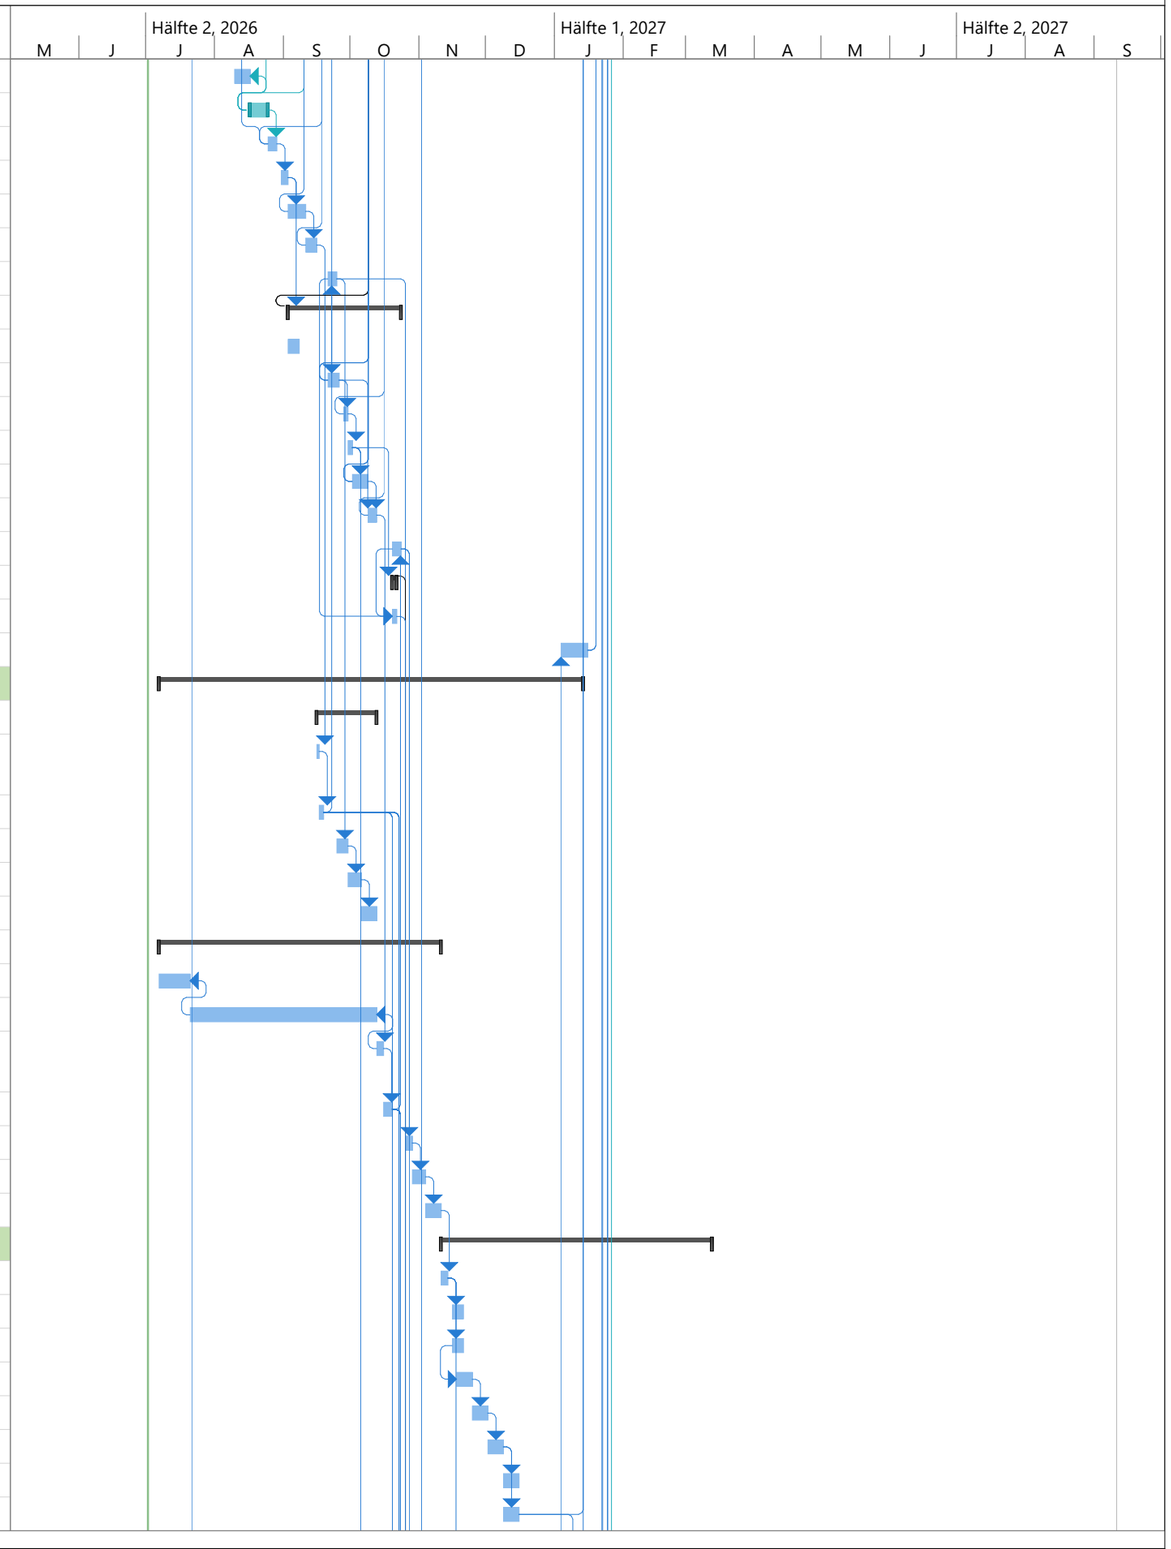

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
344	Einsaat, Fertigstellungspflege	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	
345	**Dachausstieg, Rauchabzüge**	**10 Tage**	**Die 20.10.26**	**Mon 02.11.26**	
346	Montage Rauchabzug Aula	3 Tage	Die 20.10.26	Don 22.10.26	323;331
347	Montage Rauchabzug Aufzug	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	323;331
348	Montage Dachausstieg	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26	323;331
349	**PV-Anlage**	**40 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Fre 22.01.27**	
350	Montage UK	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	336
351	Montage PV-Anlage	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	343
352	**Fenster / Türen / PR-Fassade**	**106 Tage**	**Don 11.06.26**	**Don 05.11.26**	
353	Montageplanung	10 Tage	Don 11.06.26	Don 25.06.26	354AE
354	Überarbeitung / Freigabe	5 Tage	Don 25.06.26	Don 02.07.26	355AE
355	Profilbestellung und Prüfung	1 Tag	Don 02.07.26	Fre 03.07.26	356AE
356	Fertigung	60 Tage	Fre 03.07.26	Fre 25.09.26	357AE
357	Einbau Fenster / Türen	20 Tage	Fre 25.09.26	Don 22.10.26	313EA-5 Tage
358	Einbau PR-Fassade	15 Tage	Fre 02.10.26	Don 22.10.26	313
359	Montage Sonnenschutz	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	357;358
360	**Fassadenarbeiten**	**40 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 18.12.26**	
361	Holzschalung, Winddichtigkeit, Bleche	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26	318;357;358;317;
362	**Trockenbau**	**146 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 03.06.27**	
363	**Erdgeschoss**	**50 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 14.01.27**	
364	Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	357
365	Lattung Installationsebenen	8 Tage	Fre 06.11.26	Die 17.11.26	364
366	Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Die 15.12.26	Fre 08.01.27	372AE
367	Schließen Innenwände	10 Tage	Fre 11.12.26	Fre 08.01.27	372AE
368	Spachteln Q2	5 Tage	Fre 08.01.27	Don 14.01.27	367
369	**Obergeschoss**	**50 Tage**	**Fre 06.11.26**	**Don 28.01.27**	
370	Aufbau Innenwände 1-seitig beplankt	10 Tage	Fre 06.11.26	Don 19.11.26	364
371	Lattung Installationsebenen	7 Tage	Mit 16.12.26	Fre 08.01.27	372AE
372	Beplankung Installationsebenen	8 Tage	Fre 08.01.27	Die 19.01.27	384
373	Schließen Innenwände	10 Tage	Fre 08.01.27	Don 21.01.27	384
374	Spachteln Q2	5 Tage	Fre 22.01.27	Don 28.01.27	373
375	Abgehängte Decken	10 Tage	Fre 08.01.27	Don 21.01.27	384
376	Akustikbeplankung Wände	5 Tage	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	375;428
377	**Metallbauarbeiten (Geländer)**	**186 Tage**	**Fre 13.11.26**	**Fre 20.08.27**	
378	Montageplanung	5 Tage	Fre 13.11.26	Fre 20.11.26	379AE
379	Fertigung	20 Tage	Fre 20.11.26	Fre 18.12.26	380AE
380	Montage Geländer Treppenhäuser	10 Tage	Fre 18.12.26	Fre 15.01.27	405AE
381	Montage Handläufe	5 Tage	Fre 13.08.27	Fre 20.08.27	483AE
382	**Rohinstallation TGA**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
383	**Elektro**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
384	Rohinstallation Elektro	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331

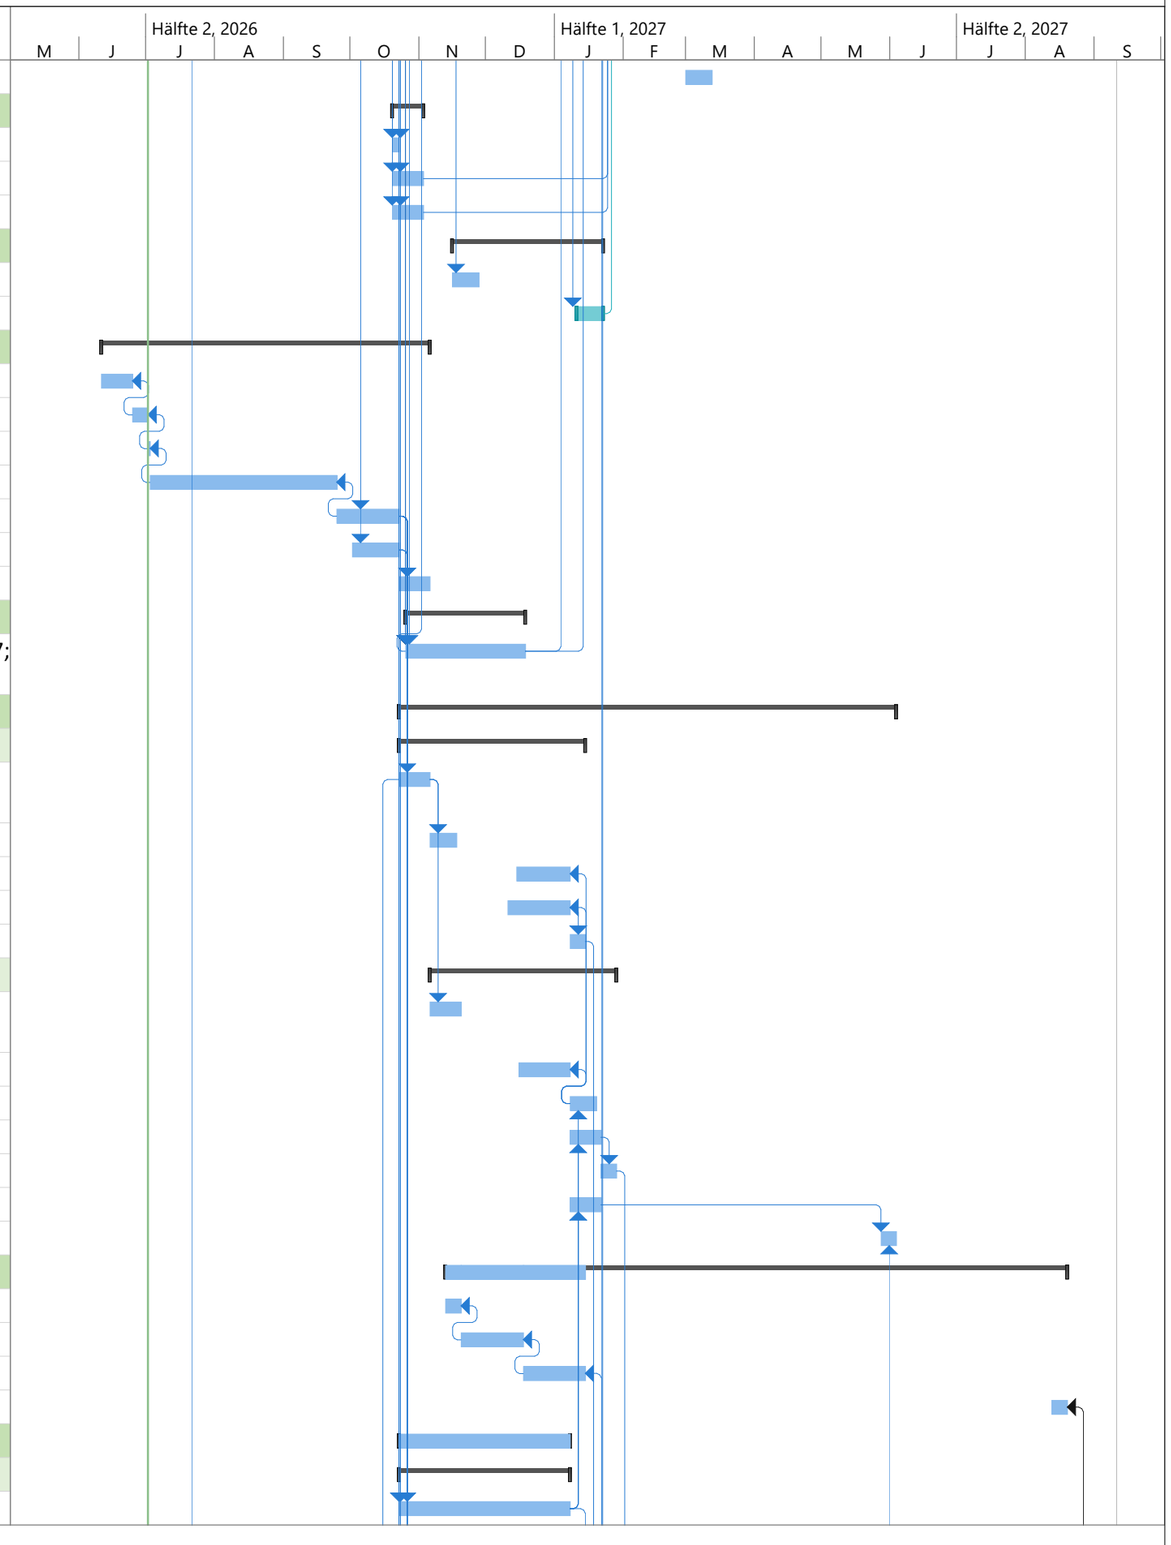

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
385	**Heizung**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
386	Rohinstallation Heizung	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331
387	Verteilungsleitungen Rohfußboden	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331
388	**Sanitär**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
389	Einbau Sanitärinstallationswände	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	364AA
390	Rohinstallation	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331
391	**Gebäudeautomation**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
392	Verkabelung RLT-Anlagen	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331
393	**Lüftung**	**45 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Don 07.01.27**	
394	WC- Lüftungsanlagen	45 Tage	Fre 23.10.26	Don 07.01.27	357;323;331
395	**Aufzug**	**323 Tage**	**Don 26.02.26**	**Fre 18.06.27**	
396	Abstimmung Werkplanung	25 Tage	Don 26.02.26	Mit 01.04.26	92
397	Aufmaß Schacht	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	275
398	Herstellung	80 Tage	Fre 28.08.26	Fre 18.12.26	397;399AE
399	Rohmontage Aufzuganlage	5 Tage	Fre 18.12.26	Fre 08.01.27	405AE-5 Tage
400	Einbau Kabine	2 Tage	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27	399
401	Abnahme DEKRA	1 Tag	Die 12.01.27	Die 12.01.27	400
402	Inbetriebnahme	1 Tag	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27	467
403	**Estricharbeiten / FB-Heizung**	**48 Tage**	**Fre 15.01.27**	**Die 23.03.27**	
404	**Erdgeschoss**	**45 Tage**	**Fre 15.01.27**	**Don 18.03.27**	
405	Dämmung	10 Tage	Fre 15.01.27	Don 28.01.27	384;385;391;368
406	Trittschalldämmung	8 Tage	Mit 27.01.27	Fre 05.02.27	405EA-2 Tage
407	Heizschlangen	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	406EA-3 Tage
408	Estrich	3 Tage	Mit 03.03.27	Fre 05.03.27	407
409	Belegreif Heizen	10 Tage	Die 09.03.27	Don 18.03.27	408EA+3 Tage
410	**Obergeschoss**	**38 Tage**	**Fre 29.01.27**	**Die 23.03.27**	
411	Schüttung	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27	374
412	Trittschalldämmung	8 Tage	Mit 10.02.27	Fre 19.02.27	411EA-2 Tage
413	Heizschlangen	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	412
414	Estrich	3 Tage	Mon 08.03.27	Mit 10.03.27	408
415	Belegreif Heizen	10 Tage	Son 14.03.27	Die 23.03.27	414EA+3 Tage
416	**Malerarbeiten**	**88 Tage**	**Mit 10.03.27**	**Don 15.07.27**	
417	Spachteln Q3	12 Tage	Mit 10.03.27	Don 25.03.27	408EA+2 Tage
418	Grundanstrich	15 Tage	Die 30.03.27	Mon 19.04.27	417
419	Endanstrich	15 Tage	Die 20.04.27	Die 11.05.27	418
420	Nacharbeiten	10 Tage	Fre 02.07.27	Don 15.07.27	425;446;451;440;
421	**Fliesenarbeiten**	**71 Tage**	**Fre 19.03.27**	**Don 01.07.27**	
422	Abdichtungsarbeiten	8 Tage	Fre 19.03.27	Don 01.04.27	409
423	Wand-und Bodenfliesen	15 Tage	Fre 02.04.27	Don 22.04.27	422
424	Silikonarbeiten	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	459
425	Sockelfliesen, Restarbeiten	5 Tage	Fre 25.06.27	Don 01.07.27	459;440;435
426	**Bodenbeläge**	**58 Tage**	**Fre 16.04.27**	**Don 08.07.27**	
427	Niveauausgleich	8 Tage	Fre 16.04.27	Die 27.04.27	409;418EA-2 Tage

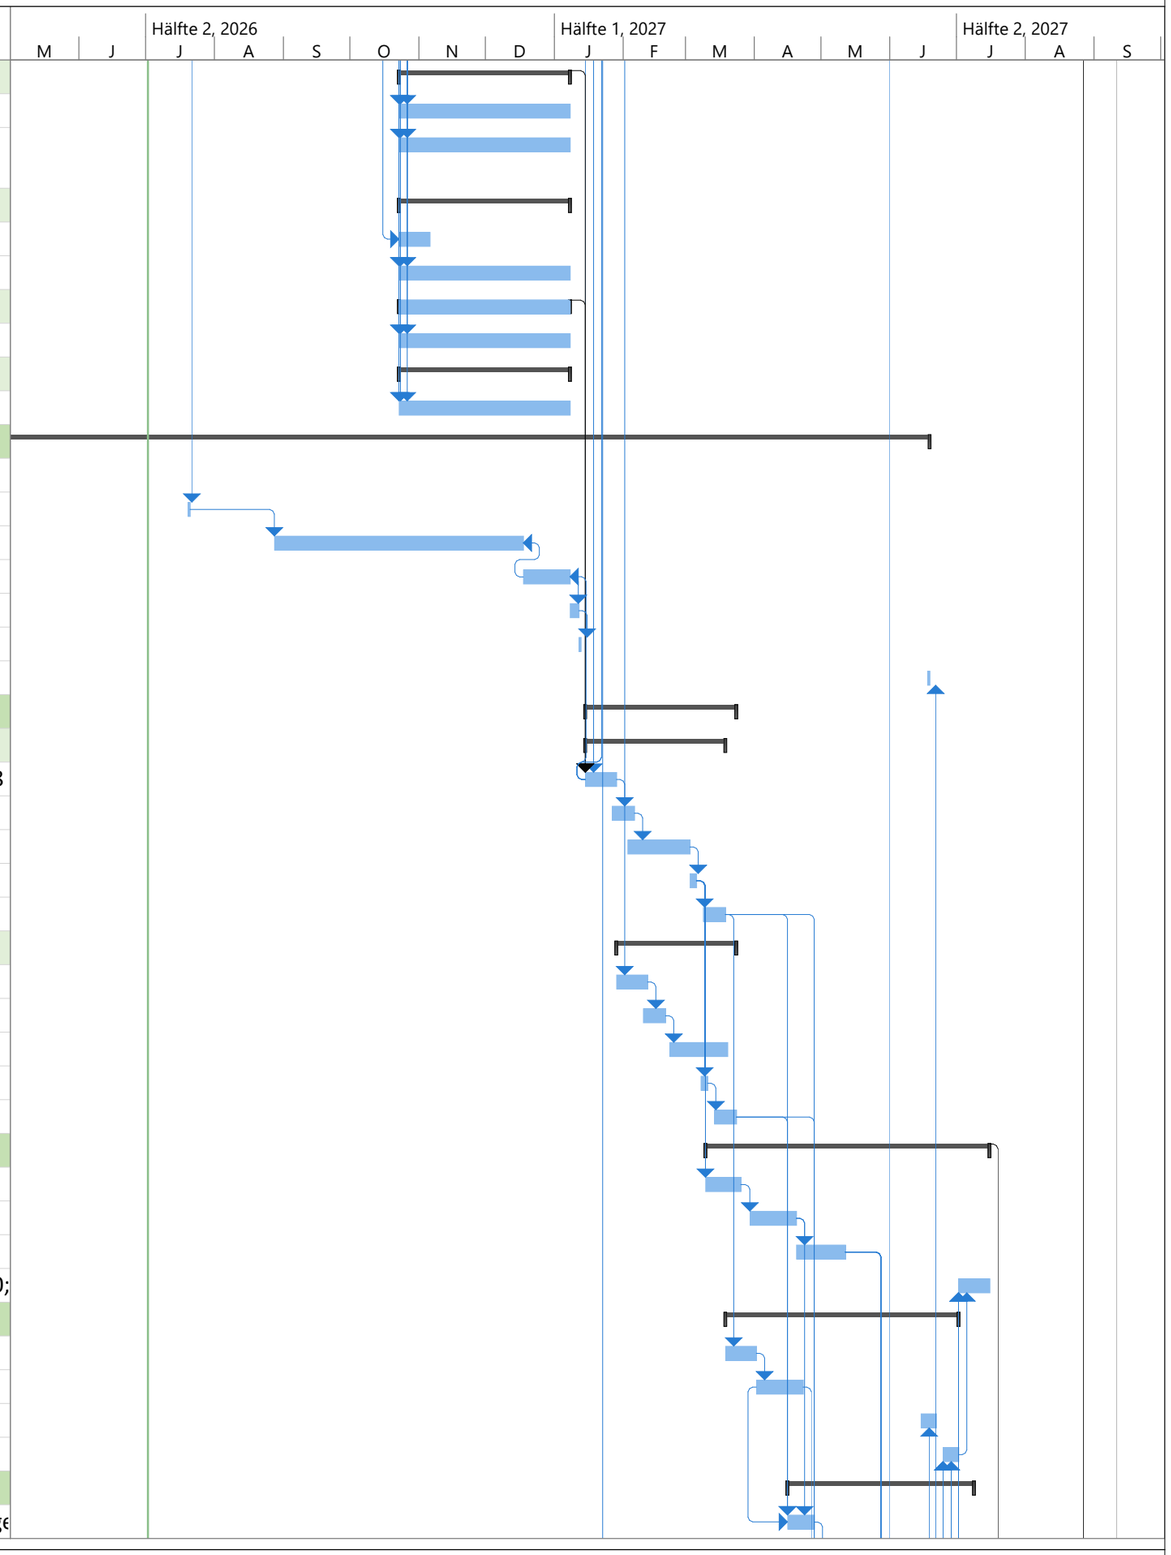

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
428		Bodenbeläge	20 Tage	Mit 28.04.27	Don 27.05.27	409;427;415
429		Fußbodenleisten	5 Tage	Fre 25.06.27	Don 01.07.27	440;435
430		Fußboden Restarbeiten	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	429;451;446;445;
431		**Mobile Trennwand**	**95 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Don 03.06.27**	
432		Montageplanung mobile Trennwand	25 Tage	Mon 18.01.27	Mon 22.02.27	433AE
433		Prüfung / Freigabe	5 Tage	Mon 22.02.27	Mon 01.03.27	434AE
434		Produktion	60 Tage	Mon 01.03.27	Fre 28.05.27	435AE
435		Einbau mobile Trennwand	5 Tage	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	428
436		**Innentüren**	**120 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Don 08.07.27**	
437		Montageplanung Innentüren	20 Tage	Mon 18.01.27	Mon 15.02.27	438AE
438		Prüfung / Freigabe	10 Tage	Mon 15.02.27	Mon 01.03.27	439AE
439		Produktion	60 Tage	Mon 01.03.27	Fre 28.05.27	440AE
440		Einbau Zargen Innentüren	20 Tage	Fre 28.05.27	Don 24.06.27	428
441		Einbau Innentüren	10 Tage	Fre 25.06.27	Don 08.07.27	440;435
442		**Tischlerarbeiten**	**120 Tage**	**Mon 04.01.27**	**Don 24.06.27**	
443		Montageplanung	30 Tage	Mon 04.01.27	Mon 15.02.27	444AE
444		Prüfung/ Freigabe	10 Tage	Mon 15.02.27	Mon 01.03.27	445AE
445		Produktion	60 Tage	Mon 01.03.27	Fre 28.05.27	446AE
446		Einbau Garderoben, Einbauschränke	20 Tage	Fre 28.05.27	Don 24.06.27	419;428
447		**Küchenzeilen**	**90 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Don 10.06.27**	
448		Montageplanung Küchen	30 Tage	Mon 01.02.27	Mon 15.03.27	449AE
449		Freigabe	5 Tage	Mon 15.03.27	Mon 22.03.27	450AE
450		Vorproduktion Küchen	45 Tage	Mon 22.03.27	Fre 28.05.27	451AE
451		Einbau Küchen	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	428
452		**Fein- und Endmontage TGA**	**58 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Don 15.07.27**	
453		**Heizung**	**35 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 15.07.27**	
454		Endmontage Heizung	35 Tage	Fre 28.05.27	Don 15.07.27	419;428
455		**Lüftung**	**35 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 15.07.27**	
456		Endmontage Lüftung	30 Tage	Fre 28.05.27	Don 08.07.27	428
457		Inbetriebnahme Lüftung	5 Tage	Fre 09.07.27	Don 15.07.27	456
458		**Sanitär**	**43 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Don 24.06.27**	
459		Endmontage, Objekte	35 Tage	Fre 23.04.27	Mon 14.06.27	423
460		Anschluss Küchenmöbel	5 Tage	Fre 11.06.27	Don 17.06.27	451
461		ggf. Nachbeprobung	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27	460
462		**Gebäudeautomation**	**35 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 15.07.27**	
463		Endmontage GA	15 Tage	Fre 28.05.27	Don 17.06.27	419;428
464		Inbetriebnahme GA	20 Tage	Fre 18.06.27	Don 15.07.27	463
465		**Elektro**	**35 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 15.07.27**	
466		Endmontage Elektro	35 Tage	Fre 28.05.27	Don 15.07.27	419;428
467		Endmontage Brandmeldeanlage	15 Tage	Fre 28.05.27	Don 17.06.27	419;428
468		**Außenarbeiten**	**155 Tage**	**Die 17.11.26**	**Fre 09.07.27**	
469		Abstimmung, Werkplanung	35 Tage	Die 17.11.26	Die 19.01.27	470AE

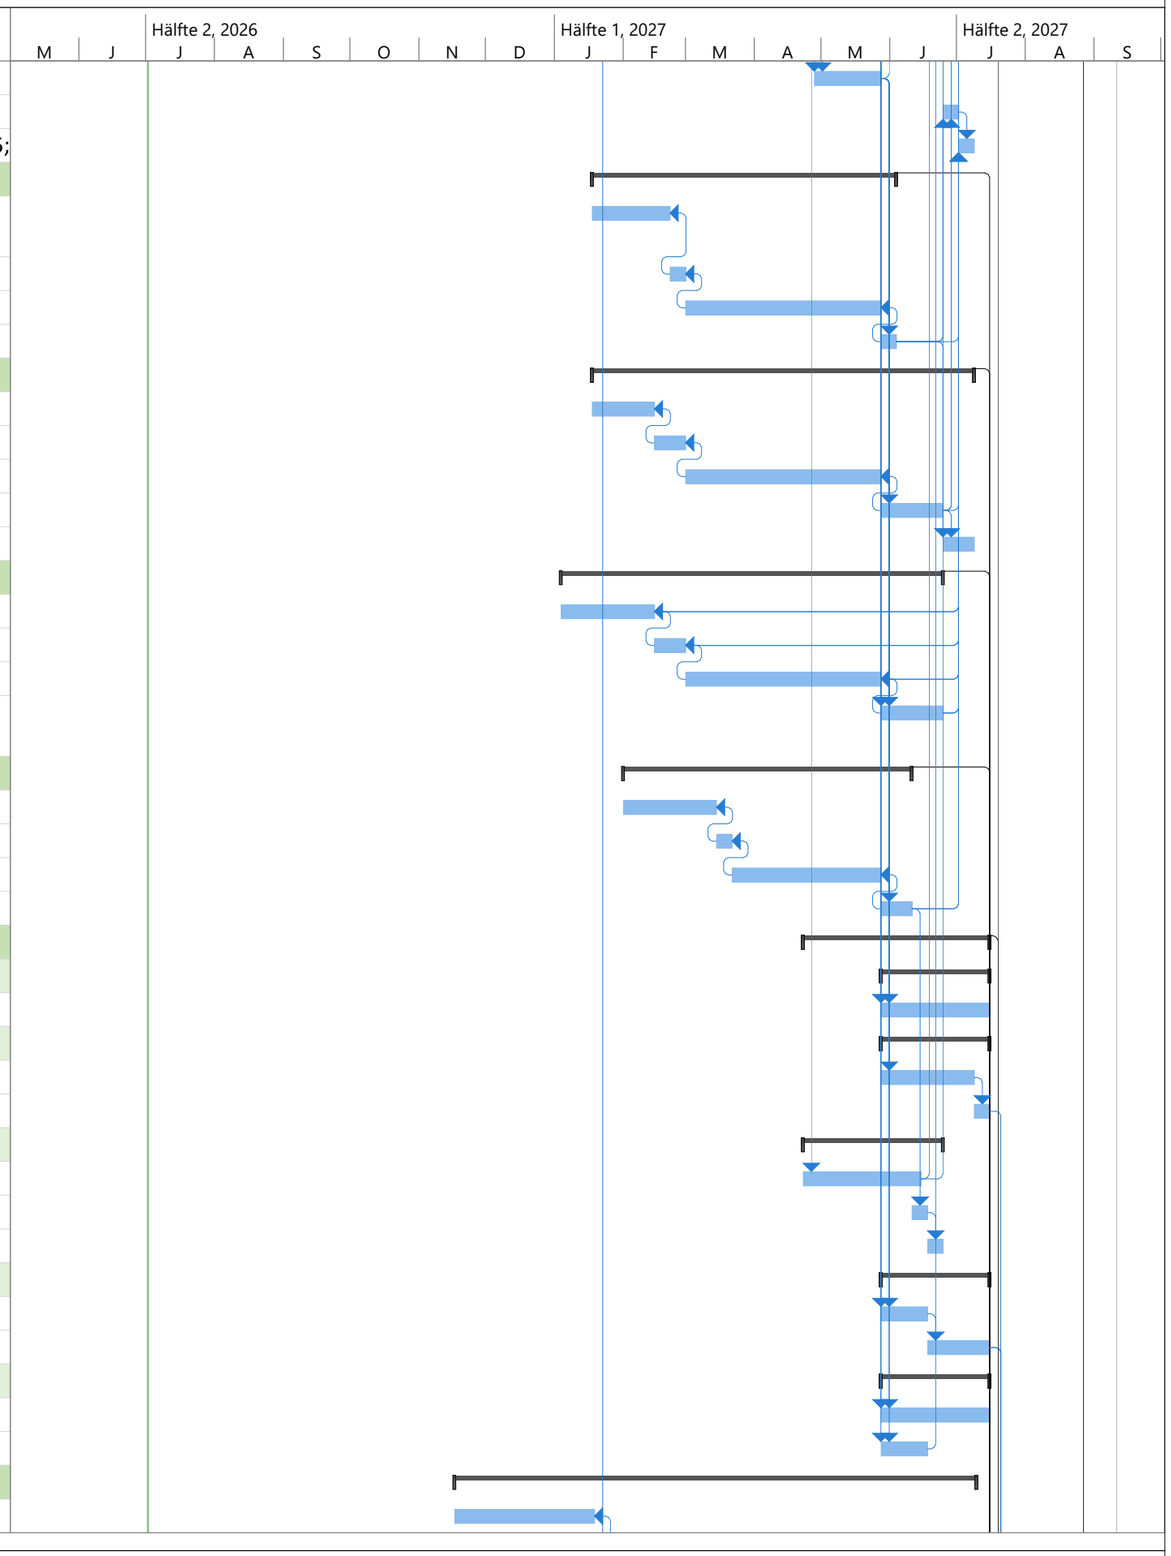
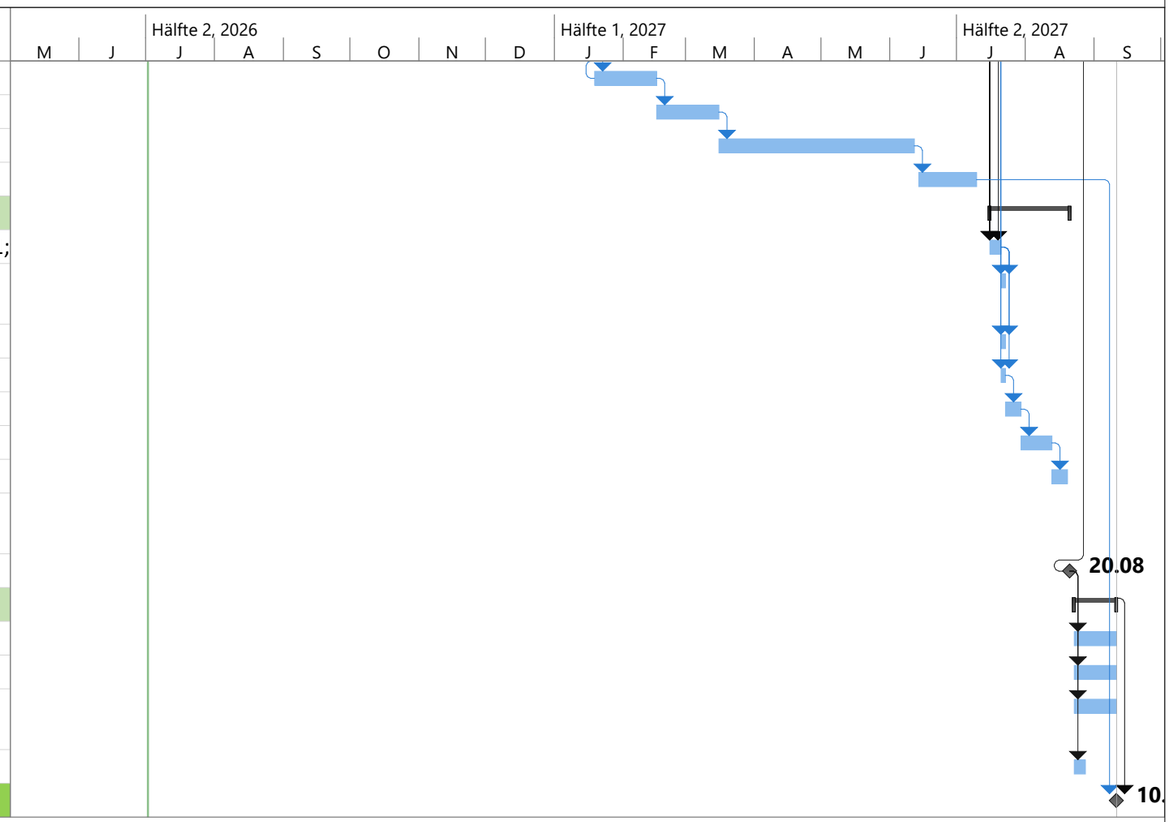
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
470		Vorbereitende Arbeiten	20 Tage	Die 19.01.27	Mon 15.02.27	292
471		Unterbau	20 Tage	Die 16.02.27	Mon 15.03.27	470
472		Oberflächen	60 Tage	Die 16.03.27	Fre 11.06.27	471
473		Anpflanzungen / Außenmöblierung	20 Tage	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27	472
474		**Abnahmen / Endreinigung**	**26 Tage**	**Fre 16.07.27**	**Fre 20.08.27**	
475		Grobreinigung	3 Tage	Fre 16.07.27	Die 20.07.27	442;447;452;431;
476		Sachverständigenprüfung BMA + Sicherheitsbeleuchtung	2 Tage	Mit 21.07.27	Don 22.07.27	475;464
477		Abnahme Lüftung (Dekra)	2 Tage	Mit 21.07.27	Don 22.07.27	457;475
478		Abnahme Brandschutzsprüfer	2 Tage	Mit 21.07.27	Don 22.07.27	475;464
479		Endabnahmen Firmen	5 Tage	Fre 23.07.27	Don 29.07.27	478
480		Mangelbeseitigung	10 Tage	Fre 30.07.27	Don 12.08.27	479
481		Endreinigung	5 Tage	Fre 13.08.27	Don 19.08.27	480
482		Abnahme Kreis Schleswig-Flensburg	0 Tage	Don 19.08.27	Don 19.08.27	481
483		**Übergabe**	**1 Tag**	**Fre 20.08.27**	**Fre 20.08.27**	**482**
484		**Einrichtung**	**15 Tage**	**Mon 23.08.27**	**Fre 10.09.27**	
485		Textilien	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	483
486		Möblierung, lose	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	483
487		Sichtschutz / Beklebungen / Schilder	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	483
488		Schließanlage	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27	483
489		**EINZUG**	0 Tage	Fre 10.09.27	Fre 10.09.27	484;473
