Nr.	% Abges.	Vorgangsm.	Drucker	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	0%		Ja	MS Projekt GI Beleuchtung Elbtunnel				
2	0%		Ja	Sperrung Röhre 1	70 Tage	Don 04.03.27	Mit 09.06.27	
3	0%		Ja	Sperrung Röhre 2	70 Tage	Don 10.06.27	Mit 15.09.27	2
4	0%		Ja	Sperrung Röhre 3	70 Tage	Mit 02.02.28	Die 09.05.28	3EA+99 Tage
5	0%		Ja	Sperrung Röhre 4	70 Tage	Don 01.06.28	Mit 06.09.28	
6	0%		Ja	MS Projekt Deckel Altona				
7	0%		Ja	Veschwenken Fahrbahn Ost in Tunnelröhre West	1 Tag	Mon 03.05.27	Mon 03.05.27	
8	0%		Ja	Projekt Erneuerung / Sanierung LHM				
31	**0%**		Ja	**Werksplanung**	**35 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Don 17.09.26**	**30**
32	**0%**		Ja	**Mast + Fundament**	**30 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 11.09.26**	
33	0%		Ja	Erstellung Werkplanung und Statik	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	30EA+5 Tage
34	0%		Ja	Prüflauf und Freigabe	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	33
35	**0%**		Ja	**Schaltschrank**	**20 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Don 17.09.26**	
36	0%		Ja	Erstellung Werkplanung	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	30EA+20 Tage
37	0%		Ja	Prüflauf und Freigabe	5 Tage	Sam 12.09.26	Don 17.09.26	36
38	**0%**		Ja	**Materialisierung**	**426 Tage**	**Fre 16.05.25**	**Don 31.12.26**	
39	0%		Ja	Trassenkabel	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	30EA+10 Tage
40	0%		Ja	Fundamente	20 Tage	Sam 12.09.26	Don 08.10.26	34
41	0%		Ja	Lichthochmaste + Traverse	80 Tage	Sam 12.09.26	Don 31.12.26	34
42	0%		Ja	Schaltschränke	40 Tage	Fre 18.09.26	Don 12.11.26	37
43	0%		Ja	Leuchten	5 Tage	Fre 16.05.25	Don 22.05.25	18
44	**28%**		**Nein**	**Bauausführung**	**826 Tage?**	**Die 01.07.25**	**Mon 28.08.28**	
67	**0%**		Ja	**Masterneuerung und Sanierung**	**494 Tage**	**Don 01.10.26**	**Die 22.08.28**	
68	**0%**		Ja	**Bauabschnitt 1**	**163 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mon 17.05.27**	
69	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast N6**	**66 Tage**	**Fre 09.10.26**	**Fre 08.01.27**	
70	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Fre 09.10.26	Mon 26.10.26	40
71	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Fre 01.01.27	Mon 04.01.27	41;70;76
72	0%		Ja	Montage Schaltschrank N6	1 Tag	Don 07.01.27	Don 07.01.27	71;77
73	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme N6	1 Tag	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27	72
74	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S6**	**163 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mon 17.05.27**	
75	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	70
76	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Die 10.11.26	Mit 25.11.26	75;40
77	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Die 05.01.27	Mit 06.01.27	71
78	0%		Ja	Montage Schaltschrank S6	1 Tag	Don 07.01.27	Don 07.01.27	77;71
79	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S6	1 Tag	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27	73
80	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast N3**	**163 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mon 17.05.27**	
81	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	20 Tage	Don 01.10.26	Mit 28.10.26	
82	0%		Ja	Demontage Mast	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	108
83	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Don 13.05.27	Fre 14.05.27	109
84	0%		Ja	Montage Schaltschrank N3	1 Tag	Don 13.05.27	Don 13.05.27	110
85	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme N3	1 Tag	Mon 17.05.27	Mon 17.05.27	84;83
86	**0%**		Ja	**Bauabschnitt 2 - Sperrung Röhre 1**	**141 Tage**	**Don 29.10.26**	**Don 13.05.27**	
87	**0%**		Ja	**Sanierung Mast N1**	**15 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 19.03.27**	
88	0%		Ja	Demontage Traverse	1 Tag	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27	29EA+30 Tage
89	0%		Ja	Korrosionschutz Mast	3 Tage	Die 02.03.27	Don 04.03.27	88
90	0%		Ja	Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung	10 Tage	Die 02.03.27	Mon 15.03.27	88
91	0%		Ja	Montage Traverse	2 Tage	Die 16.03.27	Mit 17.03.27	90
92	0%		Ja	Montage Schaltschrank N1	1 Tag	Don 18.03.27	Don 18.03.27	91
93	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme N1	1 Tag	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27	91;92
94	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S1**	**137 Tage**	**Don 29.10.26**	**Fre 07.05.27**	
95	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament	10 Tage	Don 04.03.27	Mit 17.03.27	2AA
96	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Don 18.03.27	Fre 02.04.27	95
97	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Mit 05.05.27	Don 06.05.27	102
98	0%		Ja	Montage Schaltschrank S1	1 Tag	Don 29.10.26	Don 29.10.26	81
99	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S1	1 Tag	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27	98;97
100	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S3**	**27 Tage**	**Mon 05.04.27**	**Die 11.05.27**	
101	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	96
102	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Mon 19.04.27	Die 04.05.27	101
103	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Fre 07.05.27	Mon 10.05.27	97
104	0%		Ja	Montage Schaltschrank S3	1 Tag	Mon 10.05.27	Mon 10.05.27	99
105	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S3	1 Tag	Die 11.05.27	Die 11.05.27	104;103
106	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S5**	**51 Tage**	**Don 04.03.27**	**Don 13.05.27**	
107	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament	10 Tage	Don 04.03.27	Mit 17.03.27	2AA
108	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Don 18.03.27	Fre 02.04.27	107
109	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Die 11.05.27	Mit 12.05.27	103
110	0%		Ja	Montage Schaltschrank S5	1 Tag	Mit 12.05.27	Mit 12.05.27	105
111	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S5	1 Tag	Don 13.05.27	Don 13.05.27	110;109
112	**0%**		Ja	**Bauabschnitt 3 - Sperrung Röhre 4**	**52 Tage**	**Don 01.06.28**	**Fre 11.08.28**	
113	**0%**		Ja	**Mast S4A**	**14 Tage**	**Don 01.06.28**	**Die 20.06.28**	
114	0%		Ja	Demontage Traverse	1 Tag	Don 01.06.28	Don 01.06.28	5AA
115	0%		Ja	Demontage Schaltschrank	1 Tag	Fre 02.06.28	Fre 02.06.28	114
116	0%		Ja	Korrosionschutz Mast	3 Tage	Mon 05.06.28	Mit 07.06.28	115
117	0%		Ja	Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung	9 Tage	Fre 02.06.28	Mit 14.06.28	114
118	0%		Ja	Montage Traverse	2 Tage	Don 15.06.28	Fre 16.06.28	117
119	0%		Ja	Montage Schaltschrank	1 Tag	Mon 19.06.28	Mon 19.06.28	118
120	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S4A	1 Tag	Die 20.06.28	Die 20.06.28	119
121	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S2**	**52 Tage**	**Don 01.06.28**	**Fre 11.08.28**	
122	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament / Sicherung Bestandskabel	10 Tage	Don 01.06.28	Mit 14.06.28	74
123	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Don 29.06.28	Fre 14.07.28	128
124	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Mit 02.08.28	Don 03.08.28	129
125	0%		Ja	Montage Schaltschrank S2	1 Tag	Die 08.08.28	Die 08.08.28	130
126	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S2	1 Tag	Don 10.08.28	Don 10.08.28	131
127	**0%**		Ja	**Erneuerung Mast S4**	**42 Tage**	**Don 15.06.28**	**Fre 11.08.28**	
128	0%		Ja	Demontage Mast / Ausbau Altfundament	10 Tage	Don 15.06.28	Mit 28.06.28	122
129	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Mon 17.07.28	Die 01.08.28	123
130	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Fre 04.08.28	Mon 07.08.28	124
131	0%		Ja	Montage Schaltschrank S4	1 Tag	Mit 09.08.28	Mit 09.08.28	125
132	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme S4	1 Tag	Fre 11.08.28	Fre 11.08.28	126
133	**0%**		Ja	**Mast N2**	**31 Tage**	**Die 20.06.28**	**Die 01.08.28**	
134	0%		Ja	Demontage Traverse	1 Tag	Die 20.06.28	Die 20.06.28	119
135	0%		Ja	Demontage Schaltschrank N2 / Herstellung Provi	1 Tag	Don 22.06.28	Don 22.06.28	142
136	0%		Ja	Korrosionsschutz Mast	3 Tage	Mon 26.06.28	Mit 28.06.28	143
137	0%		Ja	Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28	143
138	0%		Ja	Montage Traverse - Anschluss an Provi	2 Tage	Mon 24.07.28	Die 25.07.28	145
139	0%		Ja	Montage Schaltschrank N2	1 Tag	Fre 28.07.28	Fre 28.07.28	146
140	0%		Ja	Umklemmen und Inbetriebnahme N2	1 Tag	Die 01.08.28	Die 01.08.28	147
141	**0%**		Ja	**Mast N4**	**31 Tage**	**Mit 21.06.28**	**Mit 02.08.28**	
142	0%		Ja	Demontage Traverse	1 Tag	Mit 21.06.28	Mit 21.06.28	134
143	0%		Ja	Demontage Schaltschrank N4 / Herstellung Provi	1 Tag	Fre 23.06.28	Fre 23.06.28	135
144	0%		Ja	Korrosionsschutz Mast	3 Tage	Don 29.06.28	Mon 03.07.28	136
145	0%		Ja	Korrosionsschutz Traverse / Bestückung Beleuchtung	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28	137
146	0%		Ja	Montage Traverse - Anschluss an Provi	2 Tage	Mit 26.07.28	Don 27.07.28	138
147	0%		Ja	Montage Schaltschrank N4	1 Tag	Mon 31.07.28	Mon 31.07.28	139
148	0%		Ja	Umklemmen und Inbetriebnahme N2	1 Tag	Mit 02.08.28	Mit 02.08.28	140
149	**0%**		Ja	**Bauabschnitt 4 - Verschwenkung TunnelAltona Ost nach West**	**16 Tage**	**Die 01.08.28**	**Die 22.08.28**	
150	**0%**		Ja	**Mast N5**	**16 Tage**	**Die 01.08.28**	**Die 22.08.28**	
151	0%		Ja	Erdbau und Erstellung Fundament inkl. Abbindezeit	12 Tage	Die 01.08.28	Mit 16.08.28	7;147
152	0%		Ja	Montage Mast und Traverse	2 Tage	Don 17.08.28	Fre 18.08.28	151
153	0%		Ja	Montage Schaltschrank N5	1 Tag	Mon 21.08.28	Mon 21.08.28	152
154	0%		Ja	Anschluss und Inbetriebnahme N5	1 Tag	Die 22.08.28	Die 22.08.28	153
155	0%		Ja	Nachjustierung Leuchten nach Leuchtmessung LHM Süd	5 Tage	Mon 14.08.28	Fre 18.08.28	126;132;105;99;1
156	0%		Ja	Nachjustierung Leuchten nach Leuchtmessung LHM Nord	5 Tage	Die 22.08.28	Mon 28.08.28	153
157	0%		Ja	Erstellung Bestandsunterlagen und Dokumentation	40 Tage	Die 29.08.28	Mon 23.10.28	155;156
158	0%		Ja	Abnahme Gesamtleistung	1 Tag	Die 24.10.28	Die 24.10.28	157

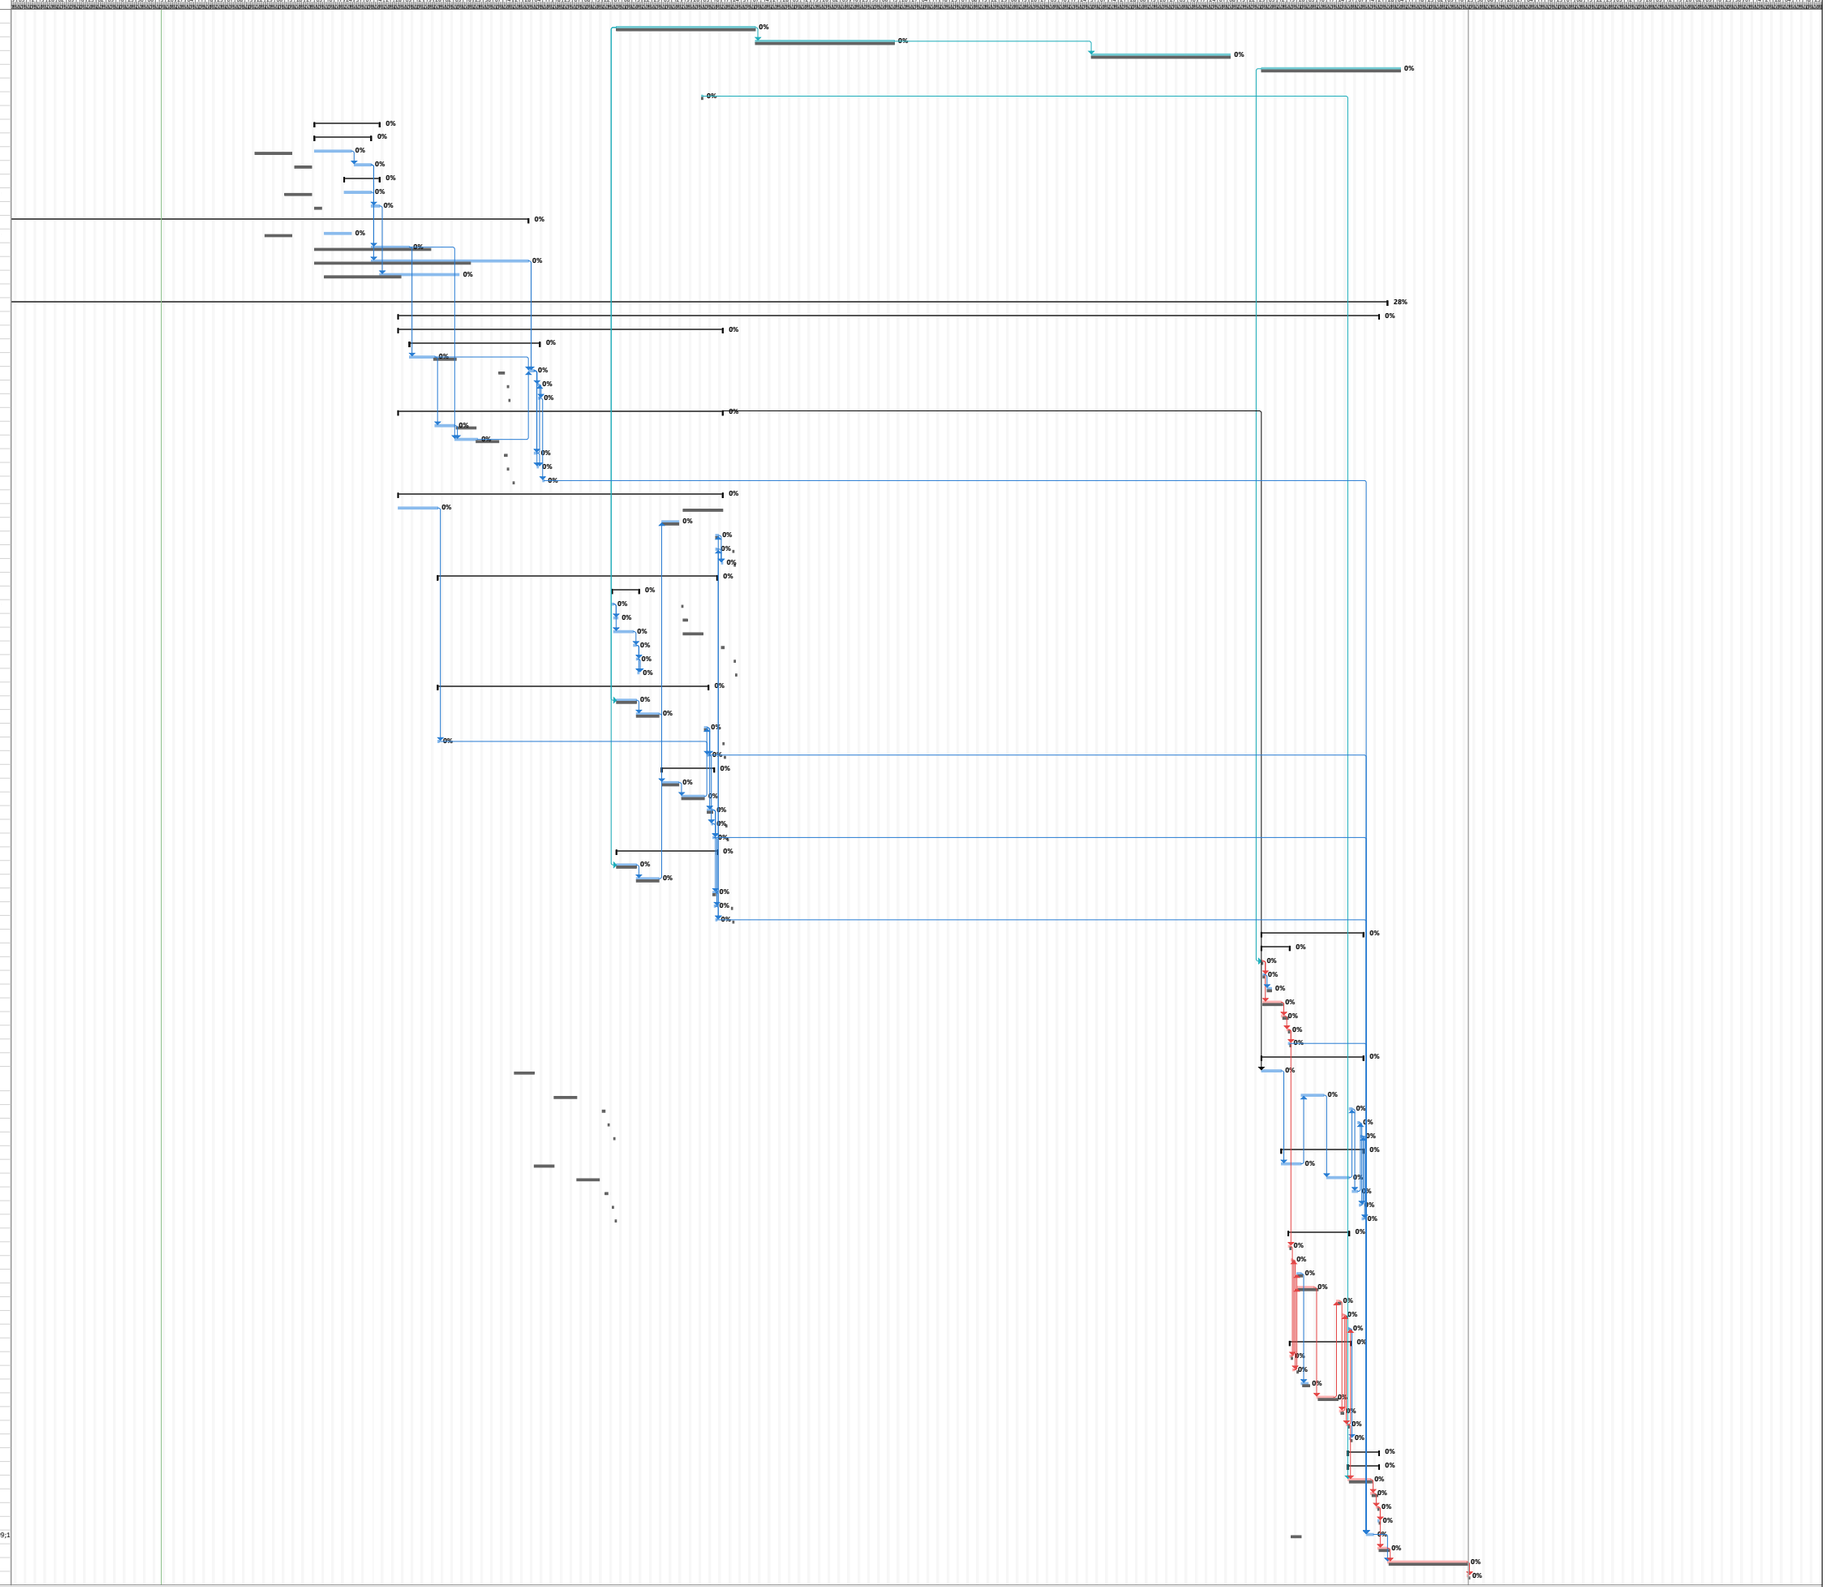

Kritisch | Kritisch in Arbeit | Unterbrechung | Manueller Vorgang | Nur Ende | Geplant | Geplanter Meilenstein | Sammelvorgang in Arbeit | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang
Kritische Unterbrechung | Vorgang | Vorgang in Arbeit | Nur Anfang | Nur Dauer | Geplante Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Stichtag
