Erneuerung und Sanierung Hauptsammler Ost Wiesbaden

Nr.		Vc	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	BA 1	BA 2	BA 3	Übergeordnet
1			Veröffentlichung	0 Tage	Don 17.09.26	Don 17.09.26		2	Nein	Nein	Nein	Nein
2			Einholen der Angebote	4 Wochen	Don 17.09.26	Mit 14.10.26	1		Nein	Nein	Nein	Nein
3			Submission	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26		4	Nein	Nein	Nein	Nein
4			Vergabevorschlag	21 Tage	Fre 16.10.26	Fre 13.11.26	3	5	Nein	Nein	Nein	Nein
5			Vergabe	21 Tage	Mon 16.11.26	Mon 14.12.26	4	6	Nein	Nein	Nein	Nein
6			Rüstzeit	14 Tage	Die 15.12.26	Fre 01.01.27	5		Nein	Nein	Nein	Nein
7			Aufstellung Eidechsenzaun und Monitoring bis Baubeginn	206 Tage	Mon 02.03.26	Mon 14.12.26			Nein	Nein	Nein	Nein
8			**Bauausführung 2027 / 2028**	**509 Tage?**	**Fre 22.01.27**	**Die 02.01.29**			**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
9			Vorarbeiten restliche Rodungsarbeiten	14 Tage	Fre 22.01.27	Mit 10.02.27			Nein	Nein	Nein	Nein
10			Baustelleneinrichtung	30 Tage	Fre 22.01.27	Don 04.03.27		11;12	Nein	Nein	Nein	Nein
11			Baustraße Ost / Hundeschule	30 Tage	Fre 05.03.27	Don 15.04.27	10		Nein	Nein	Nein	Nein
12			BE Gleisbau	14 Tage	Fre 05.03.27	Mit 24.03.27	10	13;14	Nein	Nein	Nein	Nein
13			Rückbau der Altgleise West	8 Tage	Don 25.03.27	Mon 05.04.27	12	15	Nein	Nein	Nein	Nein
14			Rückbau Altgleise Ost	14 Tage	Don 25.03.27	Die 13.04.27	12	25	Nein	Nein	Nein	Nein
15			Erdbau Baustraße West / Wendeplatz	35 Tage	Die 06.04.27	Mon 24.05.27	13	16	Nein	Nein	Nein	Nein
16			Verbau (Drehbohrgerät) Startgrube 44927 und 44934	25 Tage	Die 25.05.27	Mon 28.06.27	15	17	Nein	Nein	Nein	Nein
17			Aushub der Startbaugrube 44927	14 Tage	Die 29.06.27	Fre 16.07.27	16	18	Nein	Nein	Nein	Nein
18			Herstellung Widerlager und Einrichtung Vortrieb	25 Tage	Mon 19.07.27	Fre 20.08.27	17	19	Nein	Nein	Nein	Nein
19			Vortrieb Gleisparallele 352 m, 24 h, 3 m/Tag Mit Kampfmittelsondierung	90 Tage	Mon 23.08.27	Fre 24.12.27	18	23	Nein	Nein	Nein	Nein
20			Verdämmung Altkanal vor der Zielgrube West	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	26	21	Nein	Nein	Nein	Nein
21			Verbau Baugrube Zielgrube West 42225, Rollkontor 10763	30 Tage	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27	20	22	Nein	Nein	Nein	Nein
22			Aushub der Zielbaugrube 42225 und 10763	14 Tage	Mon 19.07.27	Don 05.08.27	21	24	Nein	Nein	Nein	Nein
23			Schacht 44225 Ortbeton	14 Tage	Mon 27.12.27	Don 13.01.28	19		Nein	Nein	Nein	Nein
24			Kanalbau im Stollen am Rollkontor	70 Tage	Fre 06.08.27	Don 11.11.27	22	33	Nein	Nein	Nein	Nein
25			Gleisbau: Ausbau Gleis 21 und 91 und Einbau des Oberleitungstrenners	15 Tage	Mit 14.04.27	Die 04.05.27	14	27;26	Nein	Nein	Nein	Nein
26			Aufbau Wasserhaltung BA-Nord	13 Tage	Mit 05.05.27	Fre 21.05.27	25	20	Nein	Nein	Nein	Nein
27			Verbau Drehbohrgeräte 44930, 44932, 44933, 3846, 3848	60 Tage	Mit 05.05.27	Die 27.07.27	25	28;29;30;3	Nein	Nein	Nein	Nein
28			Aushub der Baugruben Ost 44930, 44932, 44933, 3846, 3848	30 Tage	Mit 28.07.27	Die 07.09.27	27		Nein	Nein	Nein	Nein
29			GFK Sanierung Ost RÜ 27-44930	70 Tage	Mit 28.07.27	Die 02.11.27	27		Nein	Nein	Nein	Nein
30			GFK Sanierung Querung Süd	30 Tage	Mit 28.07.27	Die 07.09.27	27		Nein	Nein	Nein	Nein
31			GFK Sanierung Querung Nord und RÜ 25	40 Tage	Mit 28.07.27	Die 21.09.27	27	32	Nein	Nein	Nein	Nein
32			Schächte Ost 44930, 44932, 44933, 3846, 3848 Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend	60 Tage	Mit 22.09.27	Die 14.12.27	31	35	Nein	Nein	Nein	Nein
33			Schacht 10763 Ortbeton mit Oberflächenwiederherstellung	21 Tage	Fre 12.11.27	Fre 10.12.27	24	34	Nein	Nein	Nein	Nein
34			Umbau der Wasserhaltung auf BA-Süd, Abbau der Wasserhaltung BA-Nord	9 Tage	Mon 13.12.27	Don 23.12.27	33		Nein	Nein	Nein	Nein
35			Wiederherstellung der Oberflächen Schächte 44930, 44932, 44933, 3846, 3848	40 Tage	Mit 15.12.27	Die 08.02.28	32	36	Nein	Nein	Nein	Nein
36			Gleisbau Wiederherstellung Gleis 21 und 91	14 Tage	Mit 09.02.28	Mon 28.02.28	35		Nein	Nein	Nein	Nein
37			**Bauausführungen Sperrung Biebrich 12.12.27-11.08.2028**	**176 Tage**	**Mon 13.12.27**	**Fre 11.08.28**			**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
38			BE Gleisbau	5 Tage	Mon 13.12.27	Fre 17.12.27		39	Nein	Nein	Nein	Nein
39			Verschwenkung Oberleitung Gleis 310 Zielgrube 44928 und 44929	8 Tage	Mon 20.12.27	Mit 29.12.27	38	40	Nein	Nein	Nein	Nein
40			Rückbau Gleis 310 Schacht 44928 44929	8 Tage	Don 30.12.27	Mon 10.01.28	39	41;48	Nein	Nein	Nein	Nein
41			Verbau Baugruben Ost Schächte 44928 + 44929	50 Tage	Die 11.01.28	Mon 20.03.28	40	42EA-10 Tage	Nein	Nein	Nein	Nein
42			Aushub der Zielgrube Ost 44928 + 44929	21 Tage	Die 07.03.28	Mon 03.04.28	41EA-10 Tage	43EA-7 Tage;45	Nein	Nein	Nein	Nein
43			Vortrieb Gleisquerung 132 m, 24 h, 3 m/Tag Mit Kampfmittelsondierung	40 Tage	Mon 27.03.28	Don 18.05.28	42EA-7 Tage	44;53	Nein	Nein	Nein	Nein
44			Schacht 44927 Ortbeton mit Fertigteilen	22 Tage	Fre 19.05.28	Mon 19.06.28	43	114	Nein	Nein	Nein	Nein
45			GFK-Sanierung Ost BA-Süd zwischen 44930 und 44928	40 Tage	Die 04.04.28	Mon 29.05.28	42	46	Nein	Nein	Nein	Nein
46			Schächte 44928,44929, Ortbeton pro Schacht 14 Tage überlappend	25 Tage	Die 30.05.28	Mon 03.07.28	45	47;52	Nein	Nein	Nein	Nein
47			Schächte Ost 44928, 44929 Wiederherstellung der Oberflächen	14 Tage	Die 04.07.28	Fre 21.07.28	46	50;59	Nein	Nein	Nein	Nein
48			Verdämmung Altschächte und Kanalgleisquerung	22 Tage	Die 11.01.28	Mit 09.02.28	40	49	Nein	Nein	Nein	Nein
49			Rückbau Einstiege Altschächte nach der Verdämmung	20 Tage	Don 10.02.28	Mit 08.03.28	48		Nein	Nein	Nein	Nein
50			Gleisbau Wiederherstellung Gleis 310 und der Oberleitung	14 Tage	Mon 24.07.28	Don 10.08.28	47		Nein	Nein	Nein	Nein
51			**Bauarbeiten nach Sperrpause**	**243 Tage**	**Mon 03.07.28**	**Mit 06.06.29**			**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
52			Abbau Wasserhaltung und Umschluss	21 Tage	Die 04.07.28	Die 01.08.28	46		Nein	Nein	Nein	Nein
53			Schacht 44934 mit Aushub	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28	43	55;54	Nein	Nein	Nein	Nein
54			Ausbau Wirbeljets im HS West	13 Tage	Mon 28.08.28	Mit 13.09.28	53		Nein	Nein	Nein	Nein
55			Schacht 44934 Ortbeton und Fertigteilen	14 Tage	Mon 28.08.28	Don 14.09.28	53	56	Nein	Nein	Nein	Nein
56			Stützwand an der Startgrube	40 Tage	Fre 15.09.28	Don 09.11.28	55	57	Nein	Nein	Nein	Nein
57			Auffüllung und Fertigstellung der Schächte 44927 und 444934	30 Tage	Fre 10.11.28	Don 21.12.28	56	58;60	Nein	Nein	Nein	Nein
58			Herstellung Betriebsstraße West	22 Tage	Fre 22.12.28	Mon 22.01.29	57		Nein	Nein	Nein	Nein
59			Herstellung Betriebsstraße Ost	22 Tage	Mon 24.07.28	Die 22.08.28	47		Nein	Nein	Nein	Nein
60			Gleisbau Wiederherstellung Gleis 199 und Aartalbahn	40 Tage	Fre 22.12.28	Don 15.02.29	57	61	Nein	Nein	Nein	Nein
61			Rückbau der Lagerflächen	20 Tage	Fre 16.02.29	Don 15.03.29	60	62	Nein	Nein	Nein	Nein
62			Wiederherstellung der Straßenflächen am Rollkontor	14 Tage	Fre 16.03.29	Mit 04.04.29	61	63	Nein	Nein	Nein	Nein
63			Rückbau der BE Flächen und Absperrungen	14 Tage	Don 05.04.29	Die 24.04.29	62	64	Nein	Nein	Nein	Nein
64			Restarbeiten	30 Tage	Mit 25.04.29	Die 05.06.29	63		Nein	Nein	Nein	Nein
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114			Verfüllung Startgrube	12 Tage	Mon 03.07.28	Die 18.07.28	44		Nein	Nein	Nein	Nein

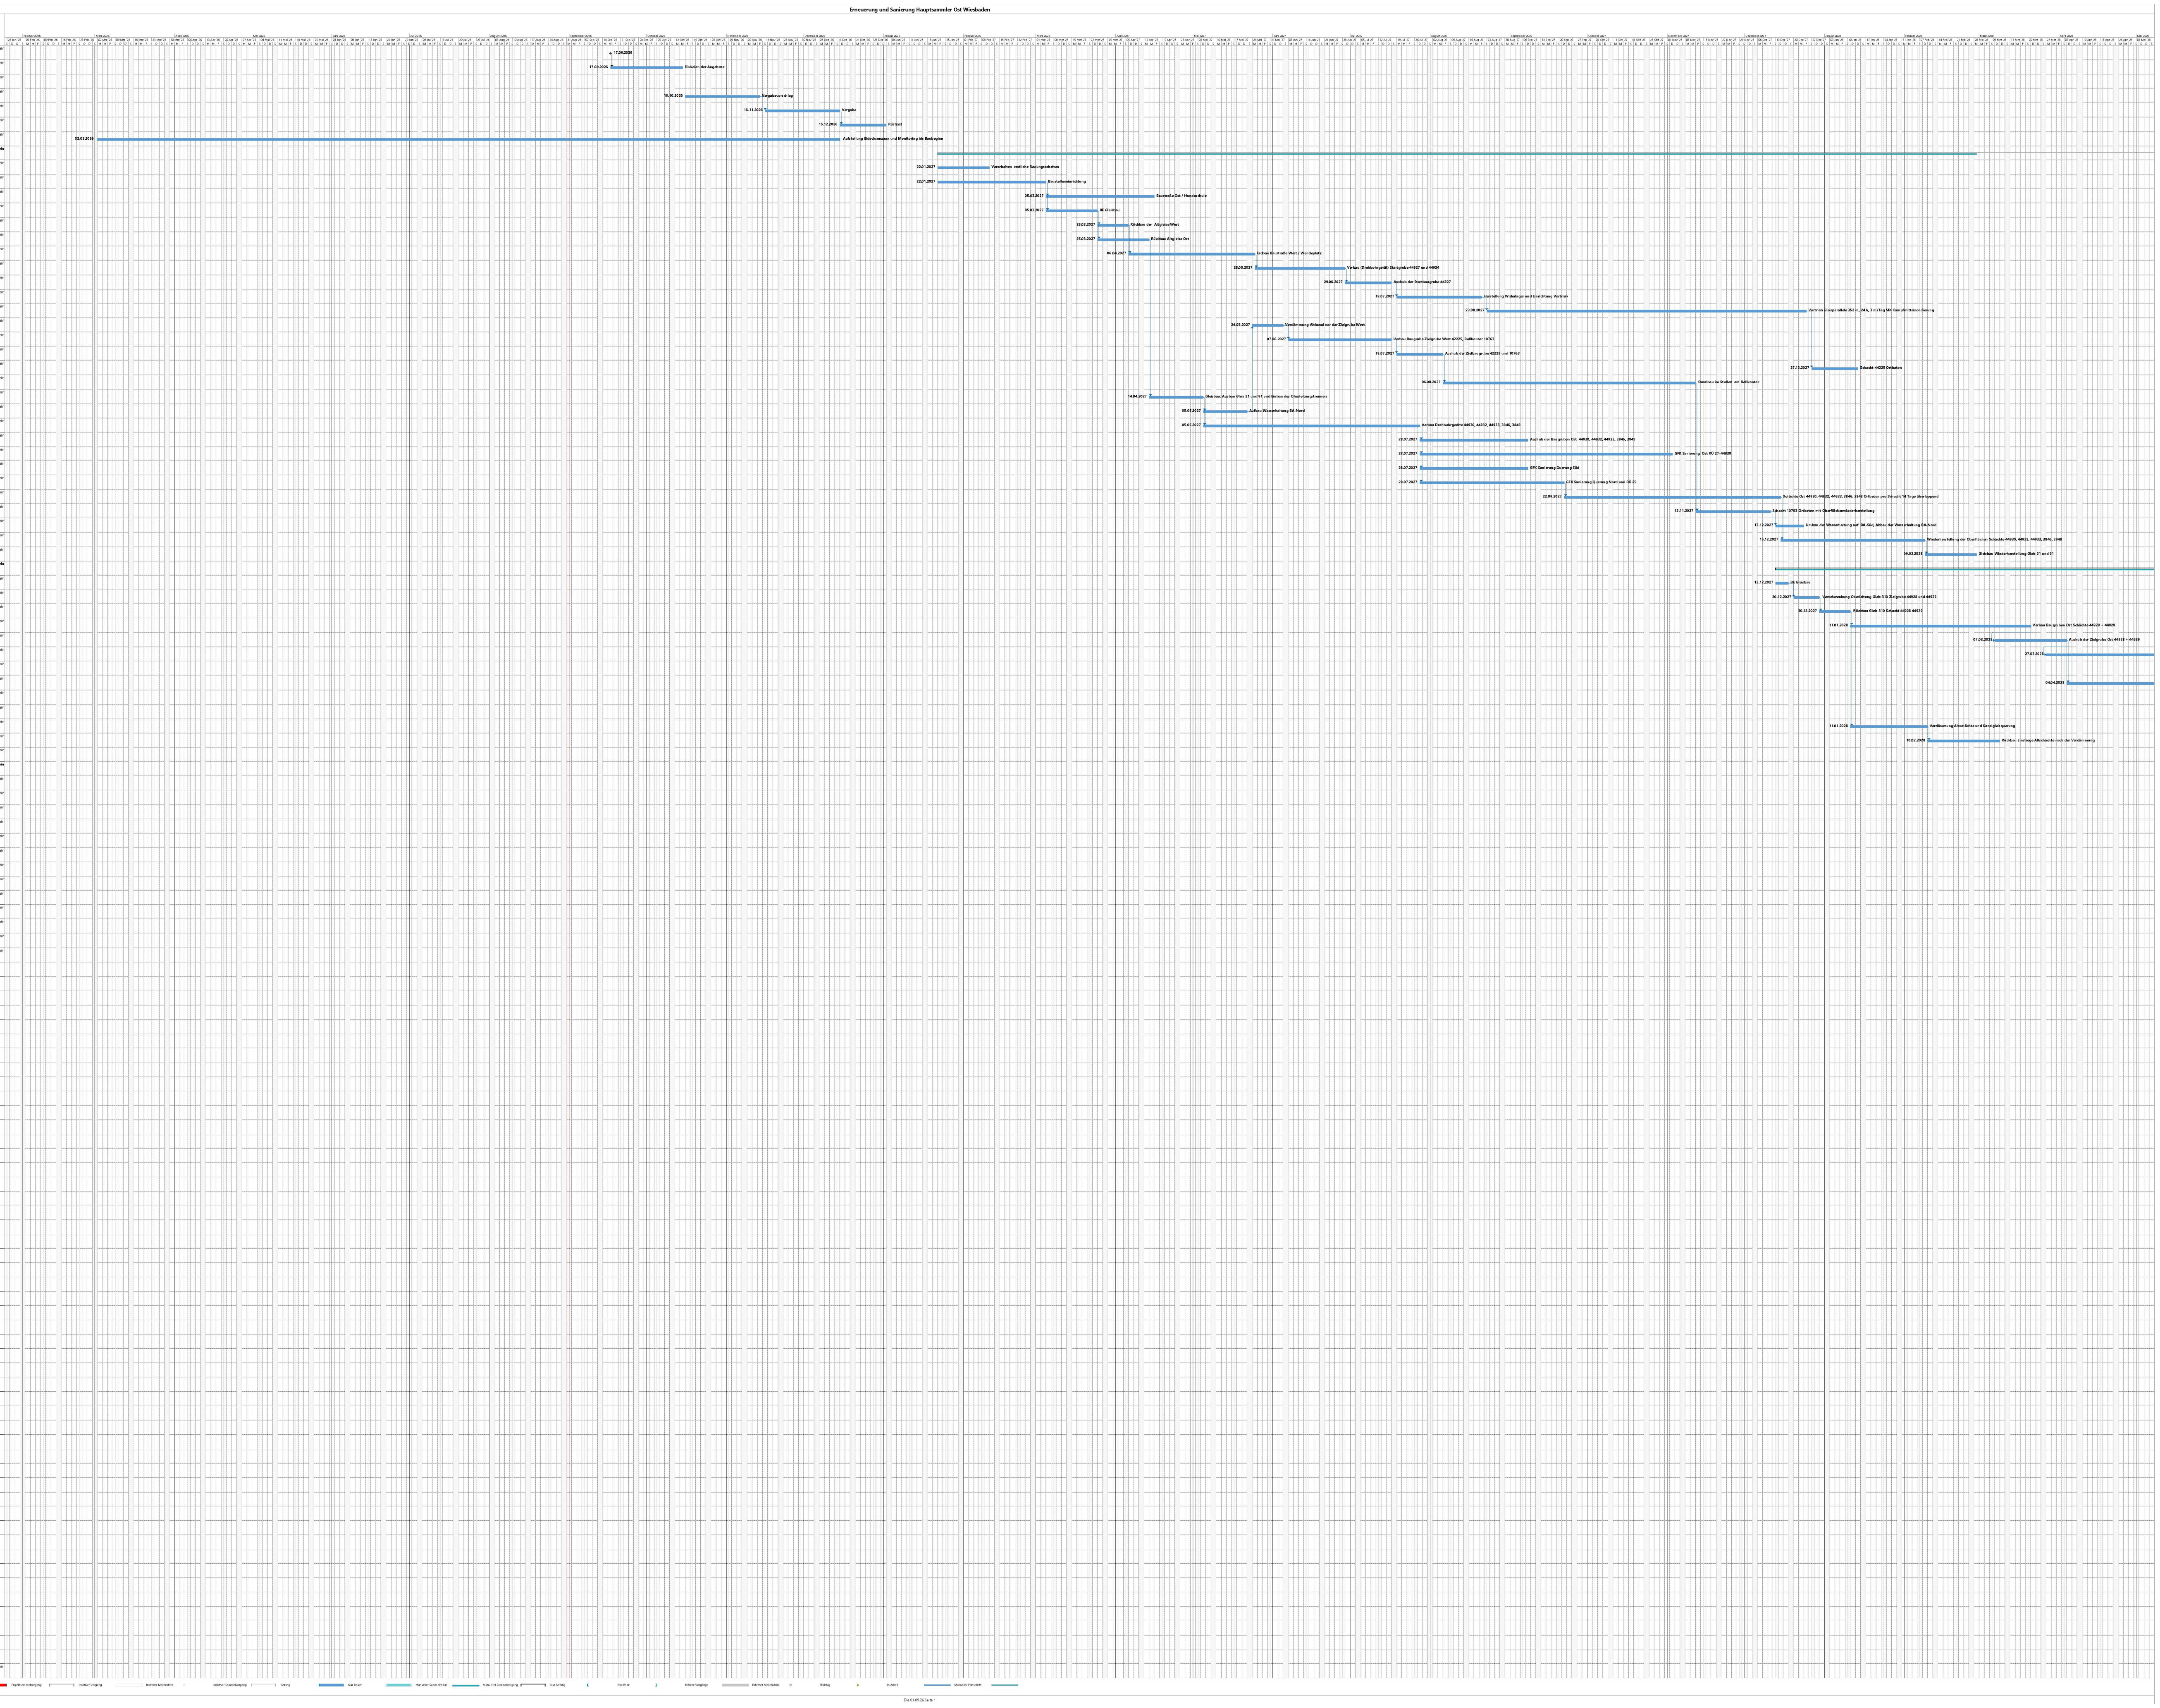

Projekt: 20260825-Bauzeiten-A
Datum: Die 01.09.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein ◆ | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Anfang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
