
Bauzeitenplan

Amtsgebäude Mittelangeln – Bauzeitenplan

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
11	**Baustelleneinrichtung / Erdarbeiten**	**41at**	**Mo, 01.03.27**	**Mi, 28.04.27**
11.1	Baustelleneinrichtung, Bauzaun, Baustraße, Kran	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
11.2	Oberboden abtragen, seitlich lagern (ca. 400 m³)	3at	Mi, 03.03.27	Fr, 05.03.27
11.3	Probeschürfungen, Erkundung	2at	Mo, 08.03.27	Di, 09.03.27
11.4	Verbau Trägerbohlwand Teil-KG (ca. 195 m²)	8at	Mi, 10.03.27	Fr, 19.03.27
11.5	Baugrube ausheben, laden, entsorgen inkl. Z2 (ca. 3.400 m³)	10at	Di, 16.03.27	Mi, 31.03.27
11.6	Offene Wasserhaltung, Pumpensumpf	30at	Di, 16.03.27	Mi, 28.04.27
11.7	Aushub Fundamente in Brechgut, Gründungsebene EG	5at	Do, 01.04.27	Mi, 07.04.27
11.8	Schlechtwetterpuffer Erdarbeiten/Gründung	5at	Do, 08.04.27	Mi, 14.04.27
12	**Rohbau Teil-KG (Archiv/Technik)**	**36at**	**Do, 01.04.27**	**Mo, 24.05.27**
12.1	Grundleitungen KG, Pumpensumpf	4at	Do, 01.04.27	Di, 06.04.27
12.2	Fundamenterder KG (Blitzschutz)	2at	Mo, 05.04.27	Di, 06.04.27
12.3	Sauberkeitsschicht, WU-Sohle KG inkl. Aufzugsunterfahrt	6at	Mi, 07.04.27	Mi, 14.04.27
12.4	WU-Wände KG, Ortbeton d=25 cm (ca. 170 m²)	10at	Do, 15.04.27	Mi, 28.04.27
12.5	Decke über KG, Ortbeton	8at	Do, 29.04.27	Di, 11.05.27
12.6	Abdichtung, Perimeterdämmung, Noppenfolie KG-Außenwand	5at	Fr, 07.05.27	Do, 13.05.27
12.7	Verfüllung Arbeitsräume, Rückbau Verbau	6at	Fr, 14.05.27	Mo, 24.05.27
13	**Rohbau EG**	**56at**	**Do, 15.04.27**	**Mo, 05.07.27**
13.1	Grundleitungen EG	6at	Do, 15.04.27	Do, 22.04.27
13.2	Fundamenterder EG (Blitzschutz)	3at	Fr, 16.04.27	Di, 20.04.27
13.3	Streifenfundamente, Sauberkeitsschicht (ca. 71 m³)	10at	Di, 20.04.27	Mo, 03.05.27
13.4	Bitumendickbeschichtung, Perimeterdämmung Fundamente/Sockel	5at	Di, 04.05.27	Di, 11.05.27
13.5	Verfüllen, Nachverdichtung, Feinplanum Sandpolster	4at	Mi, 12.05.27	Di, 18.05.27
13.6	Dränage, Entwässerungsrinnen Gründung	5at	Mi, 12.05.27	Mi, 19.05.27
13.7	XPS-Dämmung, Bodenplatte EG d=25 cm (ca. 505 m²)	10at	Mi, 19.05.27	Di, 01.06.27
13.8	Montage Stahlstützen EG (innen/außen)	3at	Mi, 02.06.27	Fr, 04.06.27
13.9	Stb.-Wände EG inkl. Treppenhauskerne/Aufzugsschacht, Sichtbeton	12at	Mi, 02.06.27	Do, 17.06.27
13.10	KS-Mauerwerk EG	6at	Di, 08.06.27	Di, 15.06.27
13.11	Treppenläufe/Podeste KG–EG–1.OG (2 Treppenhäuser)	4at	Fr, 18.06.27	Mi, 23.06.27
13.12	Decke über EG inkl. Unterzüge	12at	Fr, 18.06.27	Mo, 05.07.27
14	**Rohbau 1.OG**	**22at**	**Fr, 09.07.27**	**Mo, 09.08.27**
14.1	Stb.-Wände 1.OG inkl. Treppenhauskerne/Aufzugsschacht	10at	Fr, 09.07.27	Do, 22.07.27
14.2	KS-Mauerwerk 1.OG	5at	Do, 15.07.27	Mi, 21.07.27
14.3	Treppenläufe/Podeste 1.OG–2.OG	4at	Fr, 23.07.27	Mi, 28.07.27
14.4	Decke über 1.OG inkl. Unterzüge	12at	Fr, 23.07.27	Mo, 09.08.27
15	**Rohbau 2.OG / Dachgeschoss**	**43at**	**Fr, 13.08.27**	**Di, 12.10.27**
15.1	Drempel, Brüstungen, Stb.-Wände Treppenhäuser/Aufzug 2.OG	10at	Fr, 13.08.27	Do, 26.08.27
15.2	KS-Mauerwerk 2.OG	4at	Do, 19.08.27	Di, 24.08.27
15.3	Giebelwände bis Spitzboden, Ringbalken Giebel	8at	Fr, 27.08.27	Di, 07.09.27
15.4	Betonfensterbänke mit Stahlkonsole EG–2.OG	4at	Mi, 08.09.27	Mo, 13.09.27
15.5	Ausschalen, Rückstützen, Restarbeiten Rohbau	5at	Mi, 08.09.27	Di, 14.09.27
15.6	Schlechtwetterpuffer Rohbau	5at	Mi, 15.09.27	Di, 21.09.27
15.7	Rohbau Müll-/Fahrradlager (Gründung, Sohle, Wände, Dachdecke)	20at	Mi, 15.09.27	Di, 12.10.27

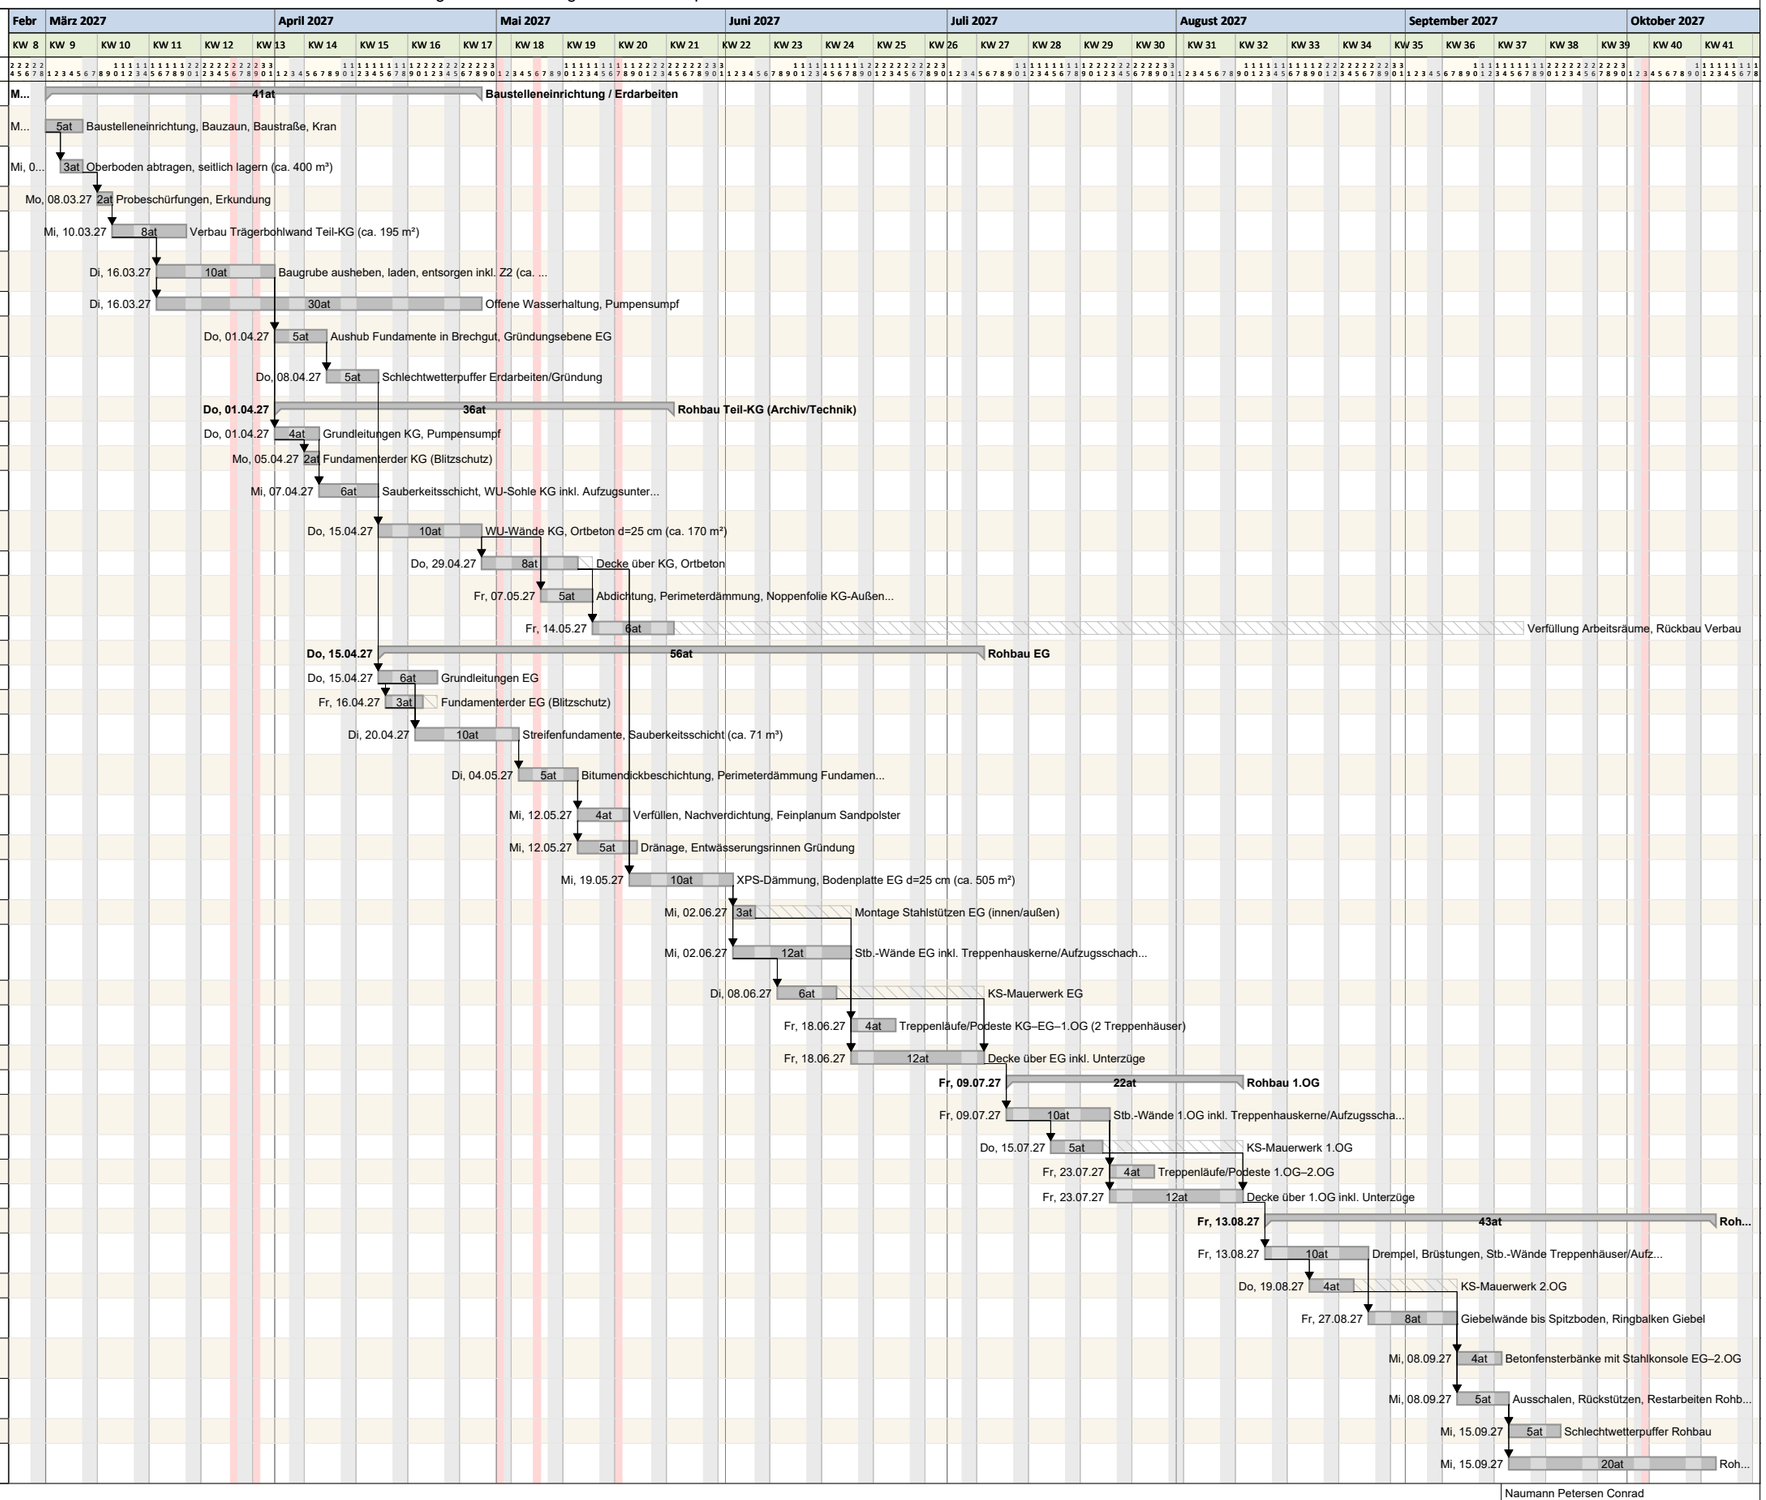

Projektzeitrahmen von Fr, 15.05.26 bis Mo, 30.07.29
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 13.11.2026 09:50
Filter: Nur markierte Zeilen anzeigen

Naumann Petersen Conrad
Architekten und Ingenieure in Partnerschaft mbB
Konsul-Smidt-Str. 8f
Bremen
Tel. +49 421 222298-0
Fax. +49 421 222298-11
e-Mail: info@npc-bremen.de

erstellt mit pro Plan 2025 [pro Plan 2025] Seiten Nr. PP25-AAFWD5K4kk4 Lizenz FÜR N P C Naumann Petersen Conrad Architekten, Bremen
