
BAUSTUFE 2

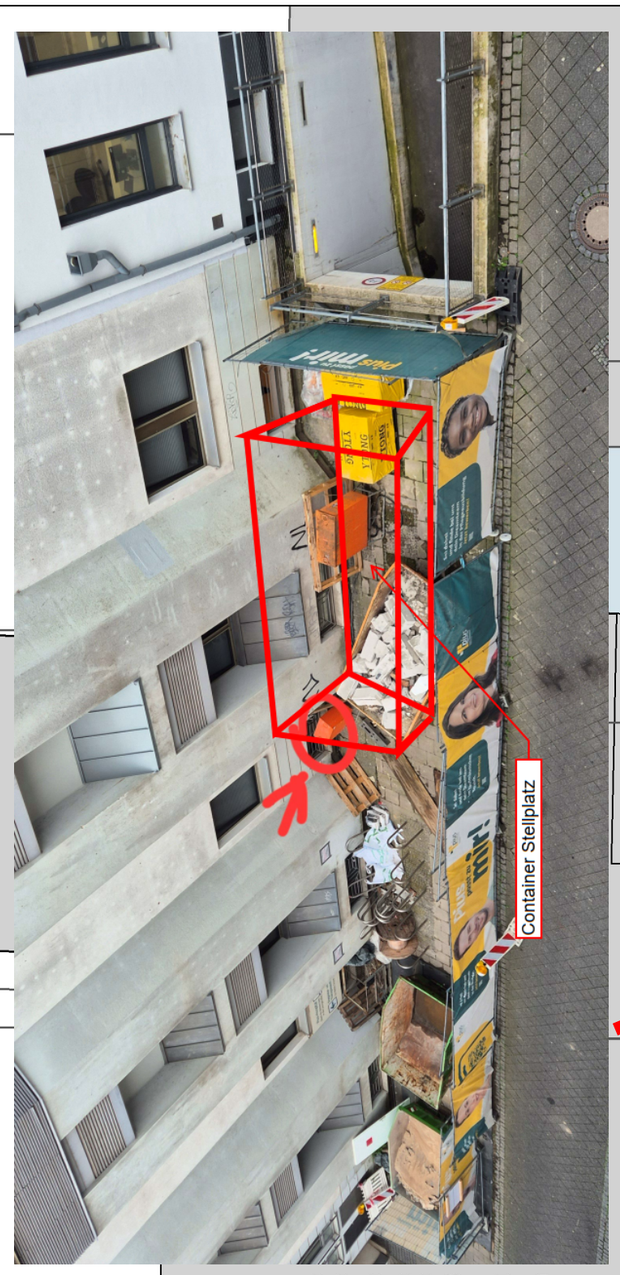

HAUS 14

Blickrichtung des Fotos

Zugangsseite Container

Grüne Straße

Durchfahrt UG

DURCHGANGSHÖHE: MAX. 2.10m

Durchgang UG

Hof 4

+3,37 müNN OK Gelände

Höhenversprung

Decke über Tiefgeschoss

+3,09 müNN OK Gelände

+6,51 müNN OK Attika

+7,99 müNN OK Attika

4.80 Bauzaun

Folie Meshgewebe direkt über P.-H.- OL

ZUGANG

Absetz-container (2,60m)

Stahlplatten unter Container ~12,00 m²

Schutz Fassade bis 2m Höhe Holzwerkstoffplatten, Ansaugung und Absaugung aussparen

Absetzpodest 2.OG Lüftungsgeräte Einbringöffnung mind. 2,40m x 2,40m Wetterschutzgitter: 4,70m x 1,50m

Schutt-rutsche

Baustromverteiler + Bauwasser Baustelleneinrichtung

Tunneleinhausung Dieselansaugung H= 1,10m/ B= 2,10m/ L= 4,00m

Tunnel

Rückbau Fahrradbügel insges. 10 Stk

Bereich freihalten

Bauwasser 1.OG + 2.OG

Treppen turm

1.OG

Zugang Baustelle 1. und 2. OG

► 1. OG H=5,80m Lichtes Maß= ca. 0,95 x 1,95m

► 2. OG H=9,85m Lichtes Maß= ca. 0,95 x 1,95m

Baustrom Etagenverteiler

Bereich zur Betankung freihalten Notaus H= 2,00m

30,88 m / 30.91

6,07 m

2,43 m

Heizöltank mind. 5.000 ltr. => entspricht ca. 40 Vollbenutzungsstunden. Bei einer Standfläche von 4m² entspricht die Flächenlast ca. 10,6 kN/m² **=> Passt**

Zugangsseite Container

Container Maße L/B/H: 6058 / 2438 / 2591mm
Gewicht ca. 10.000 kg
Fläche Container = 14,77 m²
Flächenlast Container = 677 kg/m² = 6,8 kN/m²
Flächenlast Aufstellort = 15 kN/m²
=> Passt

Heizung - Schläuche für mobile Wärmeversorgung DN100 AD ca. 300mm

Tiefgarage "Heiligengeist-Höfe"
Flächenlast im gesamten betreffenden Bereich max. 0,5t / m² (5kN/m²)
Auf freigebliebenen Verkehrsflächen des betreffenden Bereiches, 1 LKW mit den zulässigen Gesamtgewicht max. 25 t.

Tiefgarage "Pius- Hospital"
Flächennutzlast 15 kN/m² (1.500kg/m²)

PIUS- HOSPITAL

Unterer See-container 20´: Eigentum P.-H.-OL

Anschlusspunkt Frischwasser + Schmutzwasser

Baustrom

Podest

Zaun

Oberer Sozial-container 20´ neu

Seecontainer 20´

Sanitär-container 10´ neu

Seecontainer bis 20´; Firmen nach Bedarf

Seecontainer umsetzen 21.40

Seecontainer bis 20´; Firmen nach Bedarf

Fläche Haus 16

Seecontainer: Eigentum P.-H.-OL

Seecontainer 20´

Seecontainer 20´

Zufahrt Tiefgarage

F- FLÜGEL Bereich 6

Hof 1

Hof 2

Röntgentrakt Bereich 7

Bauzaun

Georgstraße

ÄNDERUNGEN ARCHITEKTUR			
h	LB	04.03.2024	Änderung Beschriftung Seecontainer
g	LB	01.03.2024	Änderung Baustelleneinrichtung Grüne Straße Haus 16
f	LB	12.02.2024	Ergänzung Beschriftung Seecontainer/ Änderung Absetzpodest
e	LB	05.02.2024	Anpassungen gem. E-Mail BM vom 23.01.2024
d	LB	15.01.2024	Ausschnittsanpassung
c	LB	11.08.2023	Unterteilung Stahlplatten, Erweiterung Podest geändert
b	LB	01.08.2023	Ergänzung Höhe Betankung, Ergänzung An+ Absaugung
a	LB	20.07.2023	Überarbeitung
00	LB	18.07.2023	Planerstellung
ID	GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG

BAUVORHABEN

Pius- Hospital I 61000050- F-Flügel ZOP I
Georgstraße 12 I 26121 Oldenburg

BAUHERR

Pius- Hospital Oldenburg I Georgstraße 12 I
26121 Oldenburg

PLANINHALT

Lageplan mit Baustelleneinrichtung
BAUSTUFE 2
für 1.OG Z-OP und 2.OG Lüftungszentrale

055

LEISTUNGSPHASE	ENTWURFSVERFASSER
LPH 5 / Ausführungsplanung	architekturbüro Dipl. Ing. (FH) Architekt Michael Schönfeld m. schönfeld Königsberger Straße 5 26180 Rastede Telefon 04402 / 916 780 Telefax 04402 / 916 803 Mobil 0172 / 45 53 138 E-Mail schoenfeld1a@googlemail.com

ERSTELLT	GEPLANT
18.07.2023	Schönfeld / LB
PLAN-NR.	MAßSTAB
Pius-Be3+5-LP-BE-BS2-GG-Z-OP-Lüftungsz.-055-	1:200
BLATTGRÖßE	INDEX / DATUM INDEX
510 / 420	h 04.03.2024
