Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Herbstferien MV	8 Tage	Don 15.10.26	Sam 24.10.26
2		Weihnachtsferien MV	11 Tage	Mon 21.12.26	Sam 02.01.27
3		Winterferien 2027 MV	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
4		Osterferien MV	8 Tage	Mit 24.03.27	Fre 02.04.27
5		Himmelfahrt	1 Tag	Don 06.05.27	Don 06.05.27
6		Pfingstferien 1 MV	1 Tag	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27
7		Pfingsten 2 MV	3 Tage	Fre 14.05.27	Die 18.05.27
8		Sommerferien MV	31 Tage	Mon 05.07.27	Sam 14.08.27
9		Veröffentlichung / Hochladen	2 Tage	Don 27.08.26	Fre 28.08.26
10		Angebotsfrist	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
11		Wertung und Vergabevorschlag	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
12		Widerspruchsfrist	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
13		Aufträge vorbereiten und erteilen	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
14		Zeit bis Baubeginn	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
15		Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
16		Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
17		Gründung/Bodenplatte, Aufkantungen	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
18		Aushärten Beton	30 Tage	Mon 21.12.26	Fre 29.01.27
19		Aufstellen Holzkonstruktion Rohbau	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
20		Gerüst außen aufbauen	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
21		Dachabdichtung Hallendach	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27
22		Solaranlage Photovoltaik	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27
23		Gerüst innen	2 Tage	Mon 08.02.27	Die 09.02.27
24		Fenster, Tore	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
25		Dachabdichtung Nebenräume (Gründach)	30 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.03.27
26		Beplankung Fassade (Holz, Putz)	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
27		Gerüst außen abbauen	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27
28		Trockenbau innen einseitig	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27
29		Malerarbeiten 1: Decken, Technik	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
30		Rohinstallation HSL	20 Tage	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27
31		Rohinstallation Elt.	20 Tage	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27
32		Trockenbau Innenwände schließen	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
33		Maler 2: Oberwände Halle	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27
34		Leuchten und Elt. Installation Halle	5 Tage	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27
35		Estrich	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
36		Estrich Trocknung	30 Tage	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27
37		abgehängte Decken	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
38		Fliesen und Abdichtung	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27
39		Bodenbeläge	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27
40		Sportboden Halle	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27
41		Prallwände Halle	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
42		Innentüren, Geräteraumtore	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27
43		Malerarbeiten 3: Restliche	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
44		Zwischenreinigung	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27
45		Feininstallation TGA (HSL und Elt)	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27
46		TGA in Außenanlagen	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
47		Außenanlagen	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27
48		Abnahmen VOB + SV	10 Tage	Mon 16.08.27	Fre 27.08.27
49		Endreinigung und Übergabe	5 Tage	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27

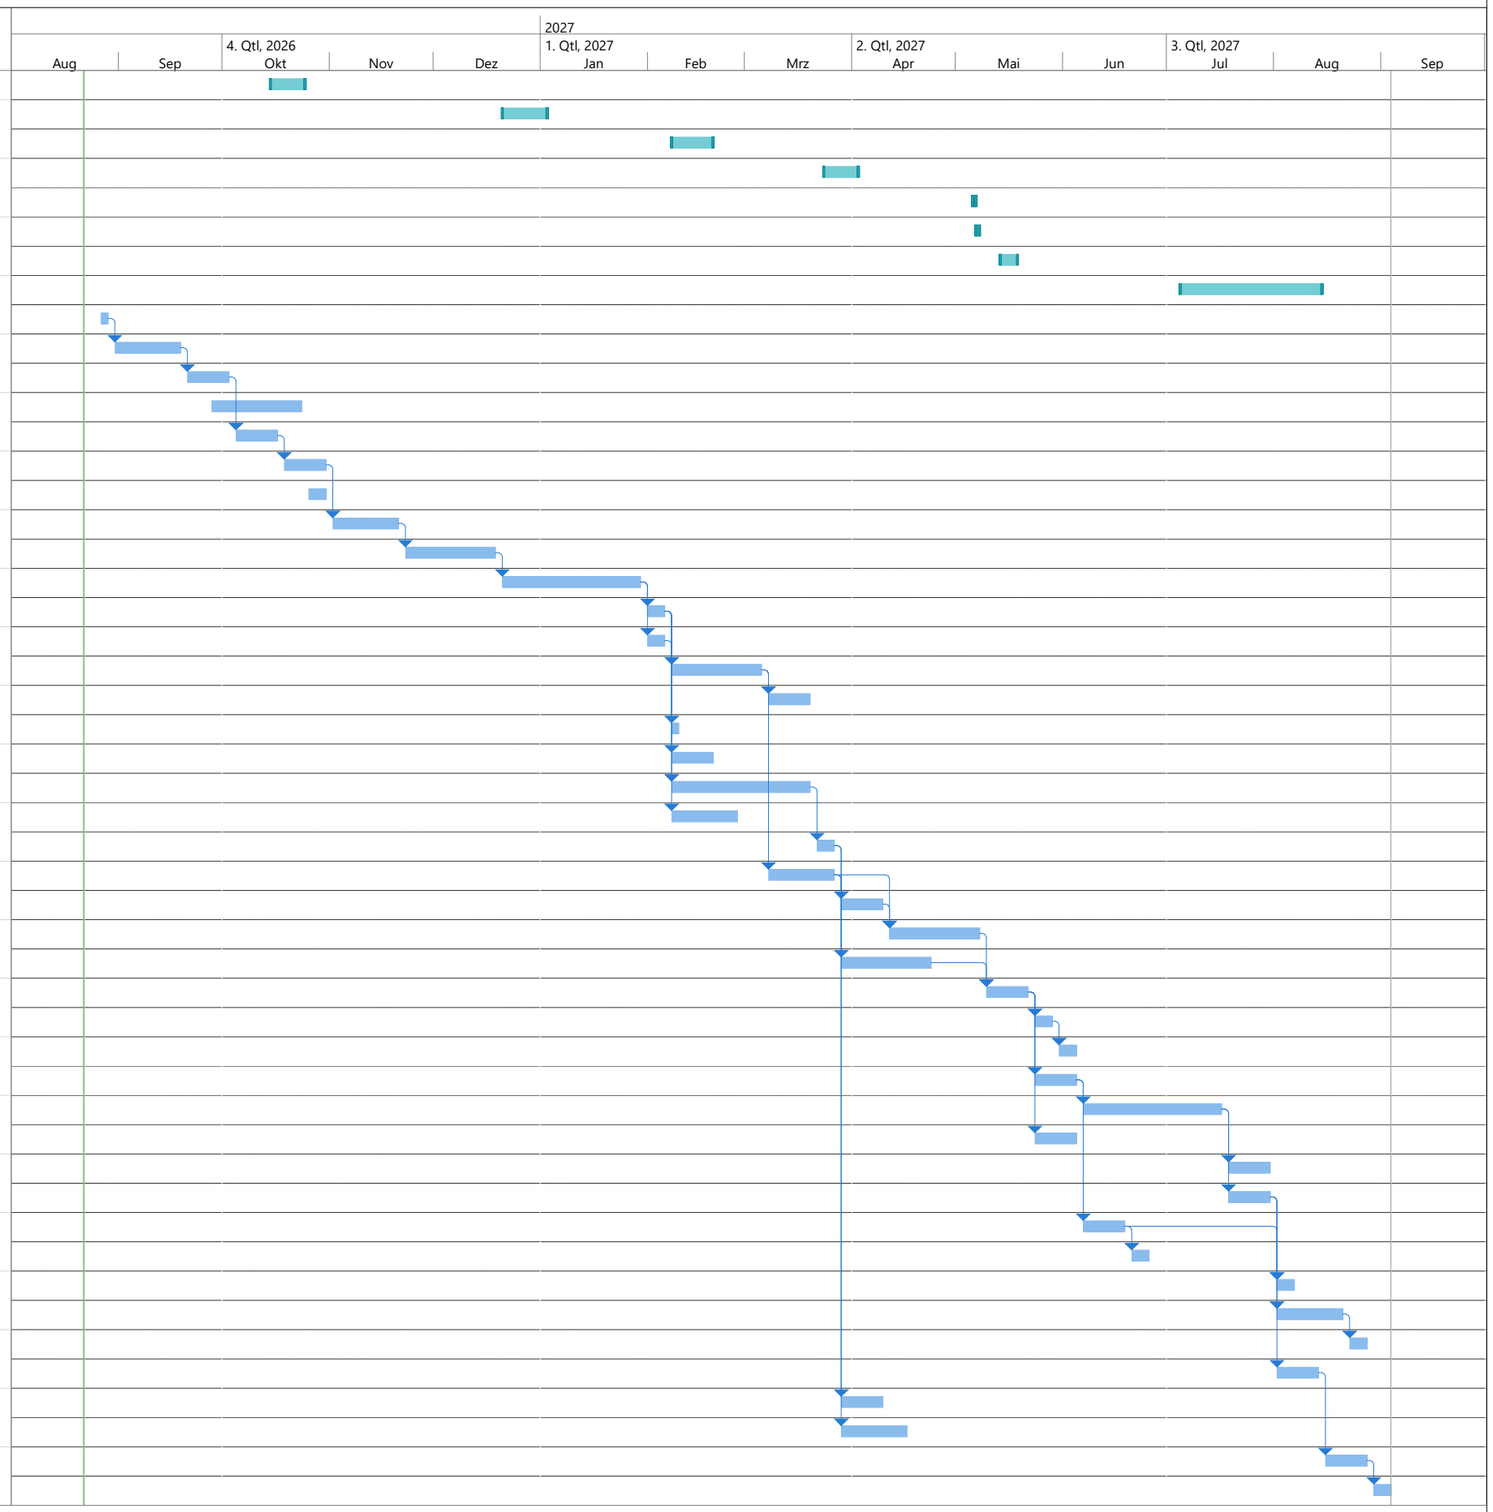

Projekt: JFP Ahlbeck Neubau Sporthalle
Datum: 21.08.2026

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
