Bauvorhaben
Anpassung der Patientenzimmer im Rahmen der Pandemieresilienz
Standort:
Vor dem Nebraer Tor 11, 06568 Querfurt

Bauablaufplan Vorabzug
Rahmentermine

Bauherr
Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52
06217 Merseburg

Nr.	Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Ende
1	Auftragsvergabe		1 Tag?	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26
3	**Baubeginn**		**0 Tage**	**Fre 17.07.26**	**Fre 17.07.26**
5	**Bauausführung 1.BA A**		**90 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 20.11.26**
6	**Bauausführung A/1/-2 GU**		**90 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 20.11.26**
20	**Bauausführung A/1/-2 Rohbau**		**25 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 21.08.26**
28	**Bauausführung A/1/-2 Elektro**		**82 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Die 10.11.26**
42	**Bauausführung A/1/-2 HLS**		**85 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 13.11.26**
56	**Bauausführung A/1/-1 GU**		**79 Tage**	**Die 21.07.26**	**Fre 06.11.26**
69	**Bauausführung A/1/-1 Rohbau**		**13 Tage**	**Die 21.07.26**	**Don 06.08.26**
73	**Bauausführung A/1/-1 Elektro**		**71 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mon 26.10.26**
83	**Bauausführung A/1/-1 HLS**		**70 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 30.10.26**
93	**Bauausführung 1.BA B**		**67,5 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Fre 23.10.26**
94	**Bauausführung B/1/0 GU**		**57,5 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Fre 09.10.26**
107	**Bauausführung B/1/0 Elektro**		**47 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Die 06.10.26**
115	**Bauausführung B/1/0 HLS**		**44 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Don 01.10.26**
126	**Bauausführung B/1/+1 GU**		**65,5 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Fre 23.10.26**
139	**Bauausführung B/1/+1 Elektro**		**45 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 09.10.26**
147	**Bauausführung B/1/+1 HLS**		**44,5 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 09.10.26**
158	Pufferzeit / Umzug Haus A		1 Woche	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26
159	Pufferzeit / Umzug Haus B		1 Woche	Fre 23.10.26	Fre 30.10.26
160	**Bauausführung 2.BA A**		**66 Tage**	**Don 26.11.26**	**Fre 26.02.27**
161	**Bauausführung A/2/-2 GU**		**57 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Die 16.02.27**
174	**Bauausführung A/2/-2 Rohbau**		**13 Tage**	**Mit 02.12.26**	**Fre 18.12.26**
178	**Bauausführung A/2/-2 Elektro**		**54,5 Tage**	**Don 26.11.26**	**Mit 10.02.27**
189	**Bauausführung A/2/-2 HLS**		**52 Tage**	**Mit 02.12.26**	**Don 11.02.27**
200	**Bauausführung A/2/-1 GU**		**62,5 Tage**	**Mit 02.12.26**	**Fre 26.02.27**
213	**Bauausführung A/2/-1 Rohbau**		**14 Tage**	**Don 03.12.26**	**Die 22.12.26**
217	**Bauausführung A/2/-1 Elektro**		**58,5 Tage**	**Die 01.12.26**	**Fre 19.02.27**
230	**Bauausführung A/2/-1 HLS**		**52 Tage**	**Mit 09.12.26**	**Don 18.02.27**
240	**Bauausführung 2.BA B**		**70 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Fre 05.02.27**
241	**Bauausführung B/2/0 GU**		**60 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Fre 22.01.27**
254	**Bauausführung B/2/0 Elektro**		**58,5 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Mit 20.01.27**
263	**Bauausführung B/2/0 HLS**		**41,5 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Die 29.12.26**
273	**Bauausführung B/2/+1 GU**		**69 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 05.02.27**
286	**Bauausführung B/2/+1 Elektro**		**59,5 Tage**	**Die 03.11.26**	**Mon 25.01.27**
295	**Bauausführung B/2/+1 HLS**		**55,5 Tage**	**Don 05.11.26**	**Don 21.01.27**
304	Pufferzeit / Umzug Haus A		2 Wochen	Fre 26.02.27	Fre 12.03.27
305	Pufferzeit / Umzug Haus B		2 Wochen	Fre 05.02.27	Fre 19.02.27
306	**Bauende**		**0 Tage**	**Fre 12.03.27**	**Fre 12.03.27**
307	Verwendungsnachweis		1 Monat	Fre 12.03.27	Fre 09.04.27
308	Projektende		0 Tage	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27

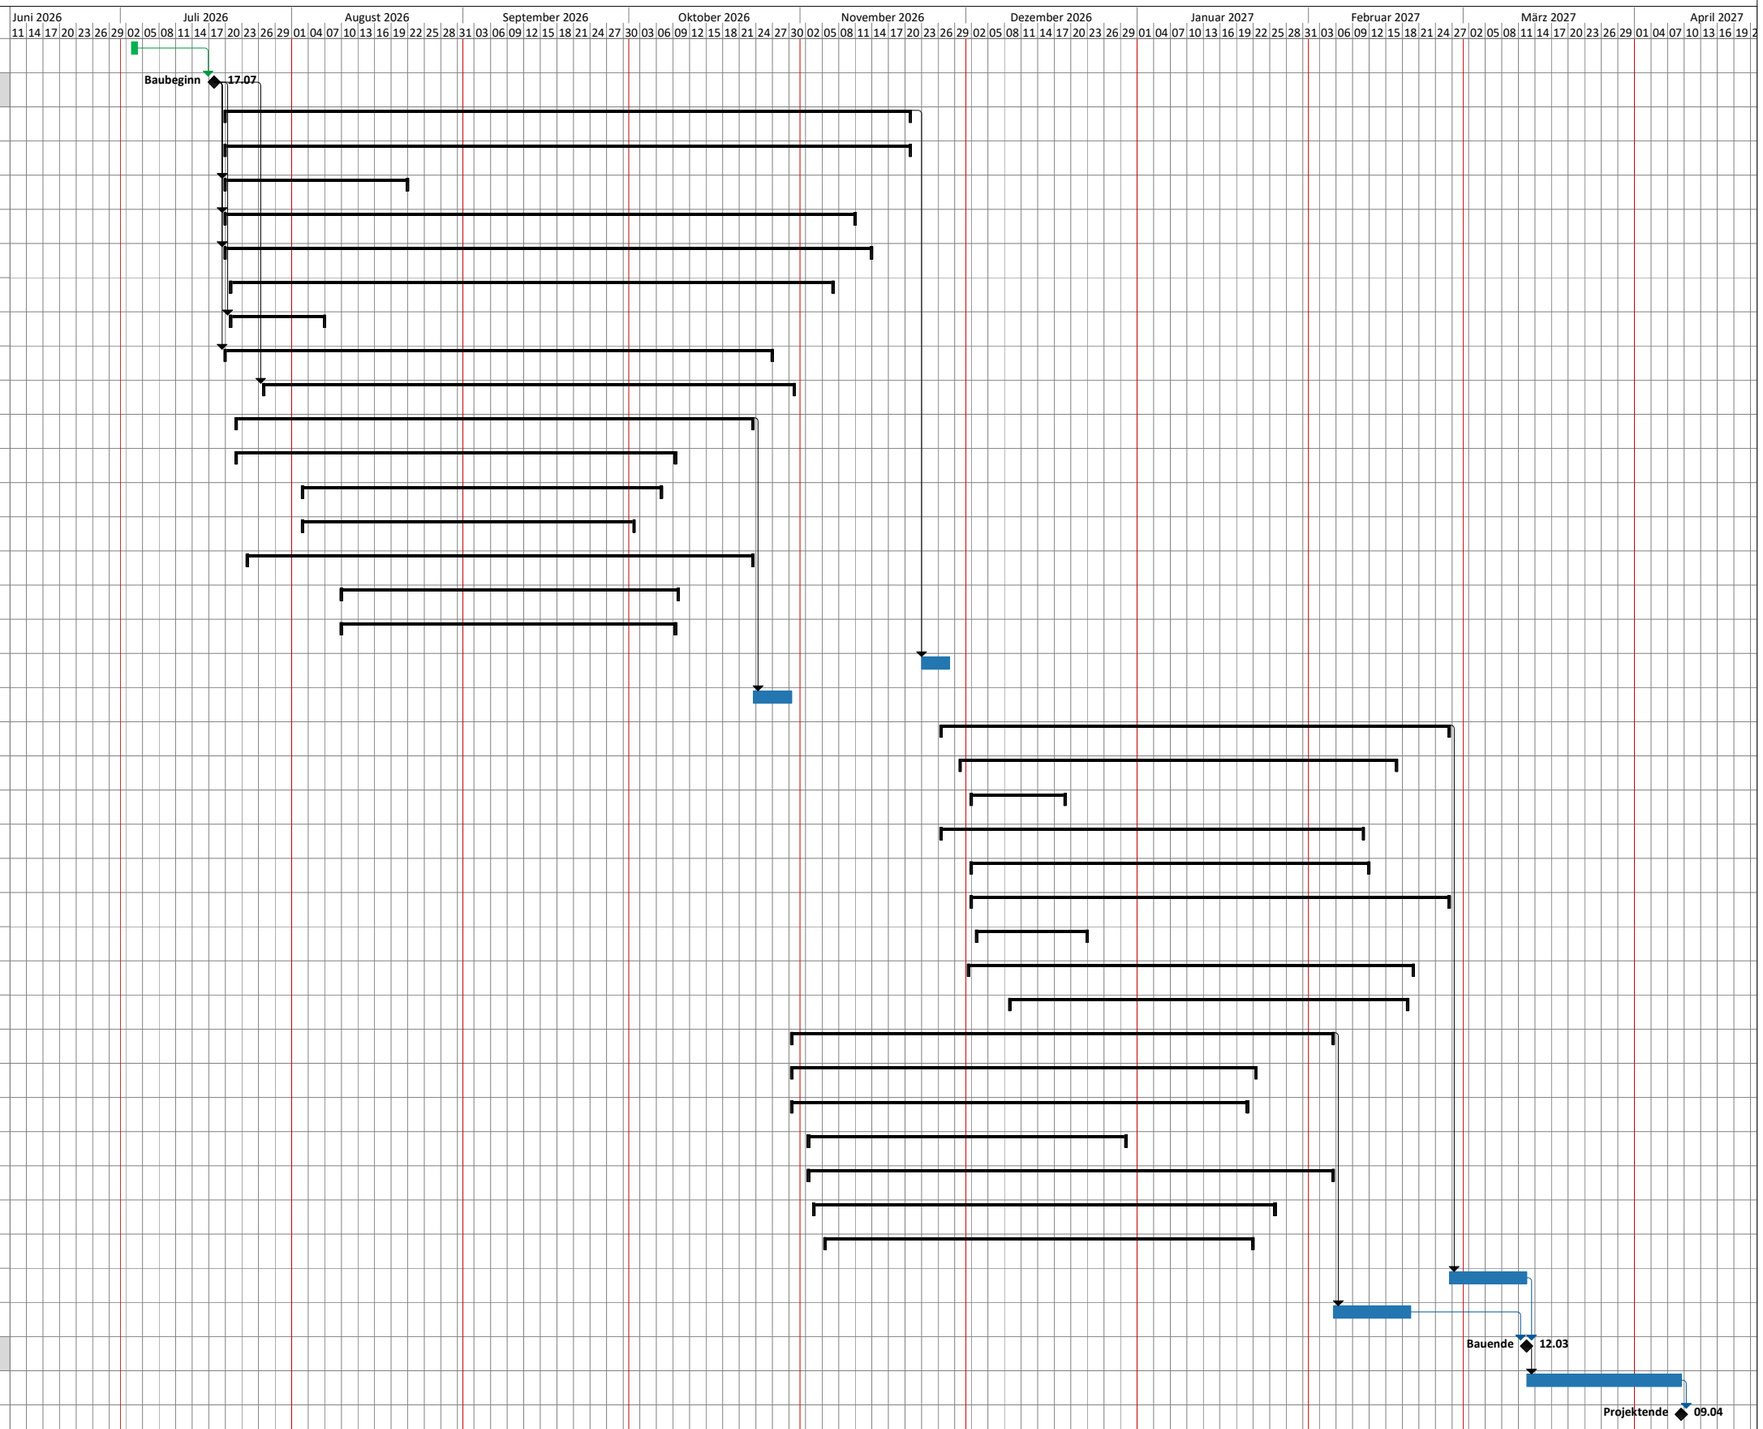

Architekt
Kummer & Noth GmbH, Reudnitzer Str. 1, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 - 30 85 45 - 0
www.kummer-noth.de, mail@kummer-noth.de

erstellt: 17.06.2026
Planungsstand: AFU Vorabzug
Bearbeiter: Peter Schubert
