Bauzeitenplan Bauabschnitt 1
Sanierung Grundschule Villa Kunterbunt

RACK Architekten & Ingenieure GmbH
Herzbachweg 21
63571 Gelnhausen
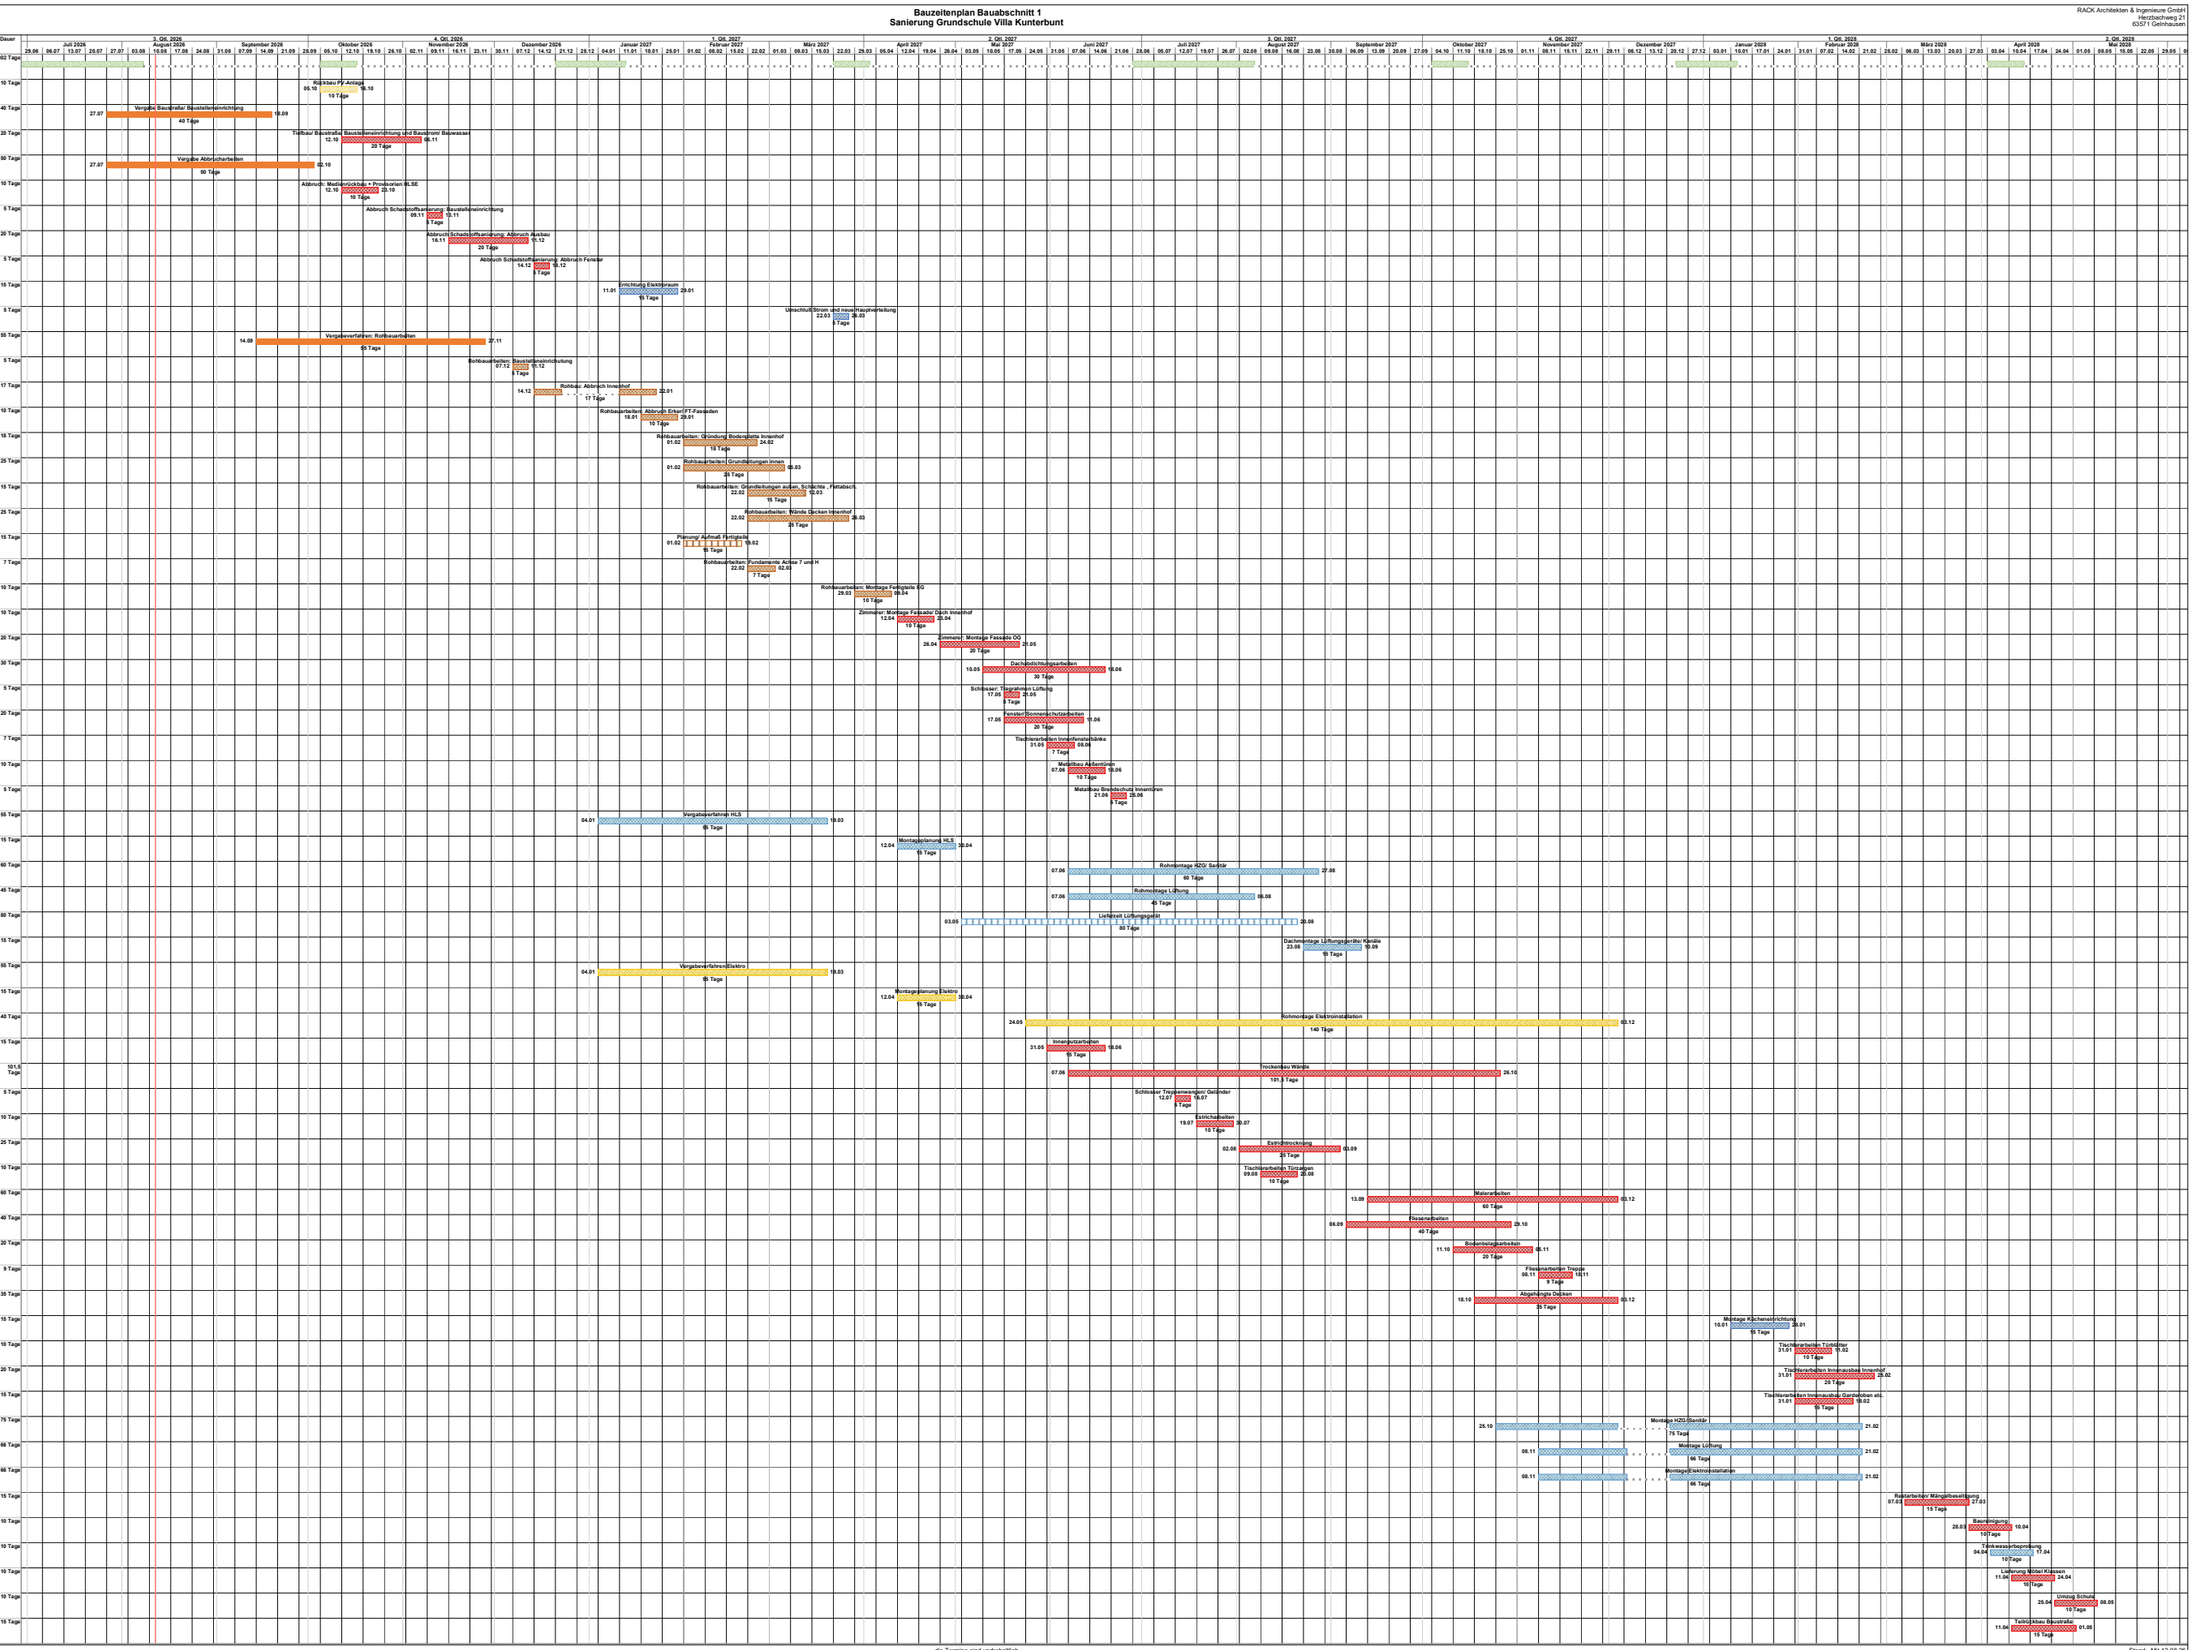
Nr.	Ressourcenname	Anfang	Ende	Ressourcen	Vorgänge	Dauer
1	FERIEN	Mon 30.03.26	Fre 30.08.30	FERIEN		302 Tage
2	Rückbau PV-Anlage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	Rückbau PV-Anlage		10 Tage
3	Vergabe Baustraße/ Baustelleneinrichtung	Mon 27.07.26	Fre 18.09.26	Vergabe Baustraße/ Baustelleneinr		40 Tage
4	Tiefbau/ Baustraße/ Baustelleneinrichtung und Baustrom/ Bauwasser	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26	Tiefbau/ Baustraße/ Baustelleneinr		20 Tage
5	Vergabe Abbrucharbeiten	Mon 27.07.26	Fre 02.10.26	Vergabe Abbrucharbe		50 Tage
6	Abbruch: Medienrückbau + Provisorien HLSE	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	Abbruch: Medienrückb + Provisorien	HLSE	10 Tage
7	Abbruch Schadstoffsanierung: Baustelleneinrichtung	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	Abbruch Schadstoffsa Baustelleneir	6EA+5 Tage	5 Tage
8	Abbruch Schadstoffsanierung: Abbruch Ausbau	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	Abbruch Schadstoffsa Abbruch Ausbau		20 Tage
9	Abbruch Schadstoffsanierung: Abbruch Fenster	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	Abbruch Schadstoffsa Abbruch Fenster		5 Tage
10	Errichtung Elektroraum	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	Errichtung Elektroraum		15 Tage
11	Umschluß Strom und neue Hauptverteilung	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27	Umschluß Strom und neue Hauptverteilu		5 Tage
12	Vergabeverfahren: Rohbauarbeiten	Mon 14.09.26	Fre 27.11.26	Vergabeverfa Rohbauarbei		55 Tage
13	Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	Rohbauarbei Baustelleneir	12	5 Tage
14	Rohbau: Abbruch Innenhof	Mon 14.12.26	Fre 22.01.27	Rohbau: Abbruch Innenhof	13	17 Tage
15	Rohbauarbeiten: Abbruch Erker/ FT-Fassaden	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	Rohbauarbei Abbruch Erker/ FT-Fassaden		10 Tage
16	Rohbauarbeiten: Gründung Bodenplatte Innenhof	Mon 01.02.27	Mit 24.02.27	Rohbauarbei Gründung Bodenplatte Innenhof	17AA	18 Tage
17	Rohbauarbeiten: Grundleitungen innen	Mon 01.02.27	Fre 05.03.27	Rohbauarbei Grundleitung innen	15	25 Tage
18	Rohbauarbeiten: Grundleitungen außen, Schächte , Fettabsch.	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	Rohbauarbei Grundleitung außen, Schächte ,	16AA+15 Tage	15 Tage
19	Rohbauarbeiten: Wände Decken Innenhof	Mon 22.02.27	Fre 26.03.27	Rohbauarbei Wände Decken Innenhof	18AA	25 Tage
20	Planung/ Aufmaß Fertigteile	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27	Planung/ Aufmaß Fertigteile	16AA	15 Tage
21	Rohbauarbeiten: Fundamente Achse 7 und H	Mon 22.02.27	Die 02.03.27	Rohbauarbei Fundamente Achse 7 und H	20AA+10 Tage	7 Tage
22	Rohbauarbeiten: Montage Fertigteile EG	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	Rohbauarbei Montage Fertigteile EG	19	10 Tage
23	Zimmerer: Montage Fassade/ Dach Innenhof	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	Zimmerer: Montage Fassade/ Dach	22	10 Tage
24	Zimmerer: Montage Fassade OG	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27	Zimmerer: Montage Fassade OG	23	20 Tage
25	Dachabdichtungsarbeiten	Mon 10.05.27	Fre 18.06.27	Dachabdicht	24AA+10 Tage	30 Tage
26	Schlosser: Tragrahmen Lüftung	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27	Schlosser: Tragrahmen Lüftung	25AA+5 Tage	5 Tage
27	Fenster/ Sonnenschutzarbeiten	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	Fenster/ Sonnenschu	26AA	20 Tage
28	Tischlerarbeiten Innenfensterbänke	Mon 31.05.27	Die 08.06.27	Tischlerarbe Innenfenster	27AA+10 Tage	7 Tage
29	Metallbau Außentüren	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	Metallbau Außentüren	28EA-2 Tage	10 Tage
30	Metallbau Brandschutz Innentüren	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	Metallbau Brandschutz Innentüren	29	5 Tage
31	Vergabeverfahren HLS	Mon 04.01.27	Fre 19.03.27	Vergabeverfa HLS		55 Tage
32	Montageplanung HLS	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27	Montageplan HLS	31EA+15 Tage	15 Tage
33	Rohmontage HZG/ Sanitär	Mon 07.06.27	Fre 27.08.27	Rohmontage HZG/ Sanitär	29AA	60 Tage
34	Rohmontage Lüftung	Mon 07.06.27	Fre 06.08.27	Rohmontage Lüftung	33AA	45 Tage
35	Lieferzeit Lüftungsgerät	Mon 03.05.27	Fre 20.08.27	Lieferzeit Lüftungsger	32	80 Tage
36	Dachmontage Lüftungsgeräte/ Kanäle	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	Dachmontag Lüftungsger Kanäle	35	15 Tage
37	Vergabeverfahren Elektro	Mon 04.01.27	Fre 19.03.27	Vergabeverfa Elektro		55 Tage
38	Montageplanung Elektro	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27	Montageplan Elektro	37EA+15 Tage	15 Tage
39	Rohmontage Elektroinstallation	Mon 24.05.27	Fre 03.12.27	Rohmontage Elektroinstal	24	140 Tage
40	Innenputzarbeiten	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27	Innenputzarb	39AA+5 Tage	15 Tage
41	Trockenbau Wände	Mon 07.06.27	Die 26.10.27	Trockenbau Wände	40AA+5 Tage	101,5 Tage
42	Schlosser Treppenwangen/ Geländer	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	Schlosser Treppenwan Geländer		5 Tage
43	Estricharbeiten	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	Estricharbeit		10 Tage
44	Estrichtrocknung	Mon 02.08.27	Fre 03.09.27	Estrichtrockn	43	25 Tage
45	Tischlerarbeiten Türzargen	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	Tischlerarbe Türzargen		10 Tage
46	Malerarbeiten	Mon 13.09.27	Fre 03.12.27	Malerarbeiter		60 Tage
47	Fliesenarbeiten	Mon 06.09.27	Fre 29.10.27	Fliesenarbeit		40 Tage
48	Bodenbelagsarbeiten	Mon 11.10.27	Fre 05.11.27	Bodenbelags		20 Tage
49	Fliesenarbeiten Treppe	Mon 08.11.27	Don 18.11.27	Fliesenarbeit Treppe		9 Tage
50	Abgehängte Decken	Mon 18.10.27	Fre 03.12.27	Abgehängte Decken		35 Tage
51	Montage Kücheneinrichtung	Mon 10.01.28	Fre 28.01.28	Montage Kücheneinric		15 Tage
52	Tischlerarbeiten Türblätter	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28	Tischlerarbeiten Türblätter	51	10 Tage
53	Tischlerarbeiten Innenausbau Innenhof	Mon 31.01.28	Fre 25.02.28	Tischlerarbe Innenausbau Innenhof	52AA	20 Tage
54	Tischlerarbeiten Innenausbau Garderoben etc.	Mon 31.01.28	Fre 18.02.28	Tischlerarbe Innenausbau Garderoben etc.	53AA	15 Tage
55	Montage HZG/ Sanitär	Mon 25.10.27	Mon 21.02.28	Montage HZG/ Sanitär	55AA+5 Tage	75 Tage
56	Montage Lüftung	Mon 08.11.27	Mon 21.02.28	Montage Lüftung	55AA+10 Tage	66 Tage
57	Montage Elektroinstallation	Mon 08.11.27	Mon 21.02.28	Montage Elektroinstall	56AA	66 Tage
58	Restarbeiten/ Mängelbeseitigung	Die 07.03.28	Mon 27.03.28	Restarbeiten Mängelbeseit	57EA+10 Tage	15 Tage
59	Baureinigung	Die 28.03.28	Mon 10.04.28	Baureinigung	58	10 Tage
60	Trinkwasserbeprobung	Die 04.04.28	Mon 17.04.28	Trinkwasserb	59AA+5 Tage	10 Tage
61	Lieferung Möbel Klassen	Die 11.04.28	Mon 24.04.28	Lieferung Möbel Klassen	59	10 Tage
62	Umzug Schule	Die 25.04.28	Mon 08.05.28	Umzug Schule	61	10 Tage
63	Teilrückbau Baustraße	Die 11.04.28	Mon 01.05.28	Teilrückbau Baustraße	61AA	15 Tage
