20008 Stadthalle Gelnhausen, Sanierung - mit VgV

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.4	**LPH 08 - Sanierung Stadthalle**	**1170kt**	**Mo, 15.09.25**	**Mo, 27.11.28**
1.4.1	**0 Vorbereitende Maßnahmen**	**248at**	**Mo, 15.09.25**	**Fr, 18.09.26**
1.4.1.1	0.1 Ausräumen, Umzug (Stadt Gelnhausen)	59at	Mo, 15.09.25	Fr, 05.12.25
1.4.1.2	0.2 Rodungs- und Baumfällarbeiten	10at	Mo, 09.02.26	Fr, 20.02.26
1.4.1.3	**Los 02 - Schadstoffsanierung, Rückbau innen (SchadSt)**	**60at**	**Mo, 29.06.26**	**Fr, 18.09.26**
1.4.1.3.1	Arbeitsvorbereitung	25at	Mo, 29.06.26	Fr, 31.07.26
1.4.1.3.2	Baustelleneinrichtung	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
1.4.1.3.3	Entrümpelung	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
1.4.1.3.4	Schadstoffsanierung	10at	Mo, 10.08.26	Fr, 21.08.26
1.4.1.3.5	Rückbau	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26
1.4.1.3.6	Entkernung	10at	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26
1.4.2	**Los 04 - Lastenaufzug**	**341at**	**Mo, 07.09.26**	**Fr, 14.01.28**
1.4.2.1	Arbeitsvorbereitung	10at	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26
1.4.2.2	Werkplanung	15at	Mo, 21.09.26	Fr, 09.10.26
1.4.2.3	Produktion	60at	Mo, 12.10.26	Mi, 06.01.27
1.4.2.4	Montage Lastenaufzug	14at	Mo, 20.12.27	Fr, 14.01.28
1.4.3	**Los 05 - Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen**	**290kt**	**Mi, 04.11.26**	**Fr, 20.08.27**
1.4.3.1	KickOff-Termin	1at	Mi, 04.11.26	Mi, 04.11.26
1.4.3.2	Arbeitsvorbereitung	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
1.4.3.3	Verkehrszeichenplan	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
1.4.3.4	Verkehrssicherungsmaßnahmen	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
1.4.3.5	Baustelleneinrichtung Phase 1	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
1.4.3.6	Grundstandzeit Phase 1	28kt	Sa, 19.12.26	Fr, 15.01.27
1.4.3.7	Baustelleneinrichtung Phase 2 - Vollsperrung	5at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27
1.4.3.8	Grundstandzeit Phase 2	28kt	Sa, 03.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.3.9	Umbau - halbseitige Straßensperrung	5at	Mo, 02.08.27	Fr, 06.08.27
1.4.3.10	Grundstandzeit Phase 2	14kt	Sa, 07.08.27	Fr, 20.08.27
1.4.4	**Los 06 - Erd-, Mauer- und Stahlbetonarbeiten**	**145at**	**Mo, 25.01.27**	**Fr, 20.08.27**
1.4.4.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 25.01.27	Fr, 19.02.27
1.4.4.2	Baustelleneinrichtung	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27
1.4.4.3	Abbruch Außenanlagen	15at	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.4.4	Abbruch Kamin, inkl. Gerüststellung	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.4.5	1. BA Fenster ausbauen und zumauern	8at	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27
1.4.4.6	1. BA Erdarbeiten - Freilegen AW	18at	Mo, 22.03.27	Fr, 16.04.27
1.4.4.7	1. BA Abdichtung	24at	Di, 30.03.27	Fr, 30.04.27
1.4.4.8	1. BA Wärmedämmung	24at	Di, 30.03.27	Fr, 30.04.27
1.4.4.9	1. BA Drainage	24at	Di, 30.03.27	Fr, 30.04.27
1.4.4.10	1. BA Fundamente Lastenaufzug, inkl. Wiederverfüllung	20at	Mo, 05.04.27	Fr, 30.04.27
1.4.4.11	1. BA Wiederverfüllung, inkl. Entwässerungsarbeiten	24at	Mo, 05.04.27	Fr, 07.05.27
1.4.4.12	1. BA Zisterne, Sicherschacht Drainage	9at	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27
1.4.4.13	Fundamente Technikeinhausung, inkl. Wiederverfüllung	9at	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27
1.4.4.14	Innenarbeiten: Rückbau- und Neubaumaßnahmen	13at	Di, 18.05.27	Fr, 04.06.27
1.4.4.15	Innenarbeiten: Feuchtigkeitssanierung	10at	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27
1.4.4.16	Innenarbeiten: Erneuerung bitmuminöse Abdichtung auf Bodenplatte	10at	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27
1.4.4.17	2. BA Erdarbeiten - Freilegen AW	15at	Mo, 28.06.27	Fr, 16.07.27
1.4.4.18	2. BA Abdichtung	20at	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.4.19	2. BA Wärmedämmung	20at	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.4.20	2. BA Drainage	20at	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.4.21	2. BA Wiederverfüllung, inkl. Entwässerungsarbeiten	15at	Mo, 19.07.27	Fr, 06.08.27
1.4.4.22	2. BA Asphaltarbeiten	10at	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27
1.4.4.23	Hauptdach - Ringbalken	15at	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27
1.4.4.24	Demontage Lüftungskanäle Attika	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.5	**Los 06 - Blitzschutzarbeiten**	**230at**	**Mo, 25.01.27**	**Fr, 17.12.27**
1.4.5.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 25.01.27	Fr, 19.02.27
1.4.5.2	Werkplanung	20at	Mo, 08.02.27	Fr, 05.03.27
1.4.5.3	1. BA Wanddurchführung	19at	Di, 30.03.27	Fr, 23.04.27
1.4.5.4	1. BA Einlegearbeiten Ringerder	19at	Di, 30.03.27	Fr, 23.04.27
1.4.5.5	2. BA Wanddurchführung	20at	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.5.6	2. BA Einlegearbeiten Ringerder	20at	Mo, 05.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.5.7	Blitzschutzarbeiten Hauptdach	5at	Mo, 23.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.5.8	Blitzschutzarbeiten Fassade	5at	Mo, 18.10.27	Fr, 22.10.27
1.4.5.9	Blitzschutzarbeiten Flachdach+Attika	5at	Mo, 29.11.27	Fr, 03.12.27
1.4.5.10	Blitzschutzarbeiten Dach Lastenaufzug	5at	Mo, 13.12.27	Fr, 17.12.27
1.4.6	**Los 08 - Dachabdichtungsarbeiten Flachdach**	**263at**	**Mo, 08.02.27**	**Do, 24.02.28**
1.4.6.1	Arbeitsvorbereitung	15at	Mo, 08.02.27	Fr, 26.02.27
1.4.6.2	Rückbauarbeiten Flachdach inkl. Schutzmaßnahme	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
1.4.6.3	Demontage Innenverkleidung Attika	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
1.4.6.4	Erneuerung Notabdichtung+Entwässerung	18at	Mo, 08.03.27	Fr, 02.04.27
1.4.6.5	Dachflächenfenster	5at	Mo, 11.10.27	Fr, 15.10.27
1.4.6.6	Wärmedämmung	20at	Mo, 18.10.27	Fr, 12.11.27
1.4.6.7	Abdichtung	25at	Mo, 25.10.27	Fr, 26.11.27
1.4.6.8	Montage Regenfallrohre	10at	Fr, 11.02.28	Do, 24.02.28
1.4.7	**Los 09 - Gerüstbauarbeiten**	**259at**	**Mo, 08.03.27**	**Fr, 17.03.28**
1.4.7.1	Arbeitsvorbereitung	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.7.2	Werkplanung	19at	Mo, 22.03.27	Mo, 19.04.27
1.4.7.3	Stellung Flächengerüst Saal	17at	Mo, 03.05.27	Fr, 28.05.27

erstellt mit pro Projekt plan Plus 2023 - Service-Nr.: 0PLN_B3A0CB4A - lizenziert für hkr-architekten Gelnhausen

hkr architekten
Altenhaßlauer Straße 21
Gelnhausen
Tel. +49 6051 91288-0
Fax +49 6051 91288-10
e-Mail: kontakt@hkr-architekten.de

Projektnummer:

20008 Stadthalle Gelnhausen, Sanierung - mit VgV

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.4.7.4	Stellung Fassadengerüst BA 1 - Bühnenhaus, Hauptdach	13at	Mo, 10.05.27	Fr, 28.05.27
1.4.7.5	Rückbau Flächengerüst Saal	15at	Mo, 04.10.27	Fr, 22.10.27
1.4.7.6	Stellung Fassadengerüst BA 2	5at	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27
1.4.7.7	Rückbau Fassadengerüst Flachdach	5at	Mo, 04.10.27	Fr, 08.10.27
1.4.7.8	Stellung Raumgerüst Halle	10at	Mo, 10.05.27	Mo, 24.05.27
1.4.7.9	Rückbau Fassadengerüst	15at	Mo, 25.10.27	Fr, 12.11.27
1.4.7.10	Rückbau Wandgerüste Saal	15at	Mo, 28.02.28	Fr, 17.03.28
1.4.8	**Los 18 - Stahlbaukonstruktionen**	**204at**	**Mo, 08.03.27**	**Do, 23.12.27**
1.4.8.1	Arbeitsvorbereitung	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.8.2	Werkplanung, Statik	28at	Mo, 22.03.27	Fr, 30.04.27
1.4.8.3	Produktion	37at	Mo, 03.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.8.4	Rückbau Stahlkonstruktion	15at	Mo, 07.06.27	Fr, 25.06.27
1.4.8.5	Montage neues Dach - Stahlbinder	10at	Mo, 28.06.27	Fr, 09.07.27
1.4.8.6	Montage neues Dach - Pfetten, Windrispen	15at	Mo, 28.06.27	Fr, 16.07.27
1.4.8.7	Montage Stahlfüße Flachdach	5at	Mo, 27.09.27	Fr, 01.10.27
1.4.8.8	Montage UK Lüftung Flachdach	10at	Mo, 29.11.27	Fr, 10.12.27
1.4.8.9	Rohmontage Stahlkonstruktion Lastenaufzug	15at	Mo, 15.11.27	Fr, 03.12.27
1.4.8.10	Lastenaufzug - Treppen, Podeste, Handläufe	10at	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27
1.4.8.11	Rohmontage Stahlkonstruktion Giebelanbau	9at	Mo, 13.12.27	Do, 23.12.27
1.4.8.12	Montage Stahltreppe+Regiebalkon	18at	Mi, 03.11.27	Fr, 26.11.27
1.4.8.13	Montage Stahlebene Requisiten	5at	Mo, 29.11.27	Fr, 03.12.27
1.4.9	**Los 19 - Metallbau, Schlosser**	**278at**	**Mo, 08.03.27**	**Do, 13.04.28**
1.4.9.1	Arbeitsvorbereitung	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
1.4.9.2	Werkplanung, Statik	28at	Mo, 22.03.27	Fr, 30.04.27
1.4.9.3	Produktion	37at	Mo, 03.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.9.4	Montage Stahltreppe+Regiebalkon	19at	Mo, 20.03.28	Do, 13.04.28
1.4.9.5	Montage Stahlebene Requisiten	10at	Mo, 06.03.28	Fr, 17.03.28
1.4.10	**Los 07 - Metallbau- und Fassadenarbeiten - Dacheindeckung, Einhausung**	**362kt**	**Mo, 22.03.27**	**Fr, 17.03.28**
1.4.10.1	Arbeitsvorbereitung	13at	Mo, 22.03.27	Fr, 09.04.27
1.4.10.2	Werkplanung, Statik	28at	Mo, 12.04.27	Fr, 21.05.27
1.4.10.3	Produktion, Lieferzeit	82kt	Mo, 19.04.27	Fr, 09.07.27
1.4.10.4	Rückbau bestehende Dachkonstruktion	15at	Mo, 31.05.27	Fr, 18.06.27
1.4.10.4.1	Rückbau Schieferschindeln Veranstaltungssaal	15at	Mo, 31.05.27	Fr, 18.06.27
1.4.10.5	Rückbau Schieferschindeln Attika	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27
1.4.10.6	Montage neues Dach, Saal - Trapezbleche+Abkleben	10at	Mo, 12.07.27	Fr, 23.07.27
1.4.10.7	Montage neues Dach, Attika - Dachdeckung	20at	Mo, 13.09.27	Fr, 08.10.27
1.4.10.8	Montage neues Dach - Wärmedämmung+UK	15at	Mo, 12.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.10.9	Montage neues Dach - Dachdeckung	30at	Mo, 19.07.27	Fr, 27.08.27
1.4.10.10	Dachentwässerung	10at	Mo, 19.07.27	Fr, 30.07.27
1.4.10.11	Montage Dach Lastenaufzug	10at	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27
1.4.10.12	Montage Dach Giebeleinhausung	10at	Mo, 10.01.28	Fr, 21.01.28
1.4.10.13	Montage Fassade Lastenaufzug	20at	Mo, 24.01.28	Fr, 18.02.28
1.4.10.14	Montage Fassade Giebelseite	20at	Mo, 21.02.28	Fr, 17.03.28
1.4.10.15	EXT: Montage PV-Anlage	20at	Mo, 30.08.27	Fr, 24.09.27
1.4.11	**Los 17 - Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten**	**112at**	**Mo, 05.04.27**	**Fr, 10.09.27**
1.4.11.1	Arbeitsvorbereitung, Aufmaß	15at	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27
1.4.11.2	Werkplanung	22at	Mo, 26.04.27	Fr, 28.05.27
1.4.11.3	Produktion und Lieferung	50at	Mo, 31.05.27	Fr, 06.08.27
1.4.11.4	Rückbau Elemente	20at	Mo, 26.07.27	Fr, 20.08.27
1.4.11.5	Montage Fenster+Fassadenelemente, Sonnenschutz	25at	Mo, 26.07.27	Fr, 27.08.27
1.4.11.6	Montage Sonnenschutz	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27
1.4.12	**Los 24 - Tischlerarbeiten, Faltwandanlage**	**234at**	**Mi, 28.04.27**	**Fr, 31.03.28**
1.4.12.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mi, 28.04.27	Fr, 28.05.27
1.4.12.2	Aufmaß	5at	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27
1.4.12.3	Werkplanung	10at	Mo, 07.06.27	Fr, 18.06.27
1.4.12.4	Produktion+Lieferzeit	40at	Mo, 21.06.27	Fr, 13.08.27
1.4.12.5	Montage Führungsschienen	10at	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.12.6	Montage Trennwände	10at	Mo, 20.03.28	Fr, 31.03.28
1.4.13	**Los 19 - Lüftung + Kälte**	**255at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 02.06.28**
1.4.13.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.13.2	Werkplanung	30at	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.13.3	Rohinstallation Lüftungskanäle	50at	Mo, 26.07.27	Fr, 01.10.27
1.4.13.4	Wetterschutzgitter in WDVS	10at	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.13.5	Roh-/Fertiginstallation Lüftung - Veranstaltungsaal	25at	Mo, 30.08.27	Fr, 01.10.27
1.4.13.6	Rohinstallation Lüftung - Zentrale	50at	Mo, 04.10.27	Fr, 10.12.27
1.4.13.7	Fertigmontage Lüftung	165at	Mo, 04.10.27	Fr, 02.06.28
1.4.14	**Los 20 - ELT I, Stark- und Schwachstrom**	**255at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 02.06.28**
1.4.14.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.14.2	Werkplanung	70at	Mo, 14.06.27	Fr, 17.09.27
1.4.14.3	Trassemontagen	30at	Mo, 26.07.27	Fr, 03.09.27
1.4.14.4	Rohinstallation Elektro	89at	Mo, 23.08.27	Do, 23.12.27
1.4.14.5	Fertigmontage Elektro	106at	Mo, 03.01.28	Fr, 02.06.28
1.4.15	**Los 23 - Medientechnik**	**255at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 02.06.28**
1.4.15.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.15.2	Werkplanung	30at	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.15.3	Rohinstallation Veranstaltungstechnik	50at	Mo, 26.07.27	Fr, 01.10.27
1.4.15.4	Fertigmontage Veranstaltungstechnik	51at	Mo, 20.03.28	Fr, 02.06.28

erstellt mit easyPlan 2020 [ver.Plus 2020] - Service-Nr.: 2PK74.20040/4434 - powered by: bsp prohaska &Schabauer


Projektzeitrahmen von Mo, 01.01.24 bis Mi, 31.10.29
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 03.11.2026 16:12
Filter:
Bearbeiter: vvrbanic

hkr architekten
Altenhaßlauer Straße 21
Gelnhausen
Tel. +49 6051 91288-0
Fax +49 6051 91288-10
e-Mail: kontakt@hkr-architekten.de

Projektnummer:

20008 Stadthalle Gelnhausen, Sanierung - mit VgV

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.4.16	**Los 24 - Heizungsarbeiten**	**255at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 02.06.28**
1.4.16.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.16.2	Werkplanung	30at	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.16.3	Rohinstallation Heizung	50at	Mo, 26.07.27	Fr, 01.10.27
1.4.16.4	Montage Heizdecken	40at	Mo, 09.08.27	Fr, 01.10.27
1.4.16.5	Heizzentrale	50at	Mo, 04.10.27	Fr, 10.12.27
1.4.16.6	Fertiginstallation Heizung	51at	Mo, 20.03.28	Fr, 02.06.28
1.4.17	**Los 25 - Sanitärarbeiten**	**263at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 16.06.28**
1.4.17.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.17.2	Werkplanung	30at	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.17.3	Rohinstallation Sanitär	75at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.12.27
1.4.17.4	Fertigmontage Sanitär	59at	Mo, 20.03.28	Fr, 16.06.28
1.4.18	**Los 26 - Küchentechnik**	**273at**	**Mo, 31.05.27**	**Fr, 30.06.28**
1.4.18.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 31.05.27	Fr, 25.06.27
1.4.18.2	Werkplanung	30at	Mo, 14.06.27	Fr, 23.07.27
1.4.18.3	Lieferzeit	40at	Mo, 26.07.27	Fr, 17.09.27
1.4.18.4	Einbau Kühlzellen und -technik	50at	Mo, 30.08.27	Fr, 05.11.27
1.4.18.5	Installation Küchentechnik	51at	Mo, 20.03.28	Fr, 02.06.28
1.4.18.6	Loses Mobiliar Küchentechnik	18at	Di, 06.06.28	Fr, 30.06.28
1.4.19	**Los 22 - Trockenbauarbeiten, Wände**	**169at**	**Mo, 07.06.27**	**Fr, 04.02.28**
1.4.19.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 07.06.27	Fr, 02.07.27
1.4.19.2	Innendämmung AW+Decken	15at	Mo, 05.07.27	Fr, 23.07.27
1.4.19.3	Trockenbauwände UK und 1seitig	25at	Mo, 26.07.27	Fr, 27.08.27
1.4.19.4	Trockenbauverkleidung Stahlbinder+Dachraum	20at	Mo, 30.08.27	Fr, 24.09.27
1.4.19.5	2te Seite schließen	14at	Mo, 06.12.27	Do, 23.12.27
1.4.19.6	Spachteln	20at	Mo, 10.01.28	Fr, 04.02.28
1.4.20	**Los 16 - WDVS**	**60at**	**Mo, 02.08.27**	**Fr, 22.10.27**
1.4.20.1	Arbeitsvorbereitung	15at	Mo, 02.08.27	Fr, 20.08.27
1.4.20.2	Vorbereit. Maßnahmen	15at	Mo, 23.08.27	Fr, 10.09.27
1.4.20.3	WDVS	40at	Mo, 30.08.27	Fr, 22.10.27
1.4.21	**Los 23 - Tischlerarbeiten, Wandverkleidung Halle+Foyer**	**144at**	**Mo, 02.08.27**	**Fr, 25.02.28**
1.4.21.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 02.08.27	Fr, 27.08.27
1.4.21.2	Aufmaß	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27
1.4.21.3	Werkplanung	20at	Mo, 13.09.27	Fr, 08.10.27
1.4.21.4	Produktion+Lieferzeit	54at	Mo, 11.10.27	Do, 23.12.27
1.4.21.5	Montage	84at	Mo, 25.10.27	Fr, 25.02.28
1.4.22	**Los 28 - Tischlerarbeiten, Innentüren**	**183at**	**Mo, 04.10.27**	**Fr, 30.06.28**
1.4.22.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 04.10.27	Fr, 29.10.27
1.4.22.2	Rückbau Türzargen+Aufmaß	15at	Mo, 01.11.27	Fr, 19.11.27
1.4.22.3	Werkplanung	20at	Mo, 01.11.27	Fr, 26.11.27
1.4.22.4	Produktion und Lieferzeit	74at	Mo, 29.11.27	Fr, 17.03.28
1.4.22.5	Montage Zargen	32at	Mo, 20.03.28	Fr, 05.05.28
1.4.22.6	Montage Innentüren	18at	Di, 06.06.28	Fr, 30.06.28
1.4.23	**Los 29 - Metallbauarbeiten, Brandschutztüren**	**183at**	**Mo, 04.10.27**	**Fr, 30.06.28**
1.4.23.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 04.10.27	Fr, 29.10.27
1.4.23.2	Rückbau Türzargen+Aufmaß	15at	Mo, 01.11.27	Fr, 19.11.27
1.4.23.3	Werkplanung	20at	Mo, 01.11.27	Fr, 26.11.27
1.4.23.4	Produktion und Lieferzeit	74at	Mo, 29.11.27	Fr, 17.03.28
1.4.23.5	Montage Zargen	32at	Mo, 20.03.28	Fr, 05.05.28
1.4.23.6	Montage Stahlblechtüren	18at	Di, 06.06.28	Fr, 30.06.28
1.4.24	**Los 20 - Innenputz- + Malerarbeiten**	**201kt**	**Mo, 06.12.27**	**Fr, 23.06.28**
1.4.24.1	Arbeitsvorbereitung	19at	Mo, 06.12.27	Fr, 07.01.28
1.4.24.2	Innenputzarbeiten	25at	Mo, 10.01.28	Fr, 11.02.28
1.4.24.3	Trocknungszeit Innenputz	35kt	Sa, 12.02.28	Fr, 17.03.28
1.4.24.4	Wandbeschichtung/Tapezierarbeiten	32at	Mo, 20.03.28	Fr, 05.05.28
1.4.24.5	Malerarbeiten	32at	Mo, 08.05.28	Fr, 23.06.28
1.4.25	**Los 30 - Trockenbau, Abgeh. Decken**	**117at**	**Do, 09.12.27**	**Fr, 02.06.28**
1.4.25.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Do, 09.12.27	Do, 13.01.28
1.4.25.2	Produktion+Lieferzeit	20at	Fr, 14.01.28	Do, 10.02.28
1.4.25.3	Abgeh. Decken	76at	Mo, 14.02.28	Fr, 02.06.28
1.4.26	**Los 21 - Estricharbeiten**	**103kt**	**Mo, 17.01.28**	**Fr, 28.04.28**
1.4.26.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 17.01.28	Fr, 11.02.28
1.4.26.2	Wärmedämmung/Trittschalldämmung	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28
1.4.26.3	Zementestrich	20at	Mo, 21.02.28	Fr, 17.03.28
1.4.26.4	Trocknungszeit	42kt	Sa, 18.03.28	Fr, 28.04.28
1.4.27	**Los 27 - Fliesenarbeiten**	**89at**	**Mo, 07.02.28**	**Fr, 16.06.28**
1.4.27.1	Arbeitsvorbereitung	30at	Mo, 07.02.28	Fr, 17.03.28
1.4.27.2	Fliesenarbeiten, Wand	46at	Mo, 20.03.28	Fr, 26.05.28
1.4.27.3	Fliesenarbeiten, Boden	40at	Di, 18.04.28	Fr, 16.06.28
1.4.28	**Los 25 - Bodenbelagsarbeiten, Parkett**	**67at**	**Mo, 14.02.28**	**Fr, 19.05.28**
1.4.28.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 14.02.28	Fr, 10.03.28
1.4.28.2	Produktion+Lieferzeit	24at	Mo, 13.03.28	Do, 13.04.28
1.4.28.3	Bodenbelagsarbeiten, Parkett	23at	Di, 18.04.28	Fr, 19.05.28
1.4.29	**Los 25 - Naturstein- und Plattenarbeiten**	**67at**	**Mo, 14.02.28**	**Fr, 19.05.28**
1.4.29.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 14.02.28	Fr, 10.03.28
1.4.29.2	Produktion+Lieferzeit	24at	Mo, 13.03.28	Do, 13.04.28
1.4.29.3	Naturstein- und Plattenarbeiten	23at	Di, 18.04.28	Fr, 19.05.28
1.4.30	**Los 25 - Bodenbelagsarbeiten, Kautschuk**	**66at**	**Mo, 28.02.28**	**Fr, 02.06.28**
1.4.30.1	Arbeitsvorbereitung	20at	Mo, 28.02.28	Fr, 24.03.28
1.4.30.2	Produktion+Lieferzeit	23at	Mo, 27.03.28	Fr, 28.04.28

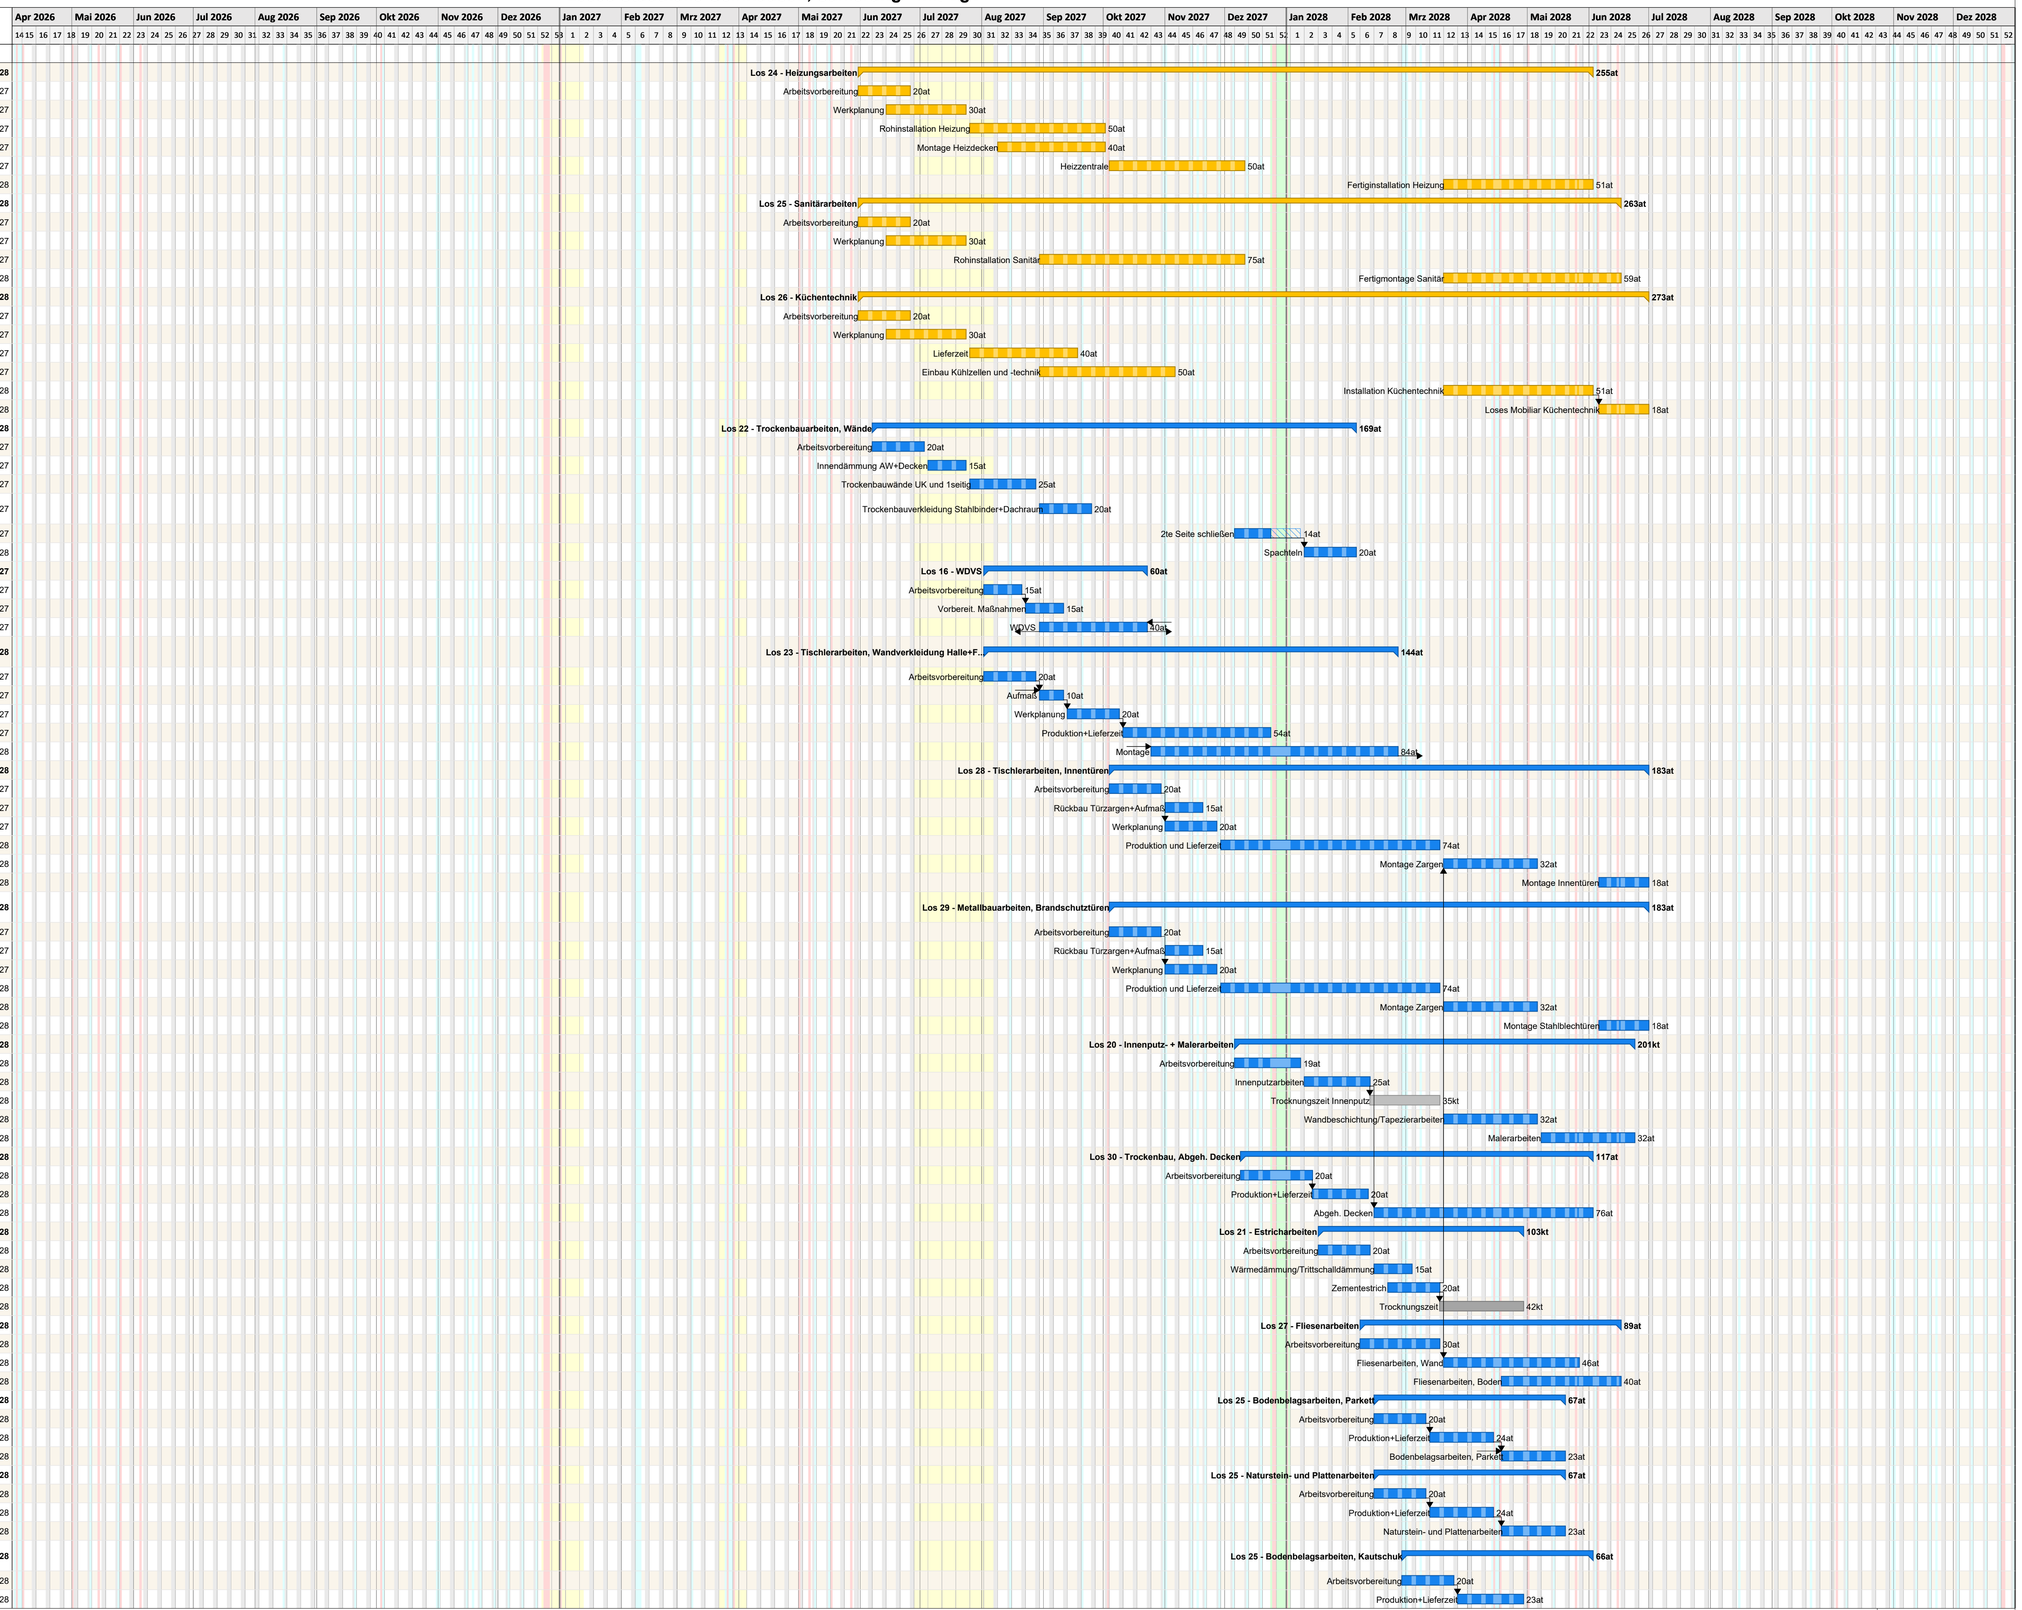


vorlh.apt.pro.Bau.MS Project Pro 2019 - kann für APLUS/MASTER - Users/Für Ihre individuelle Einführung

hkr. architekten
Altenhaßlauer Straße 21
Gelnhausen
Tel. +49 6051 91288-0
Fax +49 6051 91288-10
e-Mail: kontakt@hkr-architekten.de

Projektnummer:

20008 Stadthalle Gelnhausen, Sanierung - mit VgV

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.4.30.3	Bodenbelagsarbeiten, Kautschuk	23at	Di, 02.05.28	Fr, 02.06.28
1.4.31	Mängelbeseitigung	23at	Mo, 29.05.28	Fr, 30.06.28
1.4.32	SV-Abnahmen	30at	Mo, 03.07.28	Fr, 11.08.28
1.4.33	Inbetriebnahme	10at	Mo, 14.08.28	Fr, 25.08.28
1.4.34	Schlussrechnungen, Verwendungsnachweis	65at	Mo, 28.08.28	Mo, 27.11.28
2	**Förderbescheid**	**1828kt**	**Do, 04.01.24**	**Do, 04.01.29**
2.1	Datum Förderbescheid	1at	Do, 04.01.24	Do, 04.01.24
2.2	Laufzeit 30 Monate	912kt	Fr, 05.01.24	Sa, 04.07.26
2.3	Verlängerung max. 30 Monate	915kt	So, 05.07.26	Do, 04.01.29

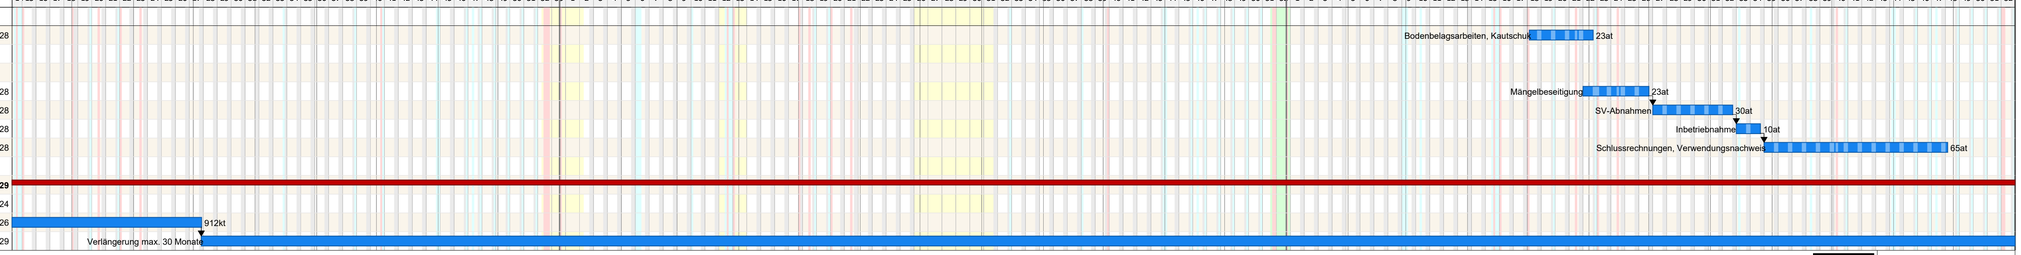

Projektzeitrahmen von Mo, 01.01.24 bis Mi, 31.10.29
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 03.11.2026 16:12
Filter:
Bearbeiter: vvrbanic

hkr. architekten

Altenhaßlauer Straße 21
Gelnhausen
Tel. +49 6051 91288-0
Fax +49 6051 91288-10
e-Mail: kontakt@hkr-architekten.de

erstellt mit der Plus 2003 Lizenz für: HKR ARCHITEKTEN - Lizenz für das Architektur Gelnhausen
