
Neubau Erweiterung Lorsbacher Schule
Bornstraße 19, 65719 Hofheim am Taunus, Hessen

KULLA Architektur GmbH
Hauptstraße 29
65795 Hattersheim

Nr.	Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Text1	Vorgänger
1		**Planungszeit bis Beginn Rohbau**	**482 Tage**	**Mon 14.08.23**	**Mit 16.07.25**		
29		**Abbruch Toiletten**	**90 Tage**	**Mon 20.11.23**	**Fre 05.04.24**		
34		**Bauzeit Neubau**	**711 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Die 08.06.27**		
35		**SOMMERFERIEN 2024**	30 Tage	Mon 22.07.24	Fre 30.08.24		
36		**Maßnahmen Bestand Sommerferien**	**28 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Mit 28.08.24**		
43		**Rohbau**	**590 Tage**	**Mon 30.09.24**	**Mon 01.03.27**	**Rohbau**	
44		**HERBSTFERIEN 2024**	10 Tage	Mon 14.10.24	Fre 25.10.24		
45		**Baugrube inkl. Bohrpfahl- und Wasserhaltung**	**543 Tage**	**Mon 30.09.24**	**Mon 07.12.26**		
60		**Krangründung**	**20 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 18.07.25**		
64		**SOMMERFERIEN 2025**	30 Tage	Mon 07.07.25	Fre 15.08.25		
65		**Rohbauarbeiten**	**216 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Mit 17.06.26**		
83		**Holzbau**	**135 Tage**	**Fre 28.11.25**	**Fre 26.06.26**		
94		**Gerüst**	**214 Tage**	**Don 26.03.26**	**Mon 15.02.27**		
95		Aufbau Gerüst	5 Tage	Don 26.03.26	Mit 01.04.26	Hühn Gerüstbau	59;80EA-2 Tage
96		Abbau Gerüst Dach Foyer	1 Tag	Mit 17.06.26	Mit 17.06.26	Hühn Gerüstbau	89
97		Aufbau Gerüst auf Dach Foyer	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	Hühn Gerüstbau	91;92
98		Abbau Gerüst	3 Tage	Don 11.02.27	Mon 15.02.27	Hühn Gerüstbau	167EA+15 Tage;95;170;103
99		**Dachdeckung**	**161 Tage**	**Mit 01.07.26**	**Mon 01.03.27**		
100		Dachrand Ortgang und Traufen	15 Tage	Mit 01.07.26	Die 21.07.26	Klemens Ott GmbH	**92;97**
101		Kal-Zip Deckung	20 Tage	Mit 22.07.26	Die 18.08.26	Klemens Ott GmbH	100
102		Dach Eingangshalle	10 Tage	Die 16.02.27	Mon 01.03.27	Klemens Ott GmbH	92;91;98
103		Attikableche und Fallrohre	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	Klemens Ott GmbH	101
104		**Fenster**	**160 Tage**	**Fre 20.02.26**	**Fre 09.10.26**		
105		Werkplanung Fenster	40 Tage	Fre 20.02.26	Die 21.04.26	Wiese GmbH	106AE-5 Tage
106		Produktion Fenster	40 Tage	Die 28.04.26	Mon 29.06.26	Wiese GmbH	107AE
107		Einbau Fenster 1. OG	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	Wiese GmbH	92;90AA,91AE
108		Einbau Fenster EG	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	Wiese GmbH	107EA-5 Tage
109		Einbau Pfosten- Riegel EG + KG	60 Tage	Mon 20.07.26	Fre 09.10.26	Wiese GmbH	92EE+10 Tage;106;107;108AA Tage
110		Einbau Pfosten- Riegel Eingangshalle	50 Tage	Mon 03.08.26	Fre 09.10.26	Wiese GmbH	108;91
111		**SOMMERFERIEN 2026**	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26		
112		**Haustechnik**	**219 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Die 08.06.27**		
113		**Haustechnik Lüftung**	**217 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Die 08.06.27**		
114		Baustelleneinrichtung Lüftung	3 Tage	Mit 22.07.26	Fre 24.07.26	Erben & Hesse GmbH	107EA+2 Tage
115		Rohinstallation Lüftung 1. OG	16 Tage	Mon 27.07.26	Mon 17.08.26	Erben & Hesse GmbH	114
116		Rohinstallation Lüftung EG	21 Tage	Die 04.08.26	Die 01.09.26	Erben & Hesse GmbH	115EA-10 Tage;108EA-2 Tage
117		Rohinstallation Lüftung UG	17 Tage	Die 06.10.26	Mit 28.10.26	Erben & Hesse GmbH	116EA-3 Tage;109EA-4 Tage
118		Montage Lüftungszentrale	26 Tage	Mit 19.08.26	Mit 23.09.26	Erben & Hesse GmbH	115EA+1 Tag
119		Rohinstallation Lüftung EG Aula	5 Tage	Die 04.08.26	Mon 10.08.26	Erben & Hesse GmbH	109AA+11 Tage
120		Installation Quelluftauslässe	10 Tage	Don 07.01.27	Mit 20.01.27	Erben & Hesse GmbH	172;138
121		Lieferung und Aufstellung Lüftungstürme	2 Tage	Die 23.02.27	Mit 24.02.27	Erben & Hesse GmbH	98EA+5 Tage
122		Fertigmontage Lüftung (Drallauslässe, etc.)	20 Tage	Don 21.01.27	Mit 17.02.27	Erben & Hesse GmbH	138;158EE
123		Inbetriebnahme Lüftung (Abgleich, etc.)	4 Tage	Don 29.04.27	Die 04.05.27	Erben & Hesse GmbH	196AA+5 Tage
124		Sachverständigenabnahme Lüftung	2 Tage	Fre 30.04.27	Mon 03.05.27	Erben & Hesse GmbH	123AA+1 Tag;196AA+5 Tage
125		Probelauf Lüftung	23 Tage	Mit 05.05.27	Fre 04.06.27	Erben & Hesse GmbH	123;196AA+5 Tage
126		Abnahme Lüftung	2 Tage	Mon 07.06.27	Die 08.06.27	MTK	124;125;196AA+5 Tage
127		**Haustechnik Heizung/ Sanitär**	**188 Tage**	**Mit 05.08.26**	**Mit 12.05.27**		
128		Baustelleneinrichtung Heizung/ Sanitär	3 Tage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26	Geck Vodanovic GmbH	107EA+4 Tage;155EA-3 Tage
129		Rohinstallation Heizung/ Sanitär 1. OG	7 Tage	Mon 10.08.26	Die 18.08.26	Geck Vodanovic GmbH	114;128
130		Rohinstallation Heizung/ Sanitär EG	16 Tage	Don 20.08.26	Don 10.09.26	Geck Vodanovic GmbH	129EA+1 Tag;108EA-1 Tag
131		Rohinstallation Heizung/ Sanitär UG	17 Tage	Die 06.10.26	Mit 28.10.26	Geck Vodanovic GmbH	130EA-3 Tage;109EA-4 Tage
132		Montage Heizung/ Sanitär Lüftungszentrale	26 Tage	Mit 26.08.26	Mit 30.09.26	Geck Vodanovic GmbH	118EE;129EA+5 Tage
133		Fertigmontage Sanitär (WC-Anlagen, Klassen, Küchen)	13 Tage	Mon 05.04.27	Mit 21.04.27	Geck Vodanovic GmbH	156;171EA-5 Tage;178EA-13 Taee;180;190AE
134		Mikrobiologische Wasseruntersuchungen	6 Tage	Mon 03.05.27	Mon 10.05.27	Geck Vodanovic GmbH	178EA-13 Tage;190AE;196AA+ Taee
135		Abnahme Heizung / Sanitär	2 Tage	Die 11.05.27	Mit 12.05.27	MTK	134
136		**Fußbodenheizung**	**67 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mit 20.01.27**		
137		Verlegung Fußbodenheizung 1. OG	2 Tage	Mon 16.11.26	Die 17.11.26	Geck Vodanovic GmbH	172EA-5 Tage
138		Funktionsheizen 1. OG	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	Geck Vodanovic GmbH	172EA+15 Tage
139		Verlegung Fußbodenheizung EG	2 Tage	Mon 23.11.26	Die 24.11.26	Geck Vodanovic GmbH	173EA-5 Tage
140		Funktionsheizen EG	5 Tage	Don 07.01.27	Mit 13.01.27	Geck Vodanovic GmbH	173EA+15 Tage
141		Verlegung Fußbodenheizung UG	2 Tage	Mon 30.11.26	Die 01.12.26	Geck Vodanovic GmbH	173
142		Funktionsheizen UG	5 Tage	Don 14.01.27	Mit 20.01.27	Geck Vodanovic GmbH	174EA+15 Tage
143		Inbetriebnahme und Probelauf Heizung	22 Tage	Don 01.10.26	Fre 30.10.26	Geck Vodanovic GmbH	147AA
144		**MSR-Anlage**	**209 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Die 08.06.27**		
145		Lieferung und Aufstellung Schaltanlage	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26		
146		Anschlussarbeiten, Installation Feldgeräte	24 Tage	Die 04.08.26	Fre 04.09.26		145
147		Inbetriebnahme MSR-Technik	34 Tage	Don 01.10.26	Die 17.11.26		146EA+18 Tage
148		Abnahme MSR-Technik	2 Tage	Mon 07.06.27	Die 08.06.27	MTK	126AA
149		**Haustechnik Elektro**	**195 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mit 05.05.27**		
150		Elektro Rohinstallation	35 Tage	Mon 20.07.26	Fre 04.09.26		155AA-5 Tage
151		Montage Photovoltaik	20 Tage	Mit 02.09.26	Die 29.09.26		101EA+10 Tage
152		Elektro Fertiginstallation	20 Tage	Don 08.04.27	Mit 05.05.27		156;171EA-5 Tage;178EA-10 Taee;180
153		**Ausbau**	**180 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 21.04.27**		
154		**Trockenbau**	**135 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 17.02.27**		
155		Wände 1. OG bis KG (einseitig beplankt)	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	MS Trockenbau	99AA+7 Tage;107;108EA-5 Taee
156		Fertigstellung Wände 1. OG bis KG	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	MS Trockenbau	107;150EA+20 Tage
157		Fertigspachtelung Wände 1. OG bis KG	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	MS Trockenbau	174
158		Montage abgehängte Decken 1. OG bis KG	30 Tage	Don 07.01.27	Mit 17.02.27	MS Trockenbau	156EA+5 Tage;174EA-10 Taee;157
159		**HERBSTFERIEN 2026**	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		
160		**Innenputz**	**10 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 06.11.26**		
161		Innenputz KG	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	Kurtulan	150AA+15 Tage;109EA+10 Taee
162		**Schlosser**	**75 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Mit 17.02.27**		
163		Planung Schlosser	10 Tage	Mon 19.10.26	Mon 02.11.26	Schmickler	165AE-50 Tage
164		Treppengeländer Haupttreppe	10 Tage	Don 17.12.26	Mon 18.01.27	Schmickler	171EA+5 Tage
165		Stahltreppe Außen	15 Tage	Don 28.01.27	Mit 17.02.27	Schmickler	167AA;170EA-10 Tage
166		**Holzfassade**	**40 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Mit 13.01.27**		
167		Holzfassade EG + OG	40 Tage	Mon 02.11.26	Mit 13.01.27	BP Fassaden	90;109EA+15 Tage
168		**WEIHNACHTSFERIEN 2026**	13 Tage	Mit 23.12.26	Fre 22.01.27		
169		**Wärmedämmverbundsystem**	**20 Tage**	**Don 14.01.27**	**Mit 10.02.27**		
170		Wärmedämmverbundsystem KG	20 Tage	Don 14.01.27	Mit 10.02.27	Kurtulan	167;109
171		**Estrich**	**23 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mit 09.12.26**		
172		Estrich 1. OG	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	Damian Werner	156EA-17 Tage;115;129;150;1
173		Estrich EG	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	Damian Werner	156EA-12 Tage;172EA-5 Tage
174		Estrich KG	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	Damian Werner	173EA-5 Tage;161EA-5 Taee;108EA-5 Taee
175		Estrich Eingangshalle	3 Tage	Mon 07.12.26	Mit 09.12.26	Damian Werner	110;174
176		**Maler**	**55 Tage**	**Don 04.02.27**	**Mit 21.04.27**		
177		Voranstrich Wände 1. OG - KG	20 Tage	Don 04.02.27	Mit 03.03.27		158EA-10 Tage
178		Schlussanstrich Wände 2. OG - KG	15 Tage	Don 01.04.27	Mit 21.04.27		183EA-5 Tage
179		**Fliesen**	**45 Tage**	**Don 21.01.27**	**Mit 24.03.27**		
180		Fliesen WC- Räume	25 Tage	Don 21.01.27	Mit 24.02.27		172EA+30 Tage;156EA+15 Taee
181		Fliesen Küche	20 Tage	Don 11.02.27	Mit 10.03.27		193;173EA+20 Tage
182		Bodenfliese Eingangshalle	10 Tage	Don 11.03.27	Mit 24.03.27		175EA+15 Tage;181
183		**Bodenbelag**	**25 Tage**	**Don 04.03.27**	**Mit 07.04.27**		**177**
184		Bodenbelag 1. OG	10 Tage	Don 04.03.27	Mit 17.03.27		172EA+25 Tage;180EA-10 Taee;158EA-10
185		Bodenbelag EG	10 Tage	Don 11.03.27	Mit 24.03.27		173EA+30 Tage;180;158EA-10 Taee;177;184EA-5
186		Bodenbelag KG	10 Tage	Don 25.03.27	Mit 07.04.27		158EA-15 Tage;177;185
187		**Innentüren Tischler**	**95 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mit 07.04.27**		
188		Arbeitsvorbereitung/ Produktion Holzinnentüren	10 Tage	Mon 09.11.26	Mon 23.11.26		189AE-50 Tage
189		Einbau Türzargen Räume	10 Tage	Don 18.02.27	Mit 03.03.27		177EA-10 Tage
190		Einbau Türblätter	15 Tage	Don 18.03.27	Mit 07.04.27		195AA;184
191		**Innentüren Metallbau**	**55 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mit 10.02.27**		
192		Arbeitsvorbereitung/ Produktion Metallinnentüren	10 Tage	Mon 09.11.26	Mon 23.11.26		193AE-30 Tage
193		Alumnium- und Stahltüren	15 Tage	Don 21.01.27	Mit 10.02.27		174EA+20 Tage
194		**Einbau Küche**	10 Tage	Don 11.03.27	Mit 24.03.27		181
195		**Einbaumöbel**	15 Tage	Don 18.03.27	Mit 07.04.27		158EA+5 Tage;184
196		**Fertigstellung Neubau + Gebäudereinigung**	15 Tage	Don 22.04.27	Mit 12.05.27		183;187;195AA-5 Tage;178;194AA-5 Taee
197		**Außenanlagen**	**60 Tage**	**Die 02.03.27**	**Mon 24.05.27**		
198		Ausführung Außenanlagen	60 Tage	Die 02.03.27	Mon 24.05.27		167;98EA+10 Tage
199		**Bauaufsichtliche Abnahmen**	**7 Tage**	**Die 08.06.27**	**Mit 16.06.27**		
200		Abnahme Sachverständiger Brandschutz	1 Tag	Die 08.06.27	Die 08.06.27	HZB	196EE+5 Tage;198EA+10 Taee;135-124EA+10
201		Abnahme BA Neubau	1 Tag	Mit 16.06.27	Mit 16.06.27	MTK Bauaufsicht	196EE+5 Tage;198EA+10 Taee;135-124EA+5

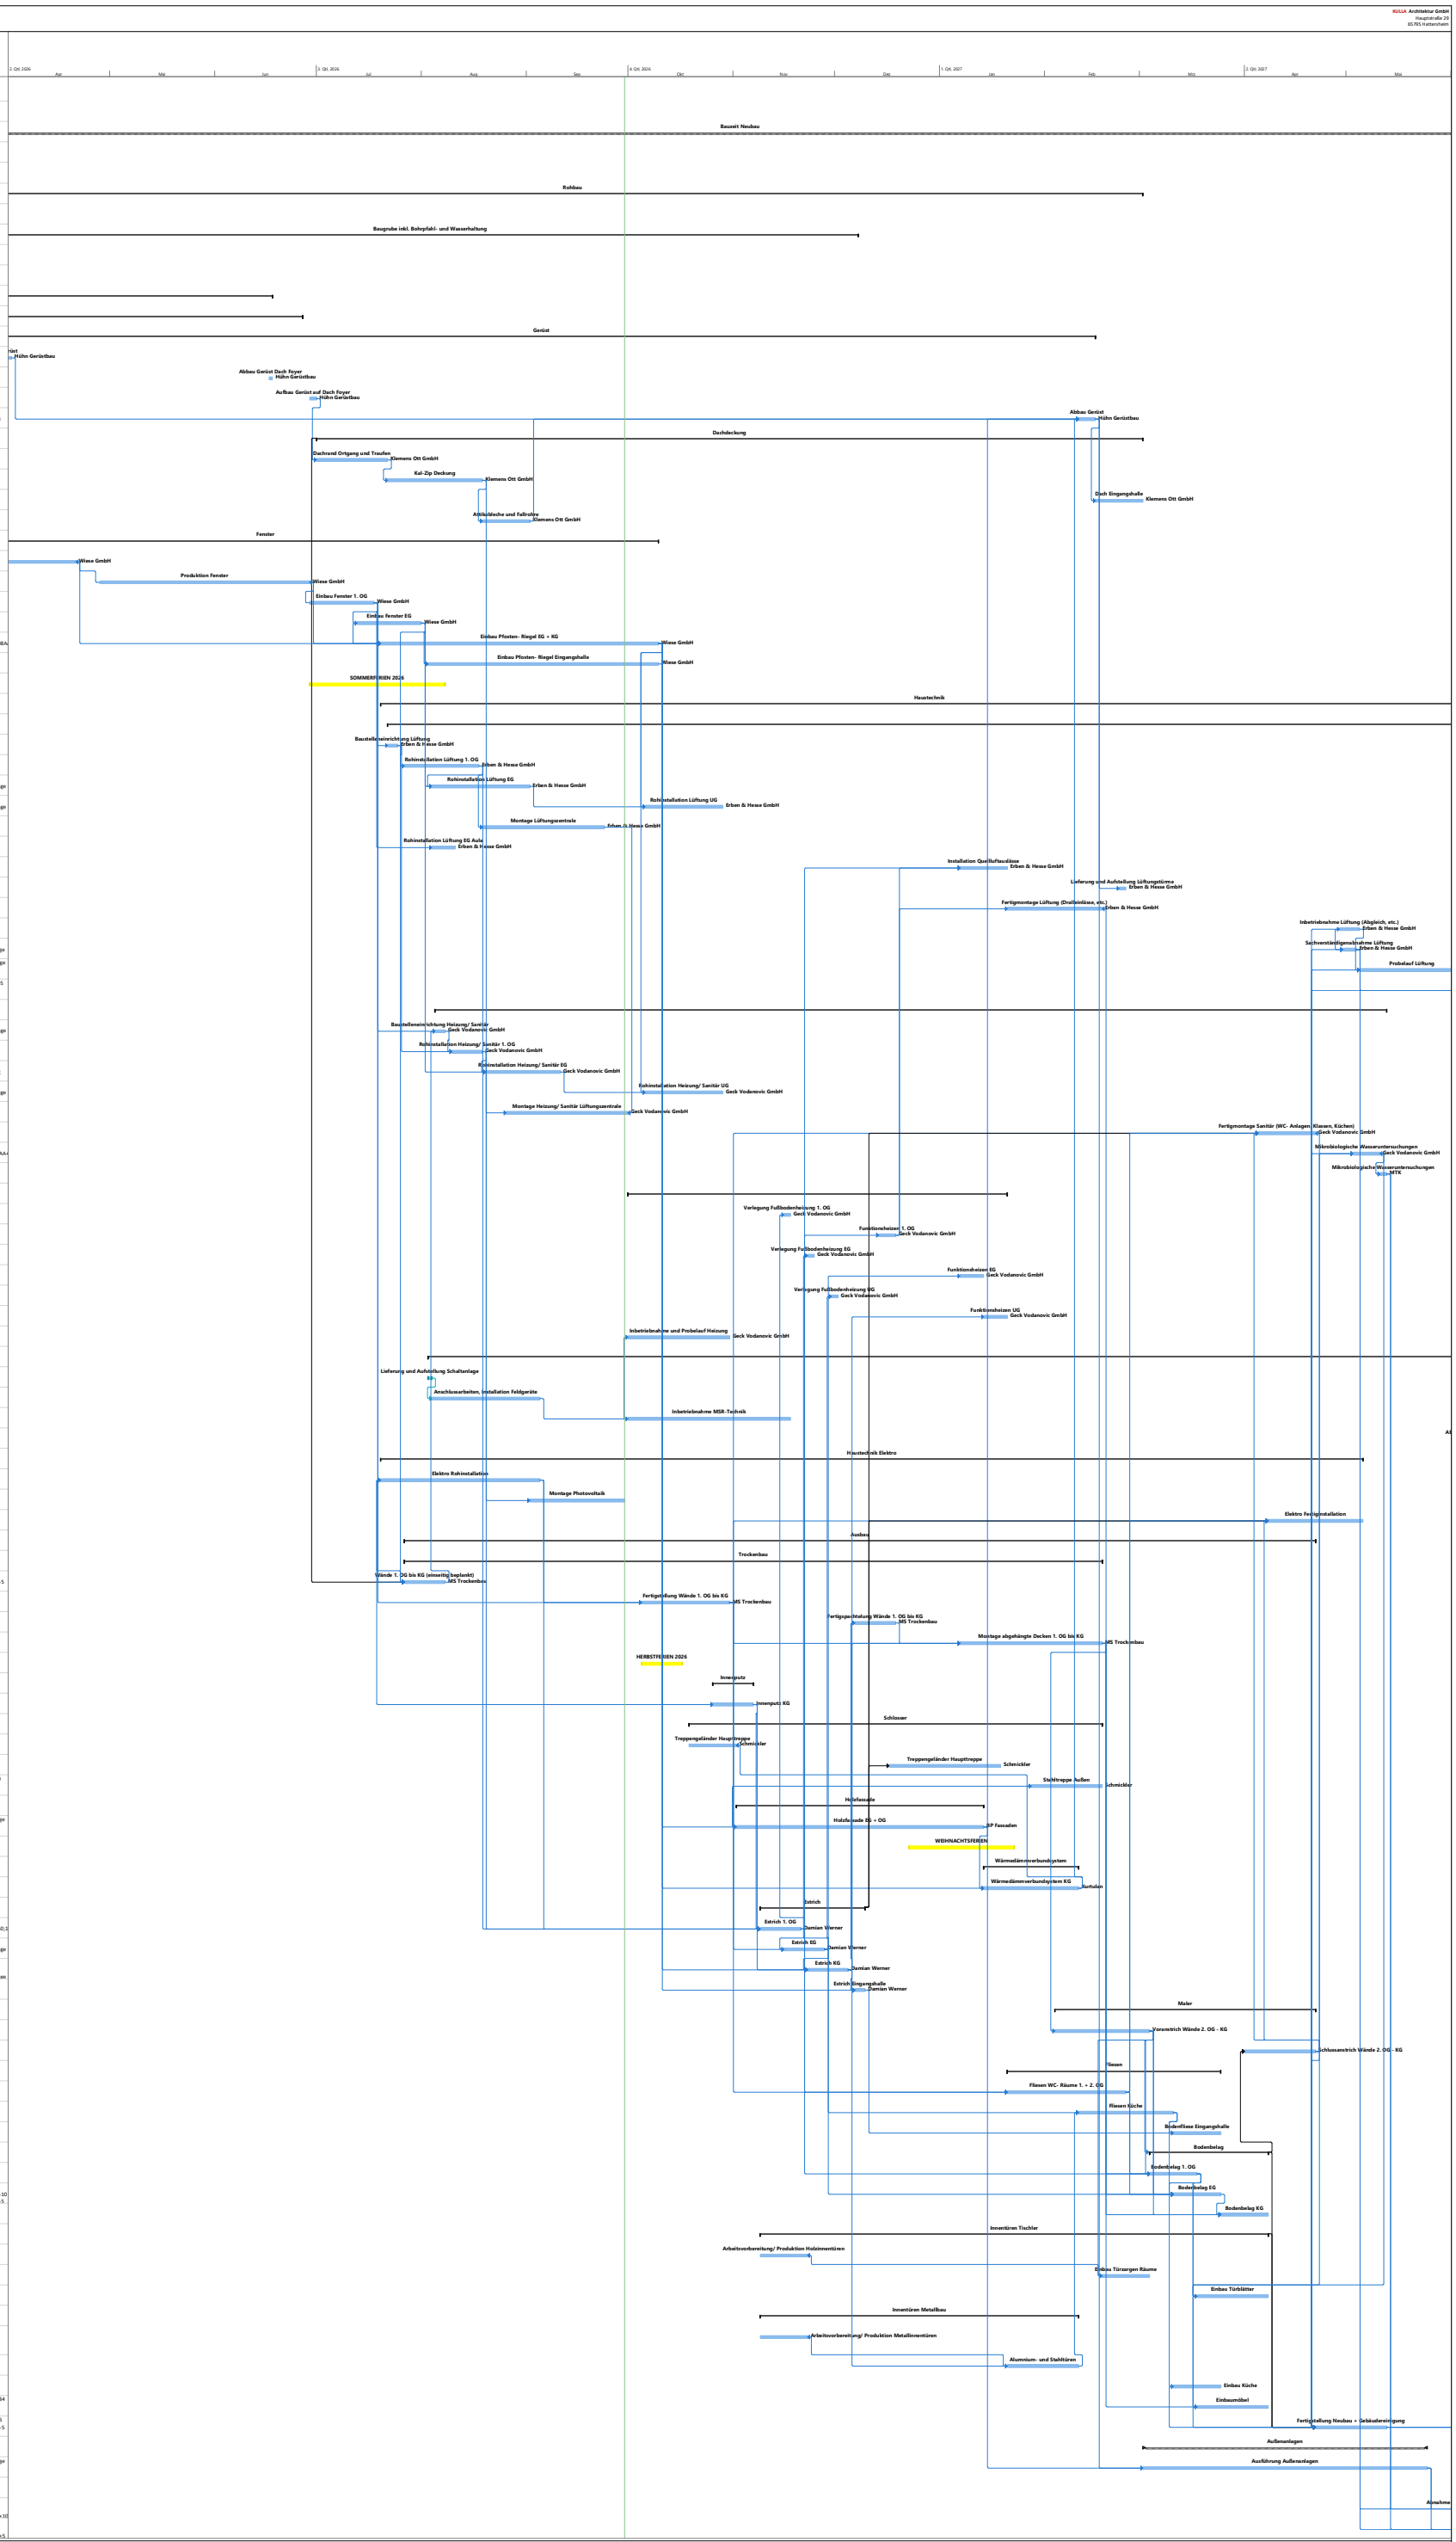

Projektzeitenplan Lorsbacher S
Stand: Mit 30.09.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt
