Neubau Erweiterung Lorsbacher Schule
Bornstraße 19, 65719 Hofheim im Taunus, Hessen

KUULA Architektur GmbH
Hauptstraße 29
65795 Hattersheim
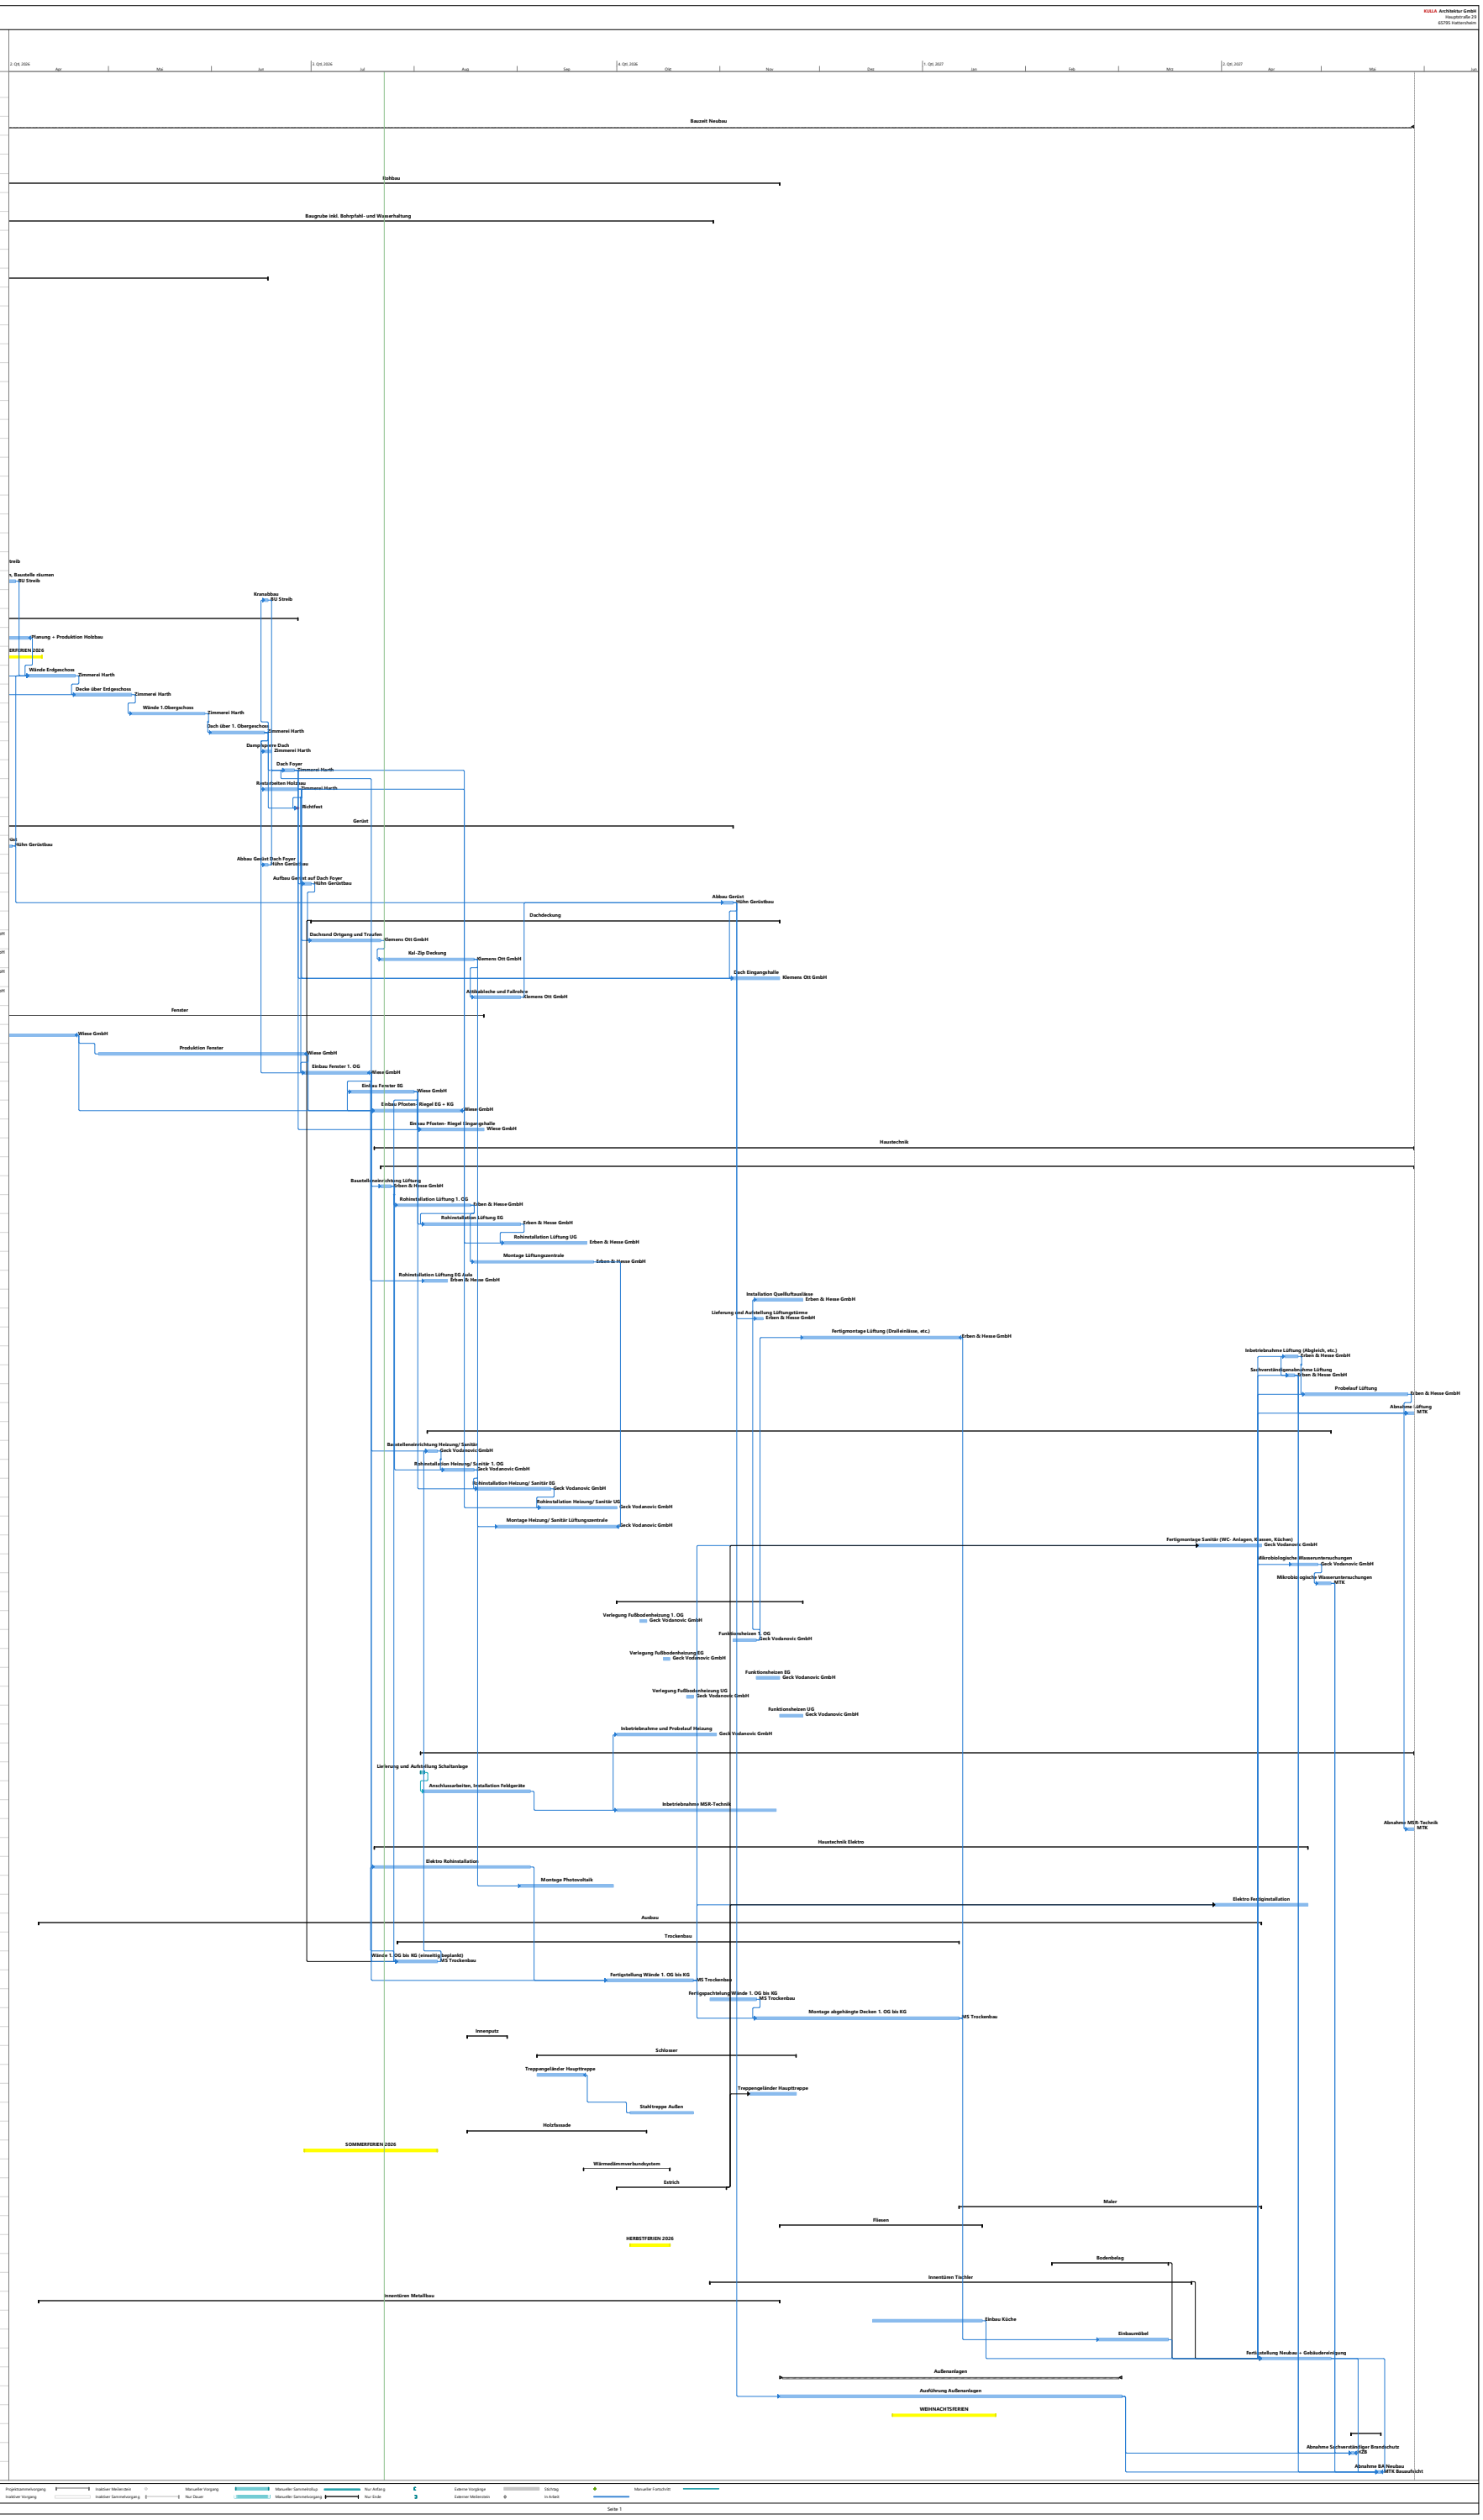
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Text1
1	**Planungszeit bis Beginn Rohbau**	**482 Tage**	**Mon 14.08.23**	**Mit 16.07.25**	
29	**Abbruch Toiletten**	**90 Tage**	**Mon 20.11.23**	**Fre 05.04.24**	
34	**Bauzeit Neubau**	**704 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Fre 28.05.27**	
35	**SOMMERFERIEN 2024**	30 Tage	Mon 22.07.24	Fre 30.08.24	
36	**Maßnahmen Bestand Sommerferien**	**28 Tage**	**Mon 22.07.24**	**Mit 28.08.24**	
43	**Rohbau**	**530 Tage**	**Mon 30.09.24**	**Mit 18.11.26**	**Rohbau**
44	**HERBSTFERIEN 2024**	10 Tage	Mon 14.10.24	Fre 25.10.24	
45	**Baugrube inkl. Bohrpfahl- und Wasserhaltung**	**516 Tage**	**Mon 30.09.24**	**Don 29.10.26**	
60	**Krangründung**	**20 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 18.07.25**	
64	**SOMMERFERIEN 2025**	30 Tage	Mon 07.07.25	Fre 15.08.25	
65	**Rohbauarbeiten**	**216 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Mit 17.06.26**	
66	Baustelleneinrichtung Rohbau	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	BU Streib
67	Gründungs-und Dämmarbeiten Bodenplatte	5 Tage	Die 29.07.25	Mon 04.08.25	BU Streib
68	Frischbetonverbundfolie Bodenplatte Untergeschoss	7 Tage	Die 05.08.25	Mit 13.08.25	BU Streib
69	Grundleitungen und Schacht	5 Tage	Don 14.08.25	Mit 20.08.25	BU Streib
70	Bodenplatte Untergeschoss inkl. Grundleitungen	10 Tage	Don 14.08.25	Mit 27.08.25	BU Streib
71	Betonplatte Arbeitsraum	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	BU Streib
72	Aushärtungszeit Bodenplate	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25	BU Streib
73	**HERBSTFERIEN 2025**	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	
74	Wände Untergeschoss	15 Tage	Mon 22.09.25	Mon 13.10.25	BU Streib
75	Decke über Untergeschoss	10 Tage	Die 14.10.25	Mon 27.10.25	BU Streib
76	Treppenhaus und Aufzugsturm über EG	23 Tage	Die 28.10.25	Don 27.11.25	BU Streib
77	**WEIHNACHTSFERIEN 2025**	6 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26	
78	Verfüllung Baugrube	82 Tage	Mon 03.11.25	Die 10.03.26	BU Streib
79	Einbau Zisternen- und Schächte	13 Tage	Fre 06.02.26	Die 24.02.26	BU Streib
80	Bodenplatte Erdgeschoss Foyer	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26	BU Streib
81	Rohbau Restarbeiten, Baustelle räumen	4 Tage	Mon 30.03.26	Don 02.04.26	BU Streib
82	Kranabbau	1 Tag	Mit 17.06.26	Mit 17.06.26	BU Streib
83	**Holzbau**	**135 Tage**	**Fre 28.11.25**	**Fre 26.06.26**	
84	Planung + Produktion Holzbau	80 Tage	Fre 28.11.25	Die 07.04.26	Zimmerei Harth
85	**OSTERFERIEN 2026**	8 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26	
86	Wände Erdgeschoss	10 Tage	Die 07.04.26	Mon 20.04.26	Zimmerei Harth
87	Decke über Erdgeschoss	12 Tage	Die 21.04.26	Don 07.05.26	Zimmerei Harth
88	Wände 1.Obergschoss	14 Tage	Fre 08.05.26	Fre 29.05.26	Zimmerei Harth
89	Dach über 1. Obergeschoss	11 Tage	Mon 01.06.26	Die 16.06.26	Zimmerei Harth
90	Dampfsperre Dach	2 Tage	Mit 17.06.26	Don 18.06.26	Zimmerei Harth
91	Dach Foyer	3 Tage	Die 23.06.26	Don 25.06.26	Zimmerei Harth
92	Restarbeiten Holzbau	8 Tage	Mit 17.06.26	Fre 26.06.26	Zimmerei Harth
93	**Richtfest**	**0 Tage**	**Fre 26.06.26**	**Fre 26.06.26**	Zimmerei Harth
94	**Gerüst**	**154 Tage**	**Don 26.03.26**	**Mit 04.11.26**	
95	Aufbau Gerüst	5 Tage	Don 26.03.26	Mit 01.04.26	Hühn Gerüstbau
96	Abbau Gerüst Dach Foyer	1 Tag	Mit 17.06.26	Mit 17.06.26	Hühn Gerüstbau
97	Aufbau Gerüst auf Dach Foyer	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26	Hühn Gerüstbau
98	Abbau Gerüst	3 Tage	Mon 02.11.26	Mit 04.11.26	Hühn Gerüstbau
99	**Dachdeckung**	**101 Tage**	**Mit 01.07.26**	**Mit 18.11.26**	
100	Dachrand Ortgang und Traufen	15 Tage	Mit 01.07.26	Die 21.07.26	Klemens Ott GmbH
101	Kal-Zip Deckung	20 Tage	Mit 22.07.26	Die 18.08.26	Klemens Ott GmbH
102	Dach Eingangshalle	10 Tage	Don 05.11.26	Mit 18.11.26	Klemens Ott GmbH
103	Attikableche und Fallrohre	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	Klemens Ott GmbH
104	**Fenster**	**125 Tage**	**Fre 20.02.26**	**Fre 21.08.26**	
105	Werkplanung Fenster	40 Tage	Fre 20.02.26	Die 21.04.26	Wiese GmbH
106	Produktion Fenster	40 Tage	Die 28.04.26	Mon 29.06.26	Wiese GmbH
107	Einbau Fenster 1. OG	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	Wiese GmbH
108	Einbau Fenster EG	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	Wiese GmbH
109	Einbau Pfosten- Riegel EG + KG	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	Wiese GmbH
110	Einbau Pfosten- Riegel Eingangshalle	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	Wiese GmbH
111	**Haustechnik**	**212 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 28.05.27**	
112	**Haustechnik Lüftung**	**210 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Fre 28.05.27**	
113	Baustelleneinrichtung Lüftung	3 Tage	Mit 22.07.26	Fre 24.07.26	Erben & Hesse GmbH
114	Rohinstallation Lüftung 1. OG	16 Tage	Mon 27.07.26	Mon 17.08.26	Erben & Hesse GmbH
115	Rohinstallation Lüftung EG	21 Tage	Die 04.08.26	Die 01.09.26	Erben & Hesse GmbH
116	Rohinstallation Lüftung UG	17 Tage	Fre 28.08.26	Mon 21.09.26	Erben & Hesse GmbH
117	Montage Lüftungszentrale	26 Tage	Mit 19.08.26	Mit 23.09.26	Erben & Hesse GmbH
118	Rohinstallation Lüftung EG Aula	5 Tage	Die 04.08.26	Mon 10.08.26	Erben & Hesse GmbH
119	Installation Quellluftauslässe	10 Tage	Don 12.11.26	Mit 25.11.26	Erben & Hesse GmbH
120	Lieferung und Aufstellung Lüftungsgitterme	2 Tage	Don 12.11.26	Fre 13.11.26	Erben & Hesse GmbH
121	Fertigmontage Lüftung (Drallerinlässe, etc.)	20 Tage	Don 26.11.26	Mon 11.01.27	Erben & Hesse GmbH
122	Inbetriebnahme Lüftung (Abgleich, etc.)	4 Tage	Die 20.04.27	Fre 23.04.27	Erben & Hesse GmbH
123	Sachverständigenabnahme Lüftung	2 Tage	Mit 21.04.27	Don 22.04.27	Erben & Hesse GmbH
124	Probelauf Lüftung	23 Tage	Mon 26.04.27	Mit 26.05.27	Erben & Hesse GmbH
125	Abnahme Lüftung	2 Tage	Don 27.05.27	Fre 28.05.27	MTK
126	**Haustechnik Heizung/ Sanitär**	**181 Tage**	**Mit 05.08.26**	**Mon 03.05.27**	
127	Baustelleneinrichtung Heizung/ Sanitär	3 Tage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26	Geck Vodanovic GmbH
128	Rohinstallation Heizung/ Sanitär 1. OG	7 Tage	Mon 10.08.26	Die 18.08.26	Geck Vodanovic GmbH
129	Rohinstallation Heizung/ Sanitär EG	16 Tage	Don 20.08.26	Don 10.09.26	Geck Vodanovic GmbH
130	Rohinstallation Heizung/ Sanitär UG	17 Tage	Die 08.09.26	Mit 30.09.26	Geck Vodanovic GmbH
131	Montage Heizung/ Sanitär Lüftungszentrale	26 Tage	Mit 26.08.26	Mit 30.09.26	Geck Vodanovic GmbH
132	Fertigmontage Sanitär (WC- Anlagen, Klassen, Küchen)	13 Tage	Don 25.03.27	Mon 12.04.27	Geck Vodanovic GmbH
133	Mikrobiologische Wasseruntersuchungen	6 Tage	Don 22.04.27	Don 29.04.27	Geck Vodanovic GmbH
134	Abnahme Heizung / Sanitär	2 Tage	Fre 30.04.27	Mon 03.05.27	MTK
135	**Fußbodenheizung**	**40 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mit 25.11.26**	
136	Verlegung Fußbodenheizung 1. OG	2 Tage	Don 08.10.26	Fre 09.10.26	Geck Vodanovic GmbH
137	Funktionsheizen 1. OG	5 Tage	Don 05.11.26	Mit 11.11.26	Geck Vodanovic GmbH
138	Verlegung Fußbodenheizung EG	2 Tage	Don 15.10.26	Fre 16.10.26	Geck Vodanovic GmbH
139	Funktionsheizen EG	5 Tage	Don 12.11.26	Mit 18.11.26	Geck Vodanovic GmbH
140	Verlegung Fußbodenheizung UG	2 Tage	Don 22.10.26	Fre 23.10.26	Geck Vodanovic GmbH
141	Funktionsheizen UG	5 Tage	Don 19.11.26	Mit 25.11.26	Geck Vodanovic GmbH
142	Inbetriebnahme und Probelauf Heizung	22 Tage	Don 01.10.26	Fre 30.10.26	Geck Vodanovic GmbH
143	**MSR-Anlage**	**202 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 28.05.27**	
144	Lieferung und Aufstellung Schaltanlage	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	
145	Anschlussarbeiten, Installation Feldgeräte	24 Tage	Die 04.08.26	Fre 04.09.26	
146	Inbetriebnahme MSR-Technik	34 Tage	Don 01.10.26	Die 17.11.26	
147	Abnahme MSR-Technik	2 Tage	Don 27.05.27	Fre 28.05.27	MTK
148	**Haustechnik Elektro**	**188 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mon 26.04.27**	
149	Elektro Rohinstallation	35 Tage	Mon 20.07.26	Fre 04.09.26	
150	Montage Photovoltaik	20 Tage	Mit 02.09.26	Die 29.09.26	
151	Elektro Fertiginstallation	20 Tage	Die 30.03.27	Mon 26.04.27	
152	**Ausbau**	**245 Tage**	**Fre 10.04.26**	**Mon 12.04.27**	
153	**Trockenbau**	**108 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mon 11.01.27**	
154	Wände 1. OG bis KG (einseitig beplankt)	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	MS Trockenbau
155	Fertigstellung Wände 1. OG bis KG	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	MS Trockenbau
156	Fertigspachtelung Wände 1. OG bis KG	10 Tage	Don 29.10.26	Mit 11.11.26	MS Trockenbau
157	Montage abgehängte Decken 1. OG bis KG	30 Tage	Don 12.11.26	Mon 11.01.27	MS Trockenbau
158	**Innenputz**	**10 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 28.08.26**	
160	**Schlosser**	**56 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Mon 23.11.26**	
161	Planung Schlosser	10 Tage	Mon 07.09.26	Mon 21.09.26	
162	Treppengeländer Haupttreppe	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	
163	Stahltreppe Außen	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26	
164	**Holzfassade**	**40 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 09.10.26**	
166	**SOMMERFERIEN 2026**	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26	
167	**Wärmedämmverbundsystem**	**20 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 16.10.26**	
169	**Estrich**	**23 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mon 02.11.26**	
174	**Maler**	**65 Tage**	**Die 12.01.27**	**Mon 12.04.27**	
177	**Fliesen**	**30 Tage**	**Don 19.11.26**	**Mon 18.01.27**	
181	**HERBSTFERIEN 2026**	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	
182	**Bodenbelag**	**25 Tage**	**Die 09.02.27**	**Mon 15.03.27**	
186	**Innentüren Tischler**	**90 Tage**	**Don 29.10.26**	**Mon 22.03.27**	
190	**Innentüren Metallbau**	**155 Tage**	**Fre 10.04.26**	**Mit 18.11.26**	
193	**Einbau Küche**	10 Tage	Don 17.12.26	Mon 18.01.27	
194	**Einbaumöbel**	15 Tage	Die 23.02.27	Mon 15.03.27	
195	**Fertigstellung Neubau + Gebäudereinigung**	15 Tage	Die 13.04.27	Mon 03.05.27	
196	**Außenanlagen**	**60 Tage**	**Don 19.11.26**	**Mon 01.03.27**	
197	Ausführung Außenanlagen	60 Tage	Don 19.11.26	Mon 01.03.27	
198	**WEIHNACHTSFERIEN 2026**	13 Tage	Mit 23.12.26	Fre 22.01.27	
199	**Bauaufsichtliche Abnahmen**	**7 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Die 18.05.27**	
200	Abnahme Sachverständiger Brandschutz	1 Tag	Mon 10.05.27	Mon 10.05.27	HZB
201	Abnahme BA Neubau	1 Tag	Die 18.05.27	Die 18.05.27	MTK Bauaufsicht
