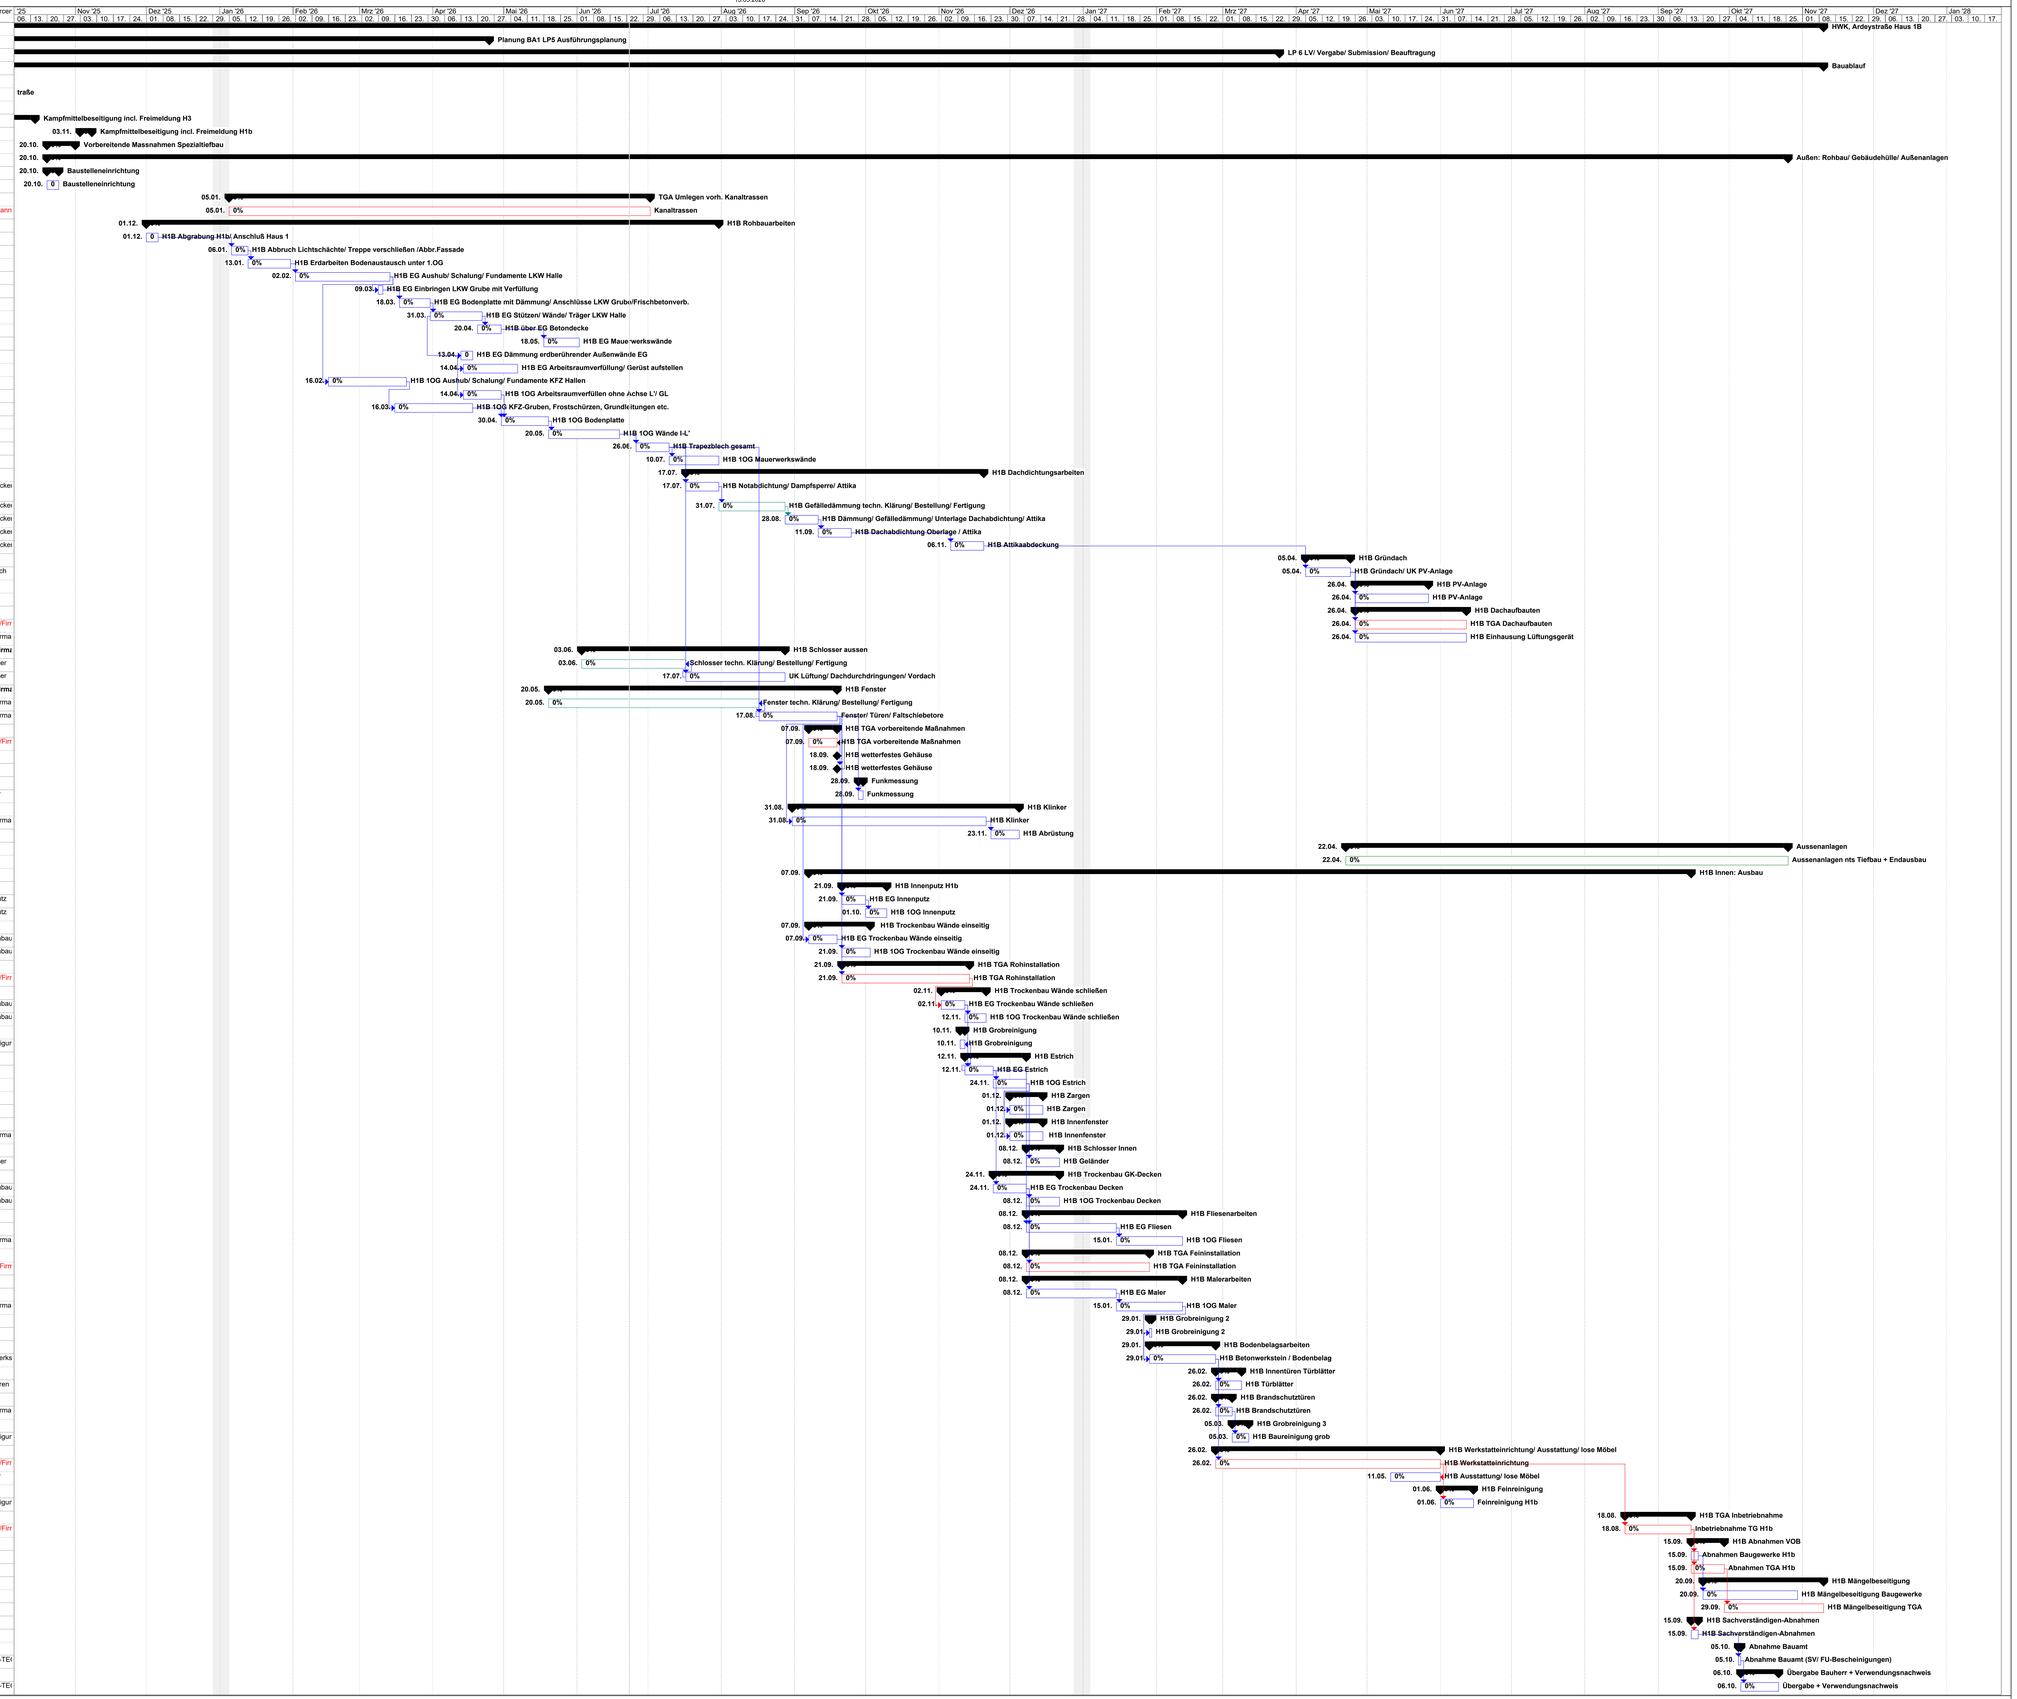Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% Abgesc	Haus	Ressourcen
1	**HWK, Ardeystraße Haus 1B**	**695 Tage?**	**Mo 13.01.25**	**Di 09.11.27**		**14%**		
2	**Planung BA1 LP5 Ausführungsplanung**	**295 Tage**	**Mo 10.02.25**	**Fr 24.04.26**		**16%**		
32	**LP 6 LV/ Vergabe/ Submission/ Beauftragung**	**539 Tage?**	**Mo 13.01.25**	**Mi 24.03.27**		**18%**		
168	**Bauablauf**	**671 Tage**	**Fr 14.02.25**	**Di 09.11.27**		**10%**		
169	**Baumfällung**	**3 Tage**	**Fr 14.02.25**	**Di 18.02.25**		**100%**		
171	**bergbauliche Sicherung Ardeystraße**	**83 Tage**	**Mo 14.04.25**	**Di 19.08.25**		**100%**		
173	**Abbruch Haus 4 LKW Werkstatt**	**22 Tage**	**Mo 02.06.25**	**Fr 04.07.25**		**100%**		
175	**Kampfmittelbeseitigung incl. Freimeldung H3**	**56 Tage**	**Mo 28.07.25**	**Di 14.10.25**		**84%**		
178	**Kampfmittelbeseitigung incl. Freimeldung H1b**	**5 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 07.11.25**		**0%**		
180	**Vorbereitende Massnahmen Spezialtiefbau**	**10 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Fr 31.10.25**		**0%**		
182	**Außen: Rohbau/ Gebäudehülle/ Außenanlagen**	**495 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Mo 25.10.27**		**0%**		
183	**Baustelleneinrichtung**	**5 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Fr 24.10.25**		**0%**		
184	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mo 20.10.25	Fr 24.10.25	177EA+3 Tage	0%	BA1	Griep
185	**TGA Umlegen vorh. Kanaltrassen**	**120 Tage**	**Mo 05.01.26**	**Mi 01.07.26**		**0%**		
186	Kanaltrassen	6 Monate	Mo 05.01.26	Mi 01.07.26	177EA-6 Tage	0%	BA1	Bernemann
187	**H1B Rohbauarbeiten**	**158 Tage**	**Mo 01.12.25**	**Do 30.07.26**		**0%**	**H1B**	
188	H1B Abgrabung H1b/ Anschluß Haus 1	5 Tage	Mo 01.12.25	Fr 05.12.25	179EA+15 Tage	0%	H1B	Meyer
189	H1B Abbruch Lichtschächte/ Treppe verschließen /Ab	5 Tage	Di 06.01.26	Mo 12.01.26	188EA+13 Tage	0%	H1B	Meyer
190	H1B Erdarbeiten Bodenaustausch unter 1.OG	14 Tage	Di 13.01.26	Fr 30.01.26	189	0%	H1B	Meyer
191	H1B EG Aushub/ Schalung/ Fundamente LKW Halle	30 Tage	Mo 02.02.26	Fr 13.03.26	190	0%	H1B	Meyer
192	H1B EG Einbringen LKW Grube mit Verfüllung	2 Tage	Mo 09.03.26	Di 10.03.26	191EA-5 Tage	0%	H1B	Meyer
193	H1B EG Bodenplatte mit Dämmung/ Anschlüsse LKV	9 Tage	Mi 18.03.26	Mo 30.03.26	192EA+5 Tage	0%	H1B	Meyer
194	H1B EG Stützen/ Wände/ Träger LKW Halle	14 Tage	Di 31.03.26	Di 21.04.26	193	0%	H1B	Meyer
195	H1B über EG Betondecke	8 Tage	Mo 20.04.26	Mi 29.04.26	194EA-2 Tage	0%	H1B	Meyer
196	H1B EG Mauerwerkswände	10 Tage	Mo 18.05.26	Mo 01.06.26	195EA+9 Tage	0%	H1B	Meyer
197	H1B EG Dämmung erdberührender Außenwände EG	5 Tage	Mo 13.04.26	Fr 17.04.26	194AA+7 Tage	0%	H1B	Meyer
198	H1B EG Arbeitsraumverfüllung/ Gerüst aufstellen	16 Tage	Di 14.04.26	Mi 06.05.26	197AA+1 Tag	0%	H1B	Meyer
199	H1B 1OG Aushub/ Schalung/ Fundamente KFZ Halle	25 Tage	Mo 16.02.26	Fr 20.03.26	191EA-20 Tage	0%	H1B	Meyer
200	H1B 1OG Arbeitsraumverfüllen ohne Achse L'/ GL	12 Tage	Di 14.04.26	Mi 29.04.26	198AA	0%	H1B	Meyer
201	H1B 1OG KFZ-Gruben, Frostschürzen, Grundleitung	23 Tage	Mo 16.03.26	Fr 17.04.26	199EA-5 Tage	0%	H1B	Meyer
202	H1B 1OG Bodenplatte	11 Tage	Do 30.04.26	Di 19.05.26	200;201	0%	H1B	Meyer
203	H1B 1OG Wände I-L'	19 Tage	Mi 20.05.26	Do 18.06.26	202	0%	H1B	Meyer
204	H1B Trapezblech gesamt	10 Tage	Fr 26.06.26	Do 09.07.26	203EA+5 Tage	0%	H1B	Meyer
205	H1B 1OG Mauerwerkswände	15 Tage	Fr 10.07.26	Do 30.07.26	204	0%	H1B	Meyer
206	**H1B Dachdichtungsarbeiten**	**90 Tage**	**Fr 17.07.26**	**Do 19.11.26**		**0%**		
207	H1B Notabdichtung/ Dampfsperre/ Attika	10 Tage	Fr 17.07.26	Do 30.07.26	204EA+5 Tage	0%	H1B	Dachdecker
208	H1B Gefälledämmung techn. Klärung/ Bestellung/ Fe	20 Tage	Fr 31.07.26	Do 27.08.26	207	0%	H1B	Dachdecker
209	H1B Dämmung/ Gefälledämmung/ Unterlage Dachat	10 Tage	Fr 28.08.26	Do 10.09.26	208	0%	H1B	Dachdecker
210	H1B Dachabdichtung Oberlage / Attika	10 Tage	Fr 11.09.26	Do 24.09.26	209	0%	H1B	Dachdecker
211	H1B Attikaabdeckung	10 Tage	Fr 06.11.26	Do 19.11.26	210EA+30 Tage	0%	H1B	Dachdecker
212	**H1B Gründach**	**15 Tage**	**Mo 05.04.27**	**Fr 23.04.27**		**0%**		
213	H1B Gründach/ UK PV-Anlage	15 Tage	Mo 05.04.27	Fr 23.04.27	211	0%	H1B	Gründach
214	**H1B PV-Anlage**	**20 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Mi 26.05.27**		**0%**		
215	H1B PV-Anlage	20 Tage	Mo 26.04.27	Mi 26.05.27	213	0%	H1B	
216	**H1B Dachaufbauten**	**30 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Fr 11.06.27**		**0%**		
217	H1B TGA Dachaufbauten	30 Tage	Mo 26.04.27	Fr 11.06.27	213	0%	H1B	G-TEC /Firr
218	H1B Einhausung Lüftungsgerät	30 Tage	Mo 26.04.27	Fr 11.06.27	213	0%	H1B	KSA/ Firma
219	**H1B Schlosser aussen**	**60 Tage**	**Mi 03.06.26**	**Do 27.08.26**		**0%**	**H1B**	**KSA/ Firma**
220	Schlosser techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	30 Tage	Mi 03.06.26	Fr 17.07.26	221AE	0%	H1B	Schlosser
221	UK Lüftung/ Dachdurchdringungen/ Vordach	30 Tage	Fr 17.07.26	Do 27.08.26	204EA+5 Tage	0%	H1B	Schlosser
222	**H1B Fenster**	**85 Tage**	**Mi 20.05.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**	**H1B**	**KSA/ Firma**
223	Fenster techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	60 Tage	Mi 20.05.26	Mo 17.08.26	224AE	0%	H1B	KSA/ Firma
224	Fenster/ Türen/ Faltschiebetore	25 Tage	Mo 17.08.26	Fr 18.09.26	204EA+26 Tage	0%	H1B	KSA/ Firma
225	**H1B TGA vorbereitende Maßnahmen**	**10 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**		
226	H1B TGA vorbereitende Maßnahmen	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	228EE	0%	H1B	G-TEC /Firr
227	**H1B wetterfestes Gehäuse**	**0 Tage**	**Fr 18.09.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**		
228	H1B wetterfestes Gehäuse	0 Tage	Fr 18.09.26	Fr 18.09.26	224	0%	H1B	
229	**Funkmessung**	**2 Tage**	**Mo 28.09.26**	**Di 29.09.26**		**0%**		
230	Funkmessung	2 Tage	Mo 28.09.26	Di 29.09.26	224EA+5 Tage	0%	BA1	Bauherr
231	**H1B Klinker**	**70 Tage**	**Mo 31.08.26**	**Fr 04.12.26**		**0%**	**H1B**	
232	H1B Klinker	3 Monate	Mo 31.08.26	Fr 20.11.26	224EA-15 Tage	0%	H1B	KSA/ Firma
233	H1B Abrüstung	10 Tage	Mo 23.11.26	Fr 04.12.26	232	0%	H1B	Meyer
234	**Aussenanlagen**	**128 Tage**	**Do 22.04.27**	**Mo 25.10.27**	**167EA+50 Tage**	**0%**		
235	Aussenanlagen nts Tiefbau + Endausbau	128 Tage	Do 22.04.27	Mo 25.10.27	167EA+50 Tage	0%	BA1	nts
236	**H1B Innen: Ausbau**	**252 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Di 14.09.27**		**0%**		
237	**H1B Innenputz H1b**	**15 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Fr 09.10.26**		**0%**	**H1B**	
238	H1B EG Innenputz	8 Tage	Mo 21.09.26	Mi 30.09.26	224	0%	H1B	Innenputz
239	H1B 1OG Innenputz	7 Tage	Do 01.10.26	Fr 09.10.26	238	0%	H1B	Innenputz
240	**H1B Trockenbau Wände einseitig**	**20 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Fr 02.10.26**		**0%**	**H1B**	
241	H1B EG Trockenbau Wände einseitig	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	224EA-10 Tage	0%	H1B	Trockenbau
242	H1B 1OG Trockenbau Wände einseitig	10 Tage	Mo 21.09.26	Fr 02.10.26	241	0%	H1B	Trockenbau
243	**H1B TGA Rohinstallation**	**40 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Fr 13.11.26**		**0%**		
244	H1B TGA Rohinstallation	40 Tage	Mo 21.09.26	Fr 13.11.26	224	0%	H1B	G-TEC /Firr
245	**H1B Trockenbau Wände schließen**	**15 Tage**	**Mo 02.11.26**	**Fr 20.11.26**		**0%**	**H1B**	
246	H1B EG Trockenbau Wände schließen	8 Tage	Mo 02.11.26	Mi 11.11.26	244EA-10 Tage	0%	H1B	Trockenbau
247	H1B 1OG Trockenbau Wände schließen	7 Tage	Do 12.11.26	Fr 20.11.26	246	0%	H1B	Trockenbau
248	**H1B Grobreinigung**	**2 Tage**	**Di 10.11.26**	**Do 12.11.26**		**0%**		
249	H1B Grobreinigung	2 Tage	Di 10.11.26	Do 12.11.26	251AE	0%	H1B	Baureinigur
250	**H1B Estrich**	**18 Tage**	**Do 12.11.26**	**Mo 07.12.26**		**0%**	**H1B**	
251	H1B EG Estrich	8 Tage	Do 12.11.26	Mo 23.11.26	246	0%	H1B	Estrich
252	H1B 1OG Estrich	10 Tage	Di 24.11.26	Mo 07.12.26	251	0%	H1B	Estrich
253	**H1B Zargen**	**10 Tage**	**Di 01.12.26**	**Mo 14.12.26**		**0%**	**H1B**	
254	H1B Zargen	10 Tage	Di 01.12.26	Mo 14.12.26	252EA-5 Tage	0%	H1B	Zargen
255	**H1B Innenfenster**	**10 Tage**	**Di 01.12.26**	**Mo 14.12.26**		**0%**	**H1B**	
256	H1B Innenfenster	10 Tage	Di 01.12.26	Mo 14.12.26	252EA-5 Tage	0%	H1B	KSA/ Firma
257	**H1B Schlosser Innen**	**10 Tage**	**Di 08.12.26**	**Mo 21.12.26**		**0%**		
258	H1B Geländer	10 Tage	Di 08.12.26	Mo 21.12.26	252	0%	H1B	Schlosser
259	**H1B Trockenbau GK-Decken**	**20 Tage**	**Di 24.11.26**	**Mo 21.12.26**		**0%**	**H1B**	
260	H1B EG Trockenbau Decken	10 Tage	Di 24.11.26	Mo 07.12.26	251	0%	H1B	Trockenbau
261	H1B 1OG Trockenbau Decken	10 Tage	Di 08.12.26	Mo 21.12.26	260	0%	H1B	Trockenbau
262	**H1B Fliesenarbeiten**	**40 Tage**	**Di 08.12.26**	**Do 11.02.27**		**0%**	**H1B**	
263	H1B EG Fliesen	20 Tage	Di 08.12.26	Do 14.01.27	260;251EA+10	0%	H1B	Fliesen
264	H1B 1OG Fliesen	20 Tage	Fr 15.01.27	Do 11.02.27	263	0%	H1B	KSA/ Firma
265	**H1B TGA Feininstallation**	**30 Tage**	**Di 08.12.26**	**Do 28.01.27**		**0%**		
266	H1B TGA Feininstallation	30 Tage	Di 08.12.26	Do 28.01.27	260	0%	H1B	G-TEC/Firr
267	**H1B Malerarbeiten**	**40 Tage**	**Di 08.12.26**	**Do 11.02.27**		**0%**	**H1B**	
268	H1B EG Maler	20 Tage	Di 08.12.26	Do 14.01.27	260	0%	H1B	
269	H1B 1OG Maler	20 Tage	Fr 15.01.27	Do 11.02.27	268	0%	H1B	KSA/ Firma
270	**H1B Grobreinigung 2**	**1 Tag**	**Fr 29.01.27**	**Fr 29.01.27**		**0%**		
271	H1B Grobreinigung 2	1 Tag	Fr 29.01.27	Fr 29.01.27	273AA	0%		
272	**H1B Bodenbelagsarbeiten**	**20 Tage**	**Fr 29.01.27**	**Do 25.02.27**		**0%**	**H1B**	
273	H1B Betonwerkstein / Bodenbelag	20 Tage	Fr 29.01.27	Do 25.02.27	269EA-10 Tage	0%	H1B	Betonwerks
274	**H1B Innentüren Türblätter**	**7 Tage**	**Fr 26.02.27**	**Mo 08.03.27**		**0%**	**H1B**	
275	H1B Türblätter	7 Tage	Fr 26.02.27	Mo 08.03.27	273	0%	H1B	Innentüren
276	**H1B Brandschutztüren**	**5 Tage**	**Fr 26.02.27**	**Do 04.03.27**		**0%**	**H1B**	
277	H1B Brandschutztüren	5 Tage	Fr 26.02.27	Do 04.03.27	273	0%	H1B	KSA/ Firma
278	**H1B Grobreinigung 3**	**5 Tage**	**Fr 05.03.27**	**Do 11.03.27**		**0%**		
279	H1B Baureinigung grob	5 Tage	Fr 05.03.27	Do 11.03.27	277	0%	H1B	Baureinigur
280	**H1B Werkstatteinrichtung/ Ausstattung/ lose Möbel**	**60 Tage**	**Fr 26.02.27**	**Mo 31.05.27**		**0%**		
281	H1B Werkstatteinrichtung	3 Monate	Fr 26.02.27	Mo 31.05.27	273	0%	H1B	G-TEC /Firr
282	H1B Ausstattung/ lose Möbel	15 Tage	Di 11.05.27	Mo 31.05.27	281EE	0%	H1B	Bauherr
283	**H1B Feinreinigung**	**10 Tage**	**Di 01.06.27**	**Mo 14.06.27**		**0%**		
284	Feinreinigung H1b	10 Tage	Di 01.06.27	Mo 14.06.27	281	0%	H1B	Baureinigur
285	**H1B TGA Inbetriebnahme**	**20 Tage**	**Mi 18.08.27**	**Di 14.09.27**		**0%**		
286	Inbetriebnahme TG H1b	20 Tage	Mi 18.08.27	Di 14.09.27	281EA+56 Tage	0%	H1B	G-TEC /Firr
287	**H1B Abnahmen VOB**	**10 Tage**	**Mi 15.09.27**	**Di 28.09.27**		**0%**		
288	Abnahmen Baugewerke H1b	3 Tage	Mi 15.09.27	Fr 17.09.27	286	0%	H1B	KSA
289	Abnahmen TGA H1b	10 Tage	Mi 15.09.27	Di 28.09.27	286	0%	H1B	G-TEC
290	**H1B Mängelbeseitigung**	**36 Tage**	**Mo 20.09.27**	**Di 09.11.27**		**0%**		
291	H1B Mängelbeseitigung Baugewerke	30 Tage	Mo 20.09.27	Fr 29.10.27	288	0%	H1B	KSA
292	H1B Mängelbeseitigung TGA	29 Tage	Mi 29.09.27	Di 09.11.27	289	0%	H1B	G-TEC
293	**H1B Sachverständigen-Abnahmen**	**3 Tage**	**Mi 15.09.27**	**Fr 17.09.27**		**0%**		
294	H1B Sachverständigen-Abnahmen	3 Tage	Mi 15.09.27	Fr 17.09.27	286	0%	H1B	
295	**Abnahme Bauamt**	**1 Tag**	**Di 05.10.27**	**Di 05.10.27**		**0%**		
296	Abnahme Bauamt (SV/ FU-Bescheinigungen)	1 Tag	Di 05.10.27	Di 05.10.27	294EA+11 Tage	0%	BA1	KSA/ G-TEC
297	**Übergabe Bauherr + Verwendungsnachweis**	**12 Tage**	**Mi 06.10.27**	**Do 21.10.27**		**0%**		
298	Übergabe + Verwendungsnachweis	12 Tage	Mi 06.10.27	Do 21.10.27	296	0%	BA1	KSA/ G-TEC
