Terminplan Ausführung - Neubau Kardiologie

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Unternehmen
1	Übergeordnete Arbeiten	670 Tage	Mon 28.10.24	Fre 04.06.27		
2	Rohbauarbeiten	435 Tage	Mon 28.10.24	Fre 26.06.26		Gründker
3	Fenster	105 Tage	Mon 23.02.26	Fre 17.07.26		ASP
4	Dachdecker	125 Tage	Mon 20.04.26	Fre 09.10.26		Berheide & K
5	Notabdichtung	40 Tage	Mon 20.04.26	Fre 12.06.26		Berheide & K
6	Attika	35 Tage	Mon 15.06.26	Fre 31.07.26	5	Berheide & K
7	Dämmung	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26		Berheide & K
8	Abdichtung	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	7	Berheide & K
9	Kiesschüttung	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	8	Berheide & K
10	Geländer	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	9	Berheide & K
11	PV-Anlage	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	10	Ineg
12	Fassadenbekleidung	105 Tage	Mon 23.03.26	Fre 14.08.26		Gurr
13	Unterkonstruktion	50 Tage	Mon 23.03.26	Fre 29.05.26		Gurr
14	Dämmung	25 Tage	Mon 15.06.26	Fre 17.07.26	6EE-10 Tag	Gurr
15	Fassadenplatten	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	14	Gurr
16	WDVS	30 Tage	Mon 20.07.26	Fre 28.08.26	6EA-10 Tag	Brück
17	Schlosserarbeiten	70 Tage	Mon 20.07.26	Fre 23.10.26		TL
18	Schachtbühnen	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26		TL
19	Außentreppen	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	20	TL
20	Gerüstarbeiten	185 Tage	Mon 26.01.26	Fre 09.10.26		Acker
21	Standzeit Gerüst	185 Tage	Mon 26.01.26	Fre 09.10.26		Acker
22	Umankern auf Dauergerüstanker	2 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26		Acker
23	Außenanlagen	160 Tage	Mon 12.10.26	Fre 04.06.27	20	
24	Aufzugsanlage nach Estrich	75 Tage	Mon 09.11.26	Fre 05.03.27	139	Weymann
25	Ausbauarbeiten	274 Tage	Mon 04.05.26	Don 03.06.27		
26	Grobarbeiten EG	115 Tage	Mon 04.05.26	Fre 09.10.26		
27	Putzarbeiten	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26		Perez
28	Grobinstallation Lüftung	40 Tage	Mon 18.05.26	Fre 10.07.26	27	Gering
29	Grobinstallation Sanitär	25 Tage	Mon 18.05.26	Fre 19.06.26	27	Koch & Thüne
30	Grobinstallation ELT - (Trassenmontage)	25 Tage	Mon 18.05.26	Fre 19.06.26	27	EBM
31	Trockenbau Wände (einseitig)	40 Tage	Mon 25.05.26	Fre 17.07.26	27EA+5 Ta	Hoffrogge
32	Grobinstallation Heizung	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 03.07.26	27EA+10 T	Bischof
33	Grobinstallation Rohrpost	15 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26		Einberger
34	Grobinstallation ELT - (Leitungszug / Verkabelung)	35 Tage	Mon 06.07.26	Fre 21.08.26	30;31EA-1(	EBM
35	Grobinstallation Med. Gase	30 Tage	Mon 13.07.26	Fre 21.08.26	30EA+5 Ta	Dräger
36	Grobinstallation Sanitär (Installation in GK-Wände)	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26	31EA-5 Tag	Koch & Thüne
37	Grobinstallation MSR	8 Tage	Mit 12.08.26	Fre 21.08.26	34EE	Große Wörde
38	Trockenbau Wände schließen	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	34EA-5 Tag	Hoffrogge
39	ELT - MSR Verkabelung / Schalterdosen	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	52AA+5 Ta	EBM
40	Grobarbeiten 1.OG	100 Tage	Mon 18.05.26	Fre 02.10.26		
41	Putzarbeiten	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26	27	Perez
42	Grobinstallation Lüftung	40 Tage	Mon 25.05.26	Fre 17.07.26	41EA-10 Ta	Gering
43	Grobinstallation Sanitär	25 Tage	Mon 25.05.26	Fre 26.06.26	41EA-10 Ta	Koch & Thüne
44	Grobinstallation ELT - (Trassenmontage)	50 Tage	Mon 25.05.26	Fre 31.07.26	41EA-10 Ta	EBM
45	Grobinstallation Heizung	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26	41EA+10 T	Bischof
46	Grobinstallation Rohrpost	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	33	Einberger
47	Trockenbau Wände (einseitig)	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26	41EA+5 Ta	Hoffrogge
48	Grobinstallation ELT - (Leitungszug / Verkabelung)	30 Tage	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26	47EA-5 Tag	EBM
49	Grobinstallation Sanitär (Installation in GK-Wände)	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26	47;36	Koch & Thüne
50	Grobinstallation Med. Gase	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	44EA+5 Ta	Dräger
51	Grobinstallation MSR	8 Tage	Mon 24.08.26	Mit 02.09.26	37	Große Wörde
52	ELT - MSR Verkabelung / Schalterdosen	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	48	EBM
53	Trockenbau Wände schließen	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26	48EA-5 Tag	Hoffrogge
54	Grobarbeiten 2.OG	80 Tage	Mon 08.06.26	Fre 25.09.26		
55	Putzarbeiten	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	41	Perez
56	Grobinstallation Lüftung	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26	55	Gering
57	Grobinstallation Sanitär	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26	55	Koch & Thüne
58	Grobinstallation Heizung	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	55EA+10 T	Bischof
59	Grobinstallation ELT - (Trassenmontage)	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	55EA+20 T	EBM
60	Trockenbau Wände (einseitig)	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	55EA+5 Ta	Hoffrogge
61	Grobinstallation ELT - (Leitungszug / Verkabelung)	25 Tage	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26	59;60	EBM
62	Grobinstallation MSR	8 Tage	Don 03.09.26	Mon 14.09.26	51	Große Wörde
63	Grobinstallation Sanitär (Installation in GK-Wände)	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	60;49EE-5	Koch & Thüne
64	ELT - MSR Verkabelung / Schalterdosen	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	48EA-5 Tag	EBM
65	Trockenbau Wände schließen	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	61EA-5 Tag	Hoffrogge
66	Grobarbeiten UG	85 Tage	Mon 22.06.26	Fre 16.10.26		
67	Putzarbeiten	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26	55	Perez
68	Grobinstallation Lüftung	35 Tage	Mon 29.06.26	Fre 14.08.26	67EA-10 Ta	Gering
69	Grobinstallation Sanitär	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	67EA-5 Tag	Koch & Thüne
70	Grobinstallation ELT - (Trassenmontage)	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	67EA-5 Tag	EBM
71	Grobinstallation Rohrpost	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	46	Einberger
72	Grobinstallation Heizung	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	67EA+10 T	Bischof
73	Trockenbau Wände (einseitig)	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	67EA+5 Ta	Hoffrogge
74	Grobinstallation ELT - (Leitungszug / Verkabelung)	25 Tage	Mon 10.08.26	Fre 11.09.26	70;73EA-5	EBM
75	Grobinstallation Med. Gase	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	70EA+5 Ta	Dräger
76	Grobinstallation Sanitär (Installation in GK-Wände)	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	73;63	Koch & Thüne
77	Grobinstallation MSR	20 Tage	Die 15.09.26	Mon 12.10.26	73;62;74EA	Große Wörde
78	ELT - MSR Verkabelung / Schalterdosen	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	39AA+5 Ta	EBM
79	Trockenbau Wände schließen	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	53;74	Hoffrogge
80	Grobarbeiten Abgeschlossen	1 Tag	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26	79	
81	ELT - Bestandsanbindungen / Restleistungen 1.BA	35 Tage	Mon 12.10.26	Fre 27.11.26	39	EBM
82	Ausbauarbeiten 2.OG (ab Estrich)	85 Tage	Mit 23.09.26	Die 02.02.27		
83	Durchbruch zum Bestand	3 Tage	Mit 23.09.26	Fre 25.09.26		
84	Staubwand im Bestand stellen	1 Tag	Mit 23.09.26	Mit 23.09.26	65EE-2 Tag	Schwöppe
85	Durchbrüche zum Bestand herstellen	2 Tage	Don 24.09.26	Fre 25.09.26	84	Gründker
86	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 23.09.26	Fre 25.09.26	87AE-1 Tag	xy
87	Estricharbeiten	7 Tage	Mon 28.09.26	Die 06.10.26	65;64	Gösker
88	Fensterbänke Tischler	5 Tage	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	87	xy
89	Trockenbau Decken Friese	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26	87;65	Hoffrogge
90	Malerarbeiten Grund- , Zwischen- & Endanstrich	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	87;89	Brück
91	Sperrung TRH E	17 Tage	Mon 19.10.26	Die 10.11.26		
92	Fliesenarbeiten TRH E	7 Tage	Mon 19.10.26	Die 27.10.26	79	PAM
93	Schlosser - Geländer	5 Tage	Mit 28.10.26	Die 03.11.26	92	TL
94	Malerarbeiten	5 Tage	Mit 04.11.26	Die 10.11.26	93	Brück
95	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mit 28.10.26	Die 10.11.26	87EA+15 T	PAM
96	Bodenarbeiten PVC	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26	90	Holschbach
97	Innentüren - Rohrrahmentüren	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	96	Jackson
98	Innentüren	10 Tage	Mit 25.11.26	Die 08.12.26	96	Jackson
99	Trockenbau Rasterdecke / Flurdecke	10 Tage	Mit 25.11.26	Die 08.12.26	96	Hoffrogge
100	Feininstallation ELT	20 Tage	Mit 02.12.26	Die 12.01.27	98EA-5 Tag	EBM
101	Malerarbeiten Zargen	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	98;90;97EA	Brück
102	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	98;90;97EA	Gering
103	Feininstallation Sanitär	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	98;90;97EA	Koch & Thüne
104	Feininstallation Heizung	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	98;90;97EA	Bischof
105	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 16.12.26	Don 17.12.26	101	xy
106	Tischler Wandschutz	3 Tage	Fre 18.12.26	Die 05.01.27	105	xy
107	Tischler Möblierung	5 Tage	Mit 06.01.27	Die 12.01.27	106	xy
108	Unterverteilung ELT	15 Tage	Mit 13.01.27	Die 02.02.27	100	EBM
109	Ausbauarbeiten 1.OG 2 (ab Estrich)	122 Tage	Don 24.09.26	Fre 26.03.27		
110	Durchbruch zum Bestand	7 Tage	Don 24.09.26	Fre 02.10.26		
111	Staubwand im Bestand stellen	2 Tage	Don 24.09.26	Fre 25.09.26	84	Schwöppe

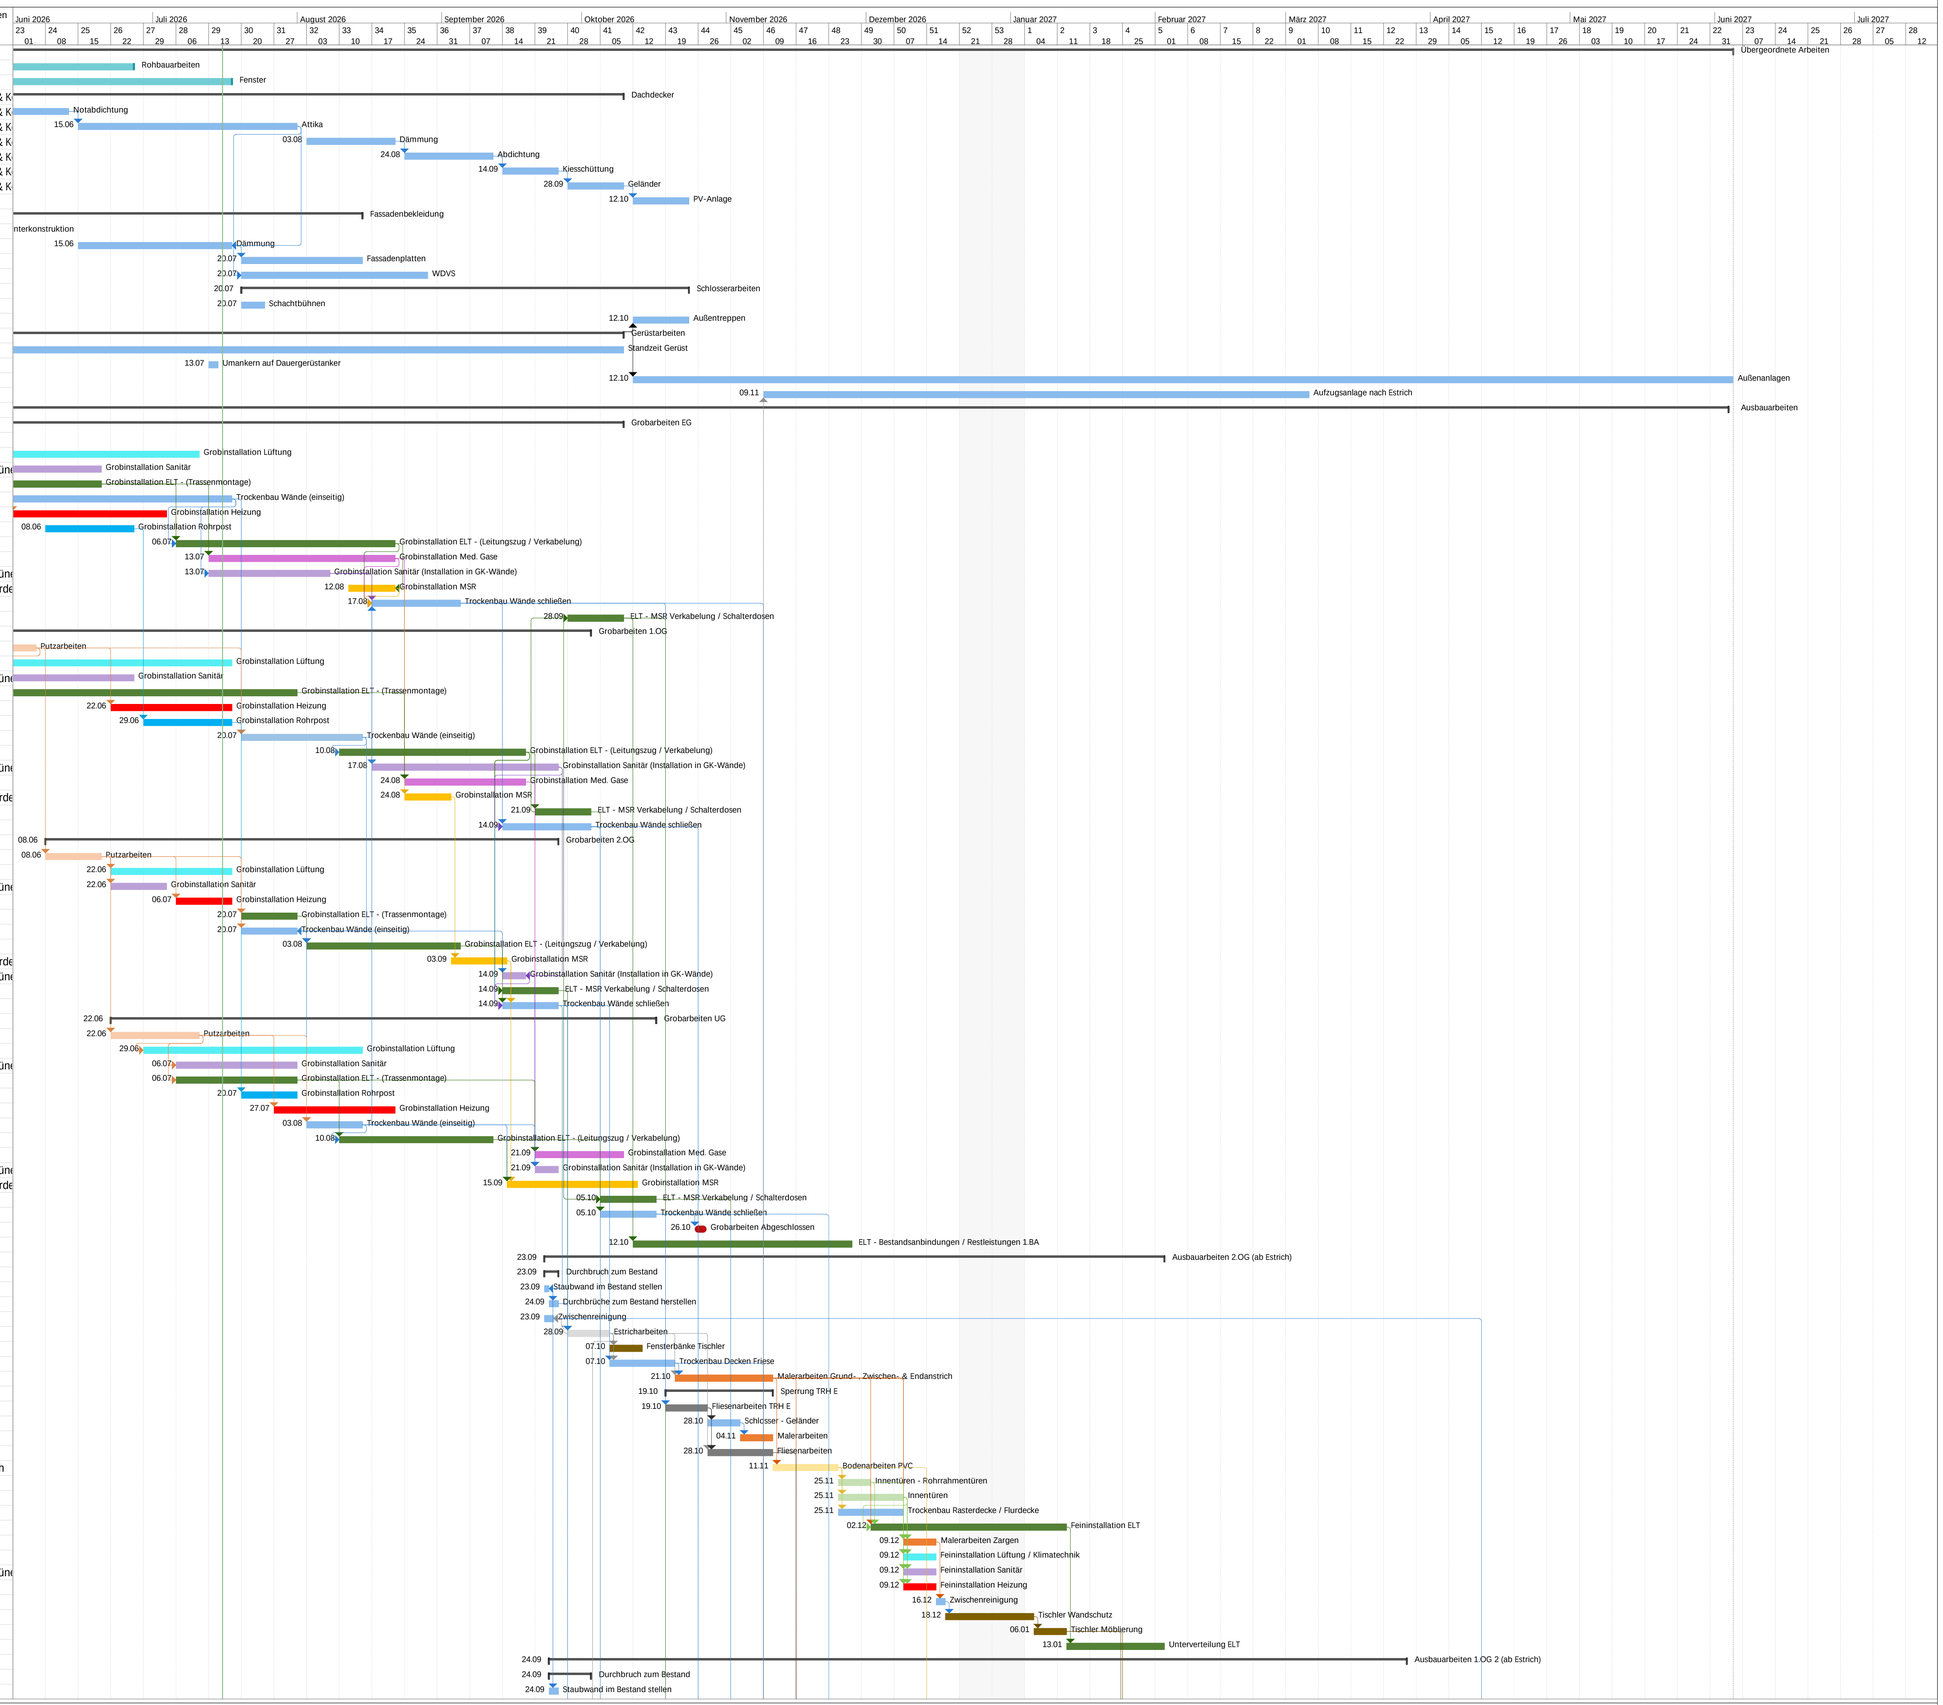

Terminplan Ausführung - Neubau Kardiologie
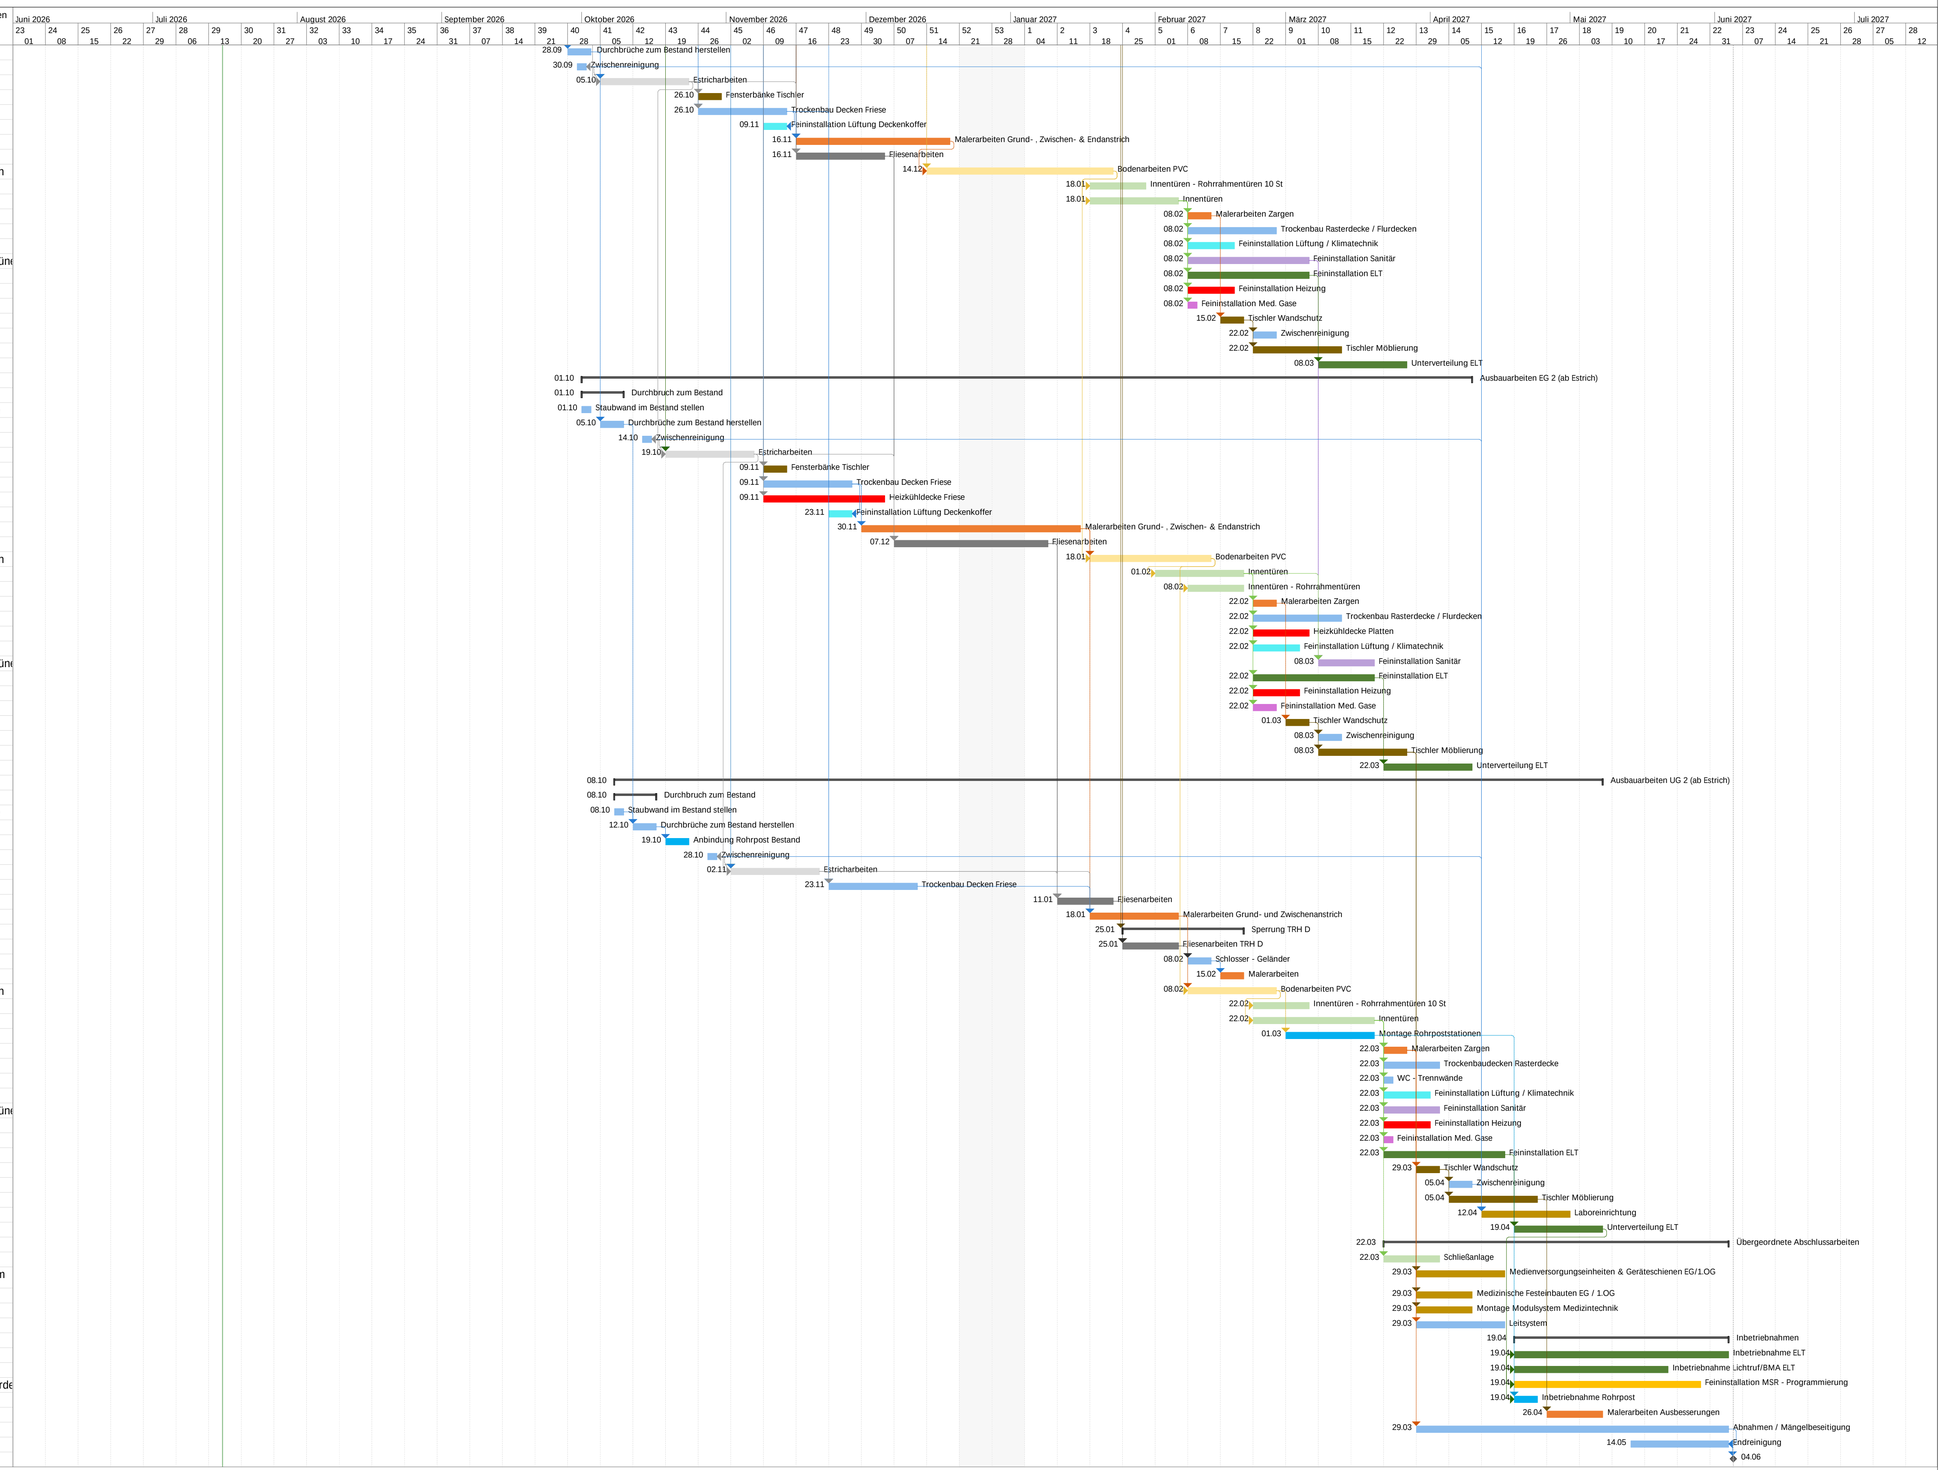
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Unternehmen
112	Durchbrüche zum Bestand herstellen	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	85	Gründker
113	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 30.09.26	Fre 02.10.26	114AE-1 Tag	xy
114	Estricharbeiten	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26	87EA-5 Tag	Gösker
115	Fensterbänke Tischler	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	114	xy
116	Trockenbau Decken Friese	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26	114;53	Hoffrogge
117	Feininstallation Lüftung Deckenkoffer	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	116EE	Gering
118	Malerarbeiten Grund- , Zwischen- & Endanstrich	25 Tage	Mon 16.11.26	Fre 18.12.26	116;90	Brück
119	Fliesenarbeiten	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26	114EA+15	PAM
120	Bodenarbeiten PVC	20 Tage	Mon 14.12.26	Fre 22.01.27	118EA-5 Ta	Holschbach
121	Innentüren - Rohrrahmentüren 10 St	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	120EA-5 Ta	Jackson
122	Innentüren	15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	120EA-5 Ta	Jackson
123	Malerarbeiten Zargen	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	122	Brück
124	Trockenbau Rasterdecke / Flurdecken	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	122	Hoffrogge
125	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	8 Tage	Mon 08.02.27	Mit 17.02.27	122	Gering
126	Feininstallation Sanitär	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	122	Koch & Thüne
127	Feininstallation ELT	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	122	EBM
128	Feininstallation Heizung	8 Tage	Mon 08.02.27	Mit 17.02.27	122	Bischof
129	Feininstallation Med. Gase	2 Tage	Mon 08.02.27	Die 09.02.27	122	Dräger
130	Tischler Wandschutz	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	123	xy
131	Zwischenreinigung	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	130	xy
132	Tischler Möblierung	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	130	xy
133	Unterverteilung ELT	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	127	EBM
134	Ausbauarbeiten EG 2 (ab Estrich)	127 Tage	Don 01.10.26	Fre 09.04.27		
135	Durchbruch zum Bestand	7 Tage	Don 01.10.26	Fre 09.10.26		
136	Staubwand im Bestand stellen	2 Tage	Don 01.10.26	Fre 02.10.26		Schwöppe
137	Durchbrüche zum Bestand herstellen	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	112	Gründker
138	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 14.10.26	Fre 16.10.26	139AE-1 Tag	xy
139	Estricharbeiten	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	114EA-5 Ta	Gösker
140	Fensterbänke Tischler	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	139	xy
141	Trockenbau Decken Friese	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	139;89;38	Hoffrogge
142	Heizkühldecke Friese	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26	139	Bischof
143	Feininstallation Lüftung Deckenkoffer	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	141EE	Gering
144	Malerarbeiten Grund- , Zwischen- & Endanstrich	25 Tage	Mon 30.11.26	Fre 15.01.27	141	Brück
145	Fliesenarbeiten	15 Tage	Mon 07.12.26	Fre 08.01.27	139EA+15	PAM
146	Bodenarbeiten PVC	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27	144;120EA	Holschbach
147	Innentüren	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27	146EA-10 T	Jackson
148	Innentüren - Rohrrahmentüren	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	146EA-5 Ta	Jackson
149	Malerarbeiten Zargen	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	147	Brück
150	Trockenbau Rasterdecke / Flurdecken	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	147	Hoffrogge
151	Heizkühldecke Platten	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27	147	Bischof
152	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	8 Tage	Mon 22.02.27	Mit 03.03.27	147	Gering
153	Feininstallation Sanitär	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	147;126	Koch & Thüne
154	Feininstallation ELT	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	147	EBM
155	Feininstallation Heizung	8 Tage	Mon 22.02.27	Mit 03.03.27	147	Bischof
156	Feininstallation Med. Gase	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	147	Dräger
157	Tischler Wandschutz	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	149	xy
158	Zwischenreinigung	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	157	
159	Tischler Möblierung	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	157	xy
160	Unterverteilung ELT	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27	154	EBM
161	Ausbauarbeiten UG 2 (ab Estrich)	142 Tage	Don 08.10.26	Fre 07.05.27		
162	Durchbruch zum Bestand	7 Tage	Don 08.10.26	Fre 16.10.26		
163	Staubwand im Bestand stellen	2 Tage	Don 08.10.26	Fre 09.10.26		Schwöppe
164	Durchbrüche zum Bestand herstellen	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	137;163	Gründker
165	Anbindung Rohrpost Bestand	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	164	Einberger
166	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 28.10.26	Fre 30.10.26	167AE-1 Tag	xy
167	Estricharbeiten	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26	79;139EA-5	Gösker
168	Trockenbau Decken Friese	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26	167;116;75	Hoffrogge
169	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	167EA+15	PAM
170	Malerarbeiten Grund- und Zwischenanstrich	15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	167;168;14	Brück
171	Sperrung TRH D	20 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27	107	
172	Fliesenarbeiten TRH D	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	107;169	PAM
173	Schlosser - Geländer	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	172	TL
174	Malerarbeiten	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	173	Brück
175	Bodenarbeiten PVC	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	170EA-5 Ta	Holschbach
176	Innentüren - Rohrrahmentüren 10 St	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27	175EA-5 Ta	Jackson
177	Innentüren	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	175EA-5 Ta	Jackson
178	Montage Rohrpoststationen	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27	175	Einberger
179	Malerarbeiten Zargen	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27	177	Brück
180	Trockenbaudecken Rasterdecke	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	177	Hoffrogge
181	WC - Trennwände	2 Tage	Mon 22.03.27	Die 23.03.27	177	Hoffrogge
182	Feininstallation Lüftung / Klimatechnik	8 Tage	Mon 22.03.27	Mit 31.03.27	177	Gering
183	Feininstallation Sanitär	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	177	Koch & Thüne
184	Feininstallation Heizung	8 Tage	Mon 22.03.27	Mit 31.03.27	177	Bischof
185	Feininstallation Med. Gase	2 Tage	Mon 22.03.27	Die 23.03.27	177	Dräger
186	Feininstallation ELT	20 Tage	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27	177	EBM
187	Tischler Wandschutz	5 Tage	Mon 29.03.27	Fre 02.04.27	179	xy
188	Zwischenreinigung	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27	187	xy
189	Tischler Möblierung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	187	xy
190	Laboreinrichtung	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27	188;166;12	BS
191	Unterverteilung ELT	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27	186	EBM
192	Übergeordnete Abschlussarbeiten	54 Tage	Mon 22.03.27	Don 03.06.27		
193	Schließanlage	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	177	
194	Medienversorgungseinheiten & Geräteschienen EG/1.OG	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	159	Medsystem
195	Medizinische Festeinbauten EG / 1.OG	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	159	
196	Montage Modulsystem Medizintechnik	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	159	
197	Leitsystem	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	179	
198	Inbetriebnahmen	34 Tage	Mon 19.04.27	Don 03.06.27		
199	Inbetriebnahme ELT	34 Tage	Mon 19.04.27	Don 03.06.27	191EA-15 T	EBM
200	Inbetriebnahme Lichtruf/BMA ELT	25 Tage	Mon 19.04.27	Fre 21.05.27	199AA	EBM
201	Feininstallation MSR - Programmierung	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	199AA	Große Wörde
202	Inbetriebnahme Rohrpost	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	178;199AA	Einberger
203	Malerarbeiten Ausbesserungen	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	189	Brück
204	Abnahmen / Mängelbeseitigung	49 Tage	Mon 29.03.27	Don 03.06.27	179	
205	Endreinigung	15 Tage	Fre 14.05.27	Don 03.06.27	204EE	
206	Übergabe an Klinik	0 Tage	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27	205EA+1 Ta
