Baublaufplan: Haus 7 Hansemann 05
Stand Di 12.05.26

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% geschloss	sourcennar
1	**HWK, Neubau Erweiterung Haus 7, Hansemann**	**530 Tage**	**Mo 27.01.25**	**Mi 31.03.27**		**6%**	
2	**Planung BA1 LP5 Ausführungsplanung**	**205 Tage**	**Mo 24.02.25**	**Mo 29.12.25**		**26%**	
32	**LP 6 LV/ Vergabe/ Submission/ Beauftragung**	465 Tage	Mo 27.01.25	Mi 16.12.26		4%	
152	**Bauablauf**	**369 Tage**	**Mo 22.09.25**	**Mi 31.03.27**		**0%**	
153	**zusätzliche Bohrungen Hansemann**	**5 Tage**	**Mo 22.09.25**	**Fr 26.09.25**		**0%**	
154	zusätzliche Bohrungen inkl. Auswertung	5 Tage	Mo 22.09.25	Fr 26.09.25	49EA+5 Tage	0%	chnik/ Firma
155	**Teilabbruch Hansemann**	**10 Tage**	**Mi 01.10.25**	**Mi 15.10.25**		**0%**	
156	Teilabbruch	10 Tage	Mi 01.10.25	Mi 15.10.25	44EA+10 Tage	0%	KSA/ Firma
157	**Gerüst- Erd- Rohbauarbeiten**	**122 Tage**	**Mo 19.01.26**	**Fr 17.07.26**		**0%**	
158	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mo 19.01.26	Di 20.01.26	58EA+9 Tage	0%	KSA/ Firma
159	Erdarbeiten/ Bodenaustausch bis 2m/ Gründung	52 Tage	Mo 02.02.26	Do 16.04.26		0%	KSA/ Firma
160	Rohbauarbeiten inkl. Mauerarbeiten innen, ohne Klinker	3 Monate	Fr 17.04.26	Fr 17.07.26	159	0%	KSA/ Firma
161	**Dachdichtungsarbeiten**	**30 Tage**	**Mo 20.07.26**	**Fr 28.08.26**		**0%**	
162	Dacheindichtung mit Sheds	30 Tage	Mo 20.07.26	Fr 28.08.26	160	0%	KSA/ Firma
163	**Einbau Fenster/ Aussentüren**	**15 Tage**	**Mo 17.08.26**	**Fr 04.09.26**		**0%**	
164	Einbau Fenster/ Aussentüren	15 Tage	Mo 17.08.26	Fr 04.09.26	162EA-10 Tage	0%	KSA/ Firma
165	**Klinker**	**40 Tage**	**Mi 02.09.26**	**Di 27.10.26**		**0%**	
166	Klinker	40 Tage	Mi 02.09.26	Di 27.10.26	164EA-3 Tage	0%	KSA/ Firma
167	**Innenputzarbeiten**	**10 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**	
168	Innenputzarbeiten	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	184	0%	KSA/ Firma
169	**Trockenbau**	**10 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**	
170	Wände einseitig stellen	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	168AA	0%	KSA/ Firma
171	**TGA Grobinstallation**	**40 Tage**	**Mo 24.08.26**	**Fr 16.10.26**		**0%**	
172	Vorbereitende Maßnahmen	10 Tage	Mo 24.08.26	Mo 07.09.26	173AE	0%	
173	Grobinstallation Elektro HSL	30 Tage	Mo 07.09.26	Fr 16.10.26	184	0%	G-Tec/Firma
174	**Trockenbau**	**58 Tage**	**Mo 19.10.26**	**Mo 18.01.27**		**0%**	
175	Wände schließen	10 Tage	Mo 19.10.26	Fr 30.10.26	173	0%	KSA/ Firma
176	Decken glatt, akustik und Friese	10 Tage	Mo 02.11.26	Fr 13.11.26	175	0%	
177	Rasterdecken	10 Tage	Di 05.01.27	Mo 18.01.27	pe;184EA+3 Tage	0%	
178	**Estrich**	**10 Tage**	**Mo 02.11.26**	**Fr 13.11.26**		**0%**	
179	Estrich einbauen	10 Tage	Mo 02.11.26	Fr 13.11.26	175	0%	KSA/ Firma
180	**Einbau Zargen Trockenbau/ Mauerwerk**	**5 Tage**	**Mo 16.11.26**	**Fr 20.11.26**		**0%**	
181	Einbau Zargen 2-teilig	5 Tage	Mo 16.11.26	Fr 20.11.26	179	0%	KSA/ Firma
182	**Fliesenarbeiten**	**20 Tage**	**Mo 23.11.26**	**Fr 18.12.26**		**0%**	
183	Fliesenarbeiten Bäder Wände	10 Tage	Mo 23.11.26	Fr 04.12.26	179EA+5 Tage	0%	KSA/ Firma
184	Fliesenarbeiten Bäder Böden	10 Tage	Mo 07.12.26	Fr 18.12.26	183	0%	KSA/ Firma
185	**Malerarbeiten**	**42 Tage**	**Mo 23.11.26**	**Fr 29.01.27**	**179**	**0%**	
186	Malerarbeiten	42 Tage	Mo 23.11.26	Fr 29.01.27	179EA+5 Tage	0%	KSA/ Firma
187	TGA Feininstallation	30 Tage	Mo 04.01.27	Fr 12.02.27		0%	
188	Feininstallation HSL	30 Tage	Mo 04.01.27	Fr 12.02.27	5;186AA+22 Tage	0%	G-Tec/Firma
189	Feininstallation ELT	30 Tage	Mo 04.01.27	Fr 12.02.27	AA+5 Tage;186AA	0%	G-Tec/Firma
190	**Bodenbelagsarbeiten /Parkettarbeiten**	**27 Tage**	**Mo 07.12.26**	**Fr 22.01.27**		**0%**	
191	Bodenbelagsarbeiten/ Parkettarbeiten	27 Tage	Mo 07.12.26	Fr 22.01.27	186AA+10 Tage	0%	KSA/ Firma
192	**Ausstattung Werkstatteinrichtung**	**15 Tage**	**Mo 01.02.27**	**Fr 19.02.27**		**0%**	
193	Werkstatteinrichtung mit Anschluß an vorangegangene Installation	15 Tage	Mo 01.02.27	Fr 19.02.27	188EA-10 Tage;188EA-10 Tage	0%	G-Tec/Firma
194	**Schreinerarbeiten Innentüren**	**5 Tage**	**Mo 25.01.27**	**Fr 29.01.27**		**0%**	
195	Einbau Türen	5 Tage	Mo 25.01.27	Fr 29.01.27	191	0%	KSA/ Firma
196	**Brandschutztüren**	**5 Tage**	**Mo 25.01.27**	**Fr 29.01.27**		**0%**	
197	Einbau Brandschutztüren	5 Tage	Mo 25.01.27	Fr 29.01.27	191	0%	KSA/ Firma
198	**Aussenanlagen**	**40 Tage**	**Mo 11.01.27**	**Fr 05.03.27**		**0%**	
199	Aussenanlagen	40 Tage	Mo 11.01.27	Fr 05.03.27	186	0%	nts/Firma
200	**Inbetriebnahme TGA**	**15 Tage**	**Mo 22.02.27**	**Fr 12.03.27**		**0%**	
201	Inbetriebnahme TGA/ELT	15 Tage	Mo 22.02.27	Fr 12.03.27	193	0%	G-Tec/Firma
202	**Baureinigung grob**	**3 Tage**	**Mo 25.01.27**	**Mi 27.01.27**		**0%**	
203	Baureinigung grob	3 Tage	Mo 25.01.27	Mi 27.01.27	191	0%	KSA/ Firma
204	**Sachverständigen Abnahmen TGA/ Brandschutz**	**5 Tage**	**Mo 15.03.27**	**Fr 19.03.27**		**0%**	
205	Sachverständigen Abnahmen	5 Tage	Mo 15.03.27	Fr 19.03.27	201	0%	G-Tec/Firma
206	**Zwischenabnahme Baugewerke**	**5 Tage**	**Mo 01.02.27**	**Fr 05.02.27**		**0%**	
207	Zwischenabnahme	5 Tage	Mo 01.02.27	Fr 05.02.27	197	0%	KSA/G-TEC
208	**Restarbeiten alle Gewerke**	**15 Tage**	**Mo 08.02.27**	**Fr 26.02.27**		**0%**	
209	Restarbeiten	15 Tage	Mo 08.02.27	Fr 26.02.27	207	0%	VG-TEC/nts
210	**Feinreinigung**	**5 Tage**	**Mo 01.03.27**	**Fr 05.03.27**		**0%**	
211	Feinreinigung	5 Tage	Mo 01.03.27	Fr 05.03.27	209	0%	KSA/ Firma
212	**Abnahmen**	**10 Tage**	**Mo 08.03.27**	**Fr 19.03.27**		**0%**	
213	Abnahmen TGA/ Bau/ Freiraumplanung	10 Tage	Mo 08.03.27	Fr 19.03.27	211	0%	G-TEC/nts
214	**Abnahme Bauamt**	**2 Tage**	**Mo 22.03.27**	**Di 23.03.27**		**0%**	
215	Abnahme Bauamt mit Vorlage Abnahmebescheinigung Firmen und Sachverständige	2 Tage	Mo 22.03.27	Di 23.03.27	213	0%	SA/G-TEC
216	Feinreinigung 2	4 Tage	Mi 24.03.27	Mi 31.03.27		0%	
217	Feinreinigung 2	4 Tage	Mi 24.03.27	Mi 31.03.27	215	0%	KSA/ Firma
218	**Übergabe Bauherr**	**0 Tage**	**Mi 31.03.27**	**Mi 31.03.27**		**0%**	
219	Übergabe	0 Tage	Mi 31.03.27	Mi 31.03.27	217	0%	VG-TEC/nts

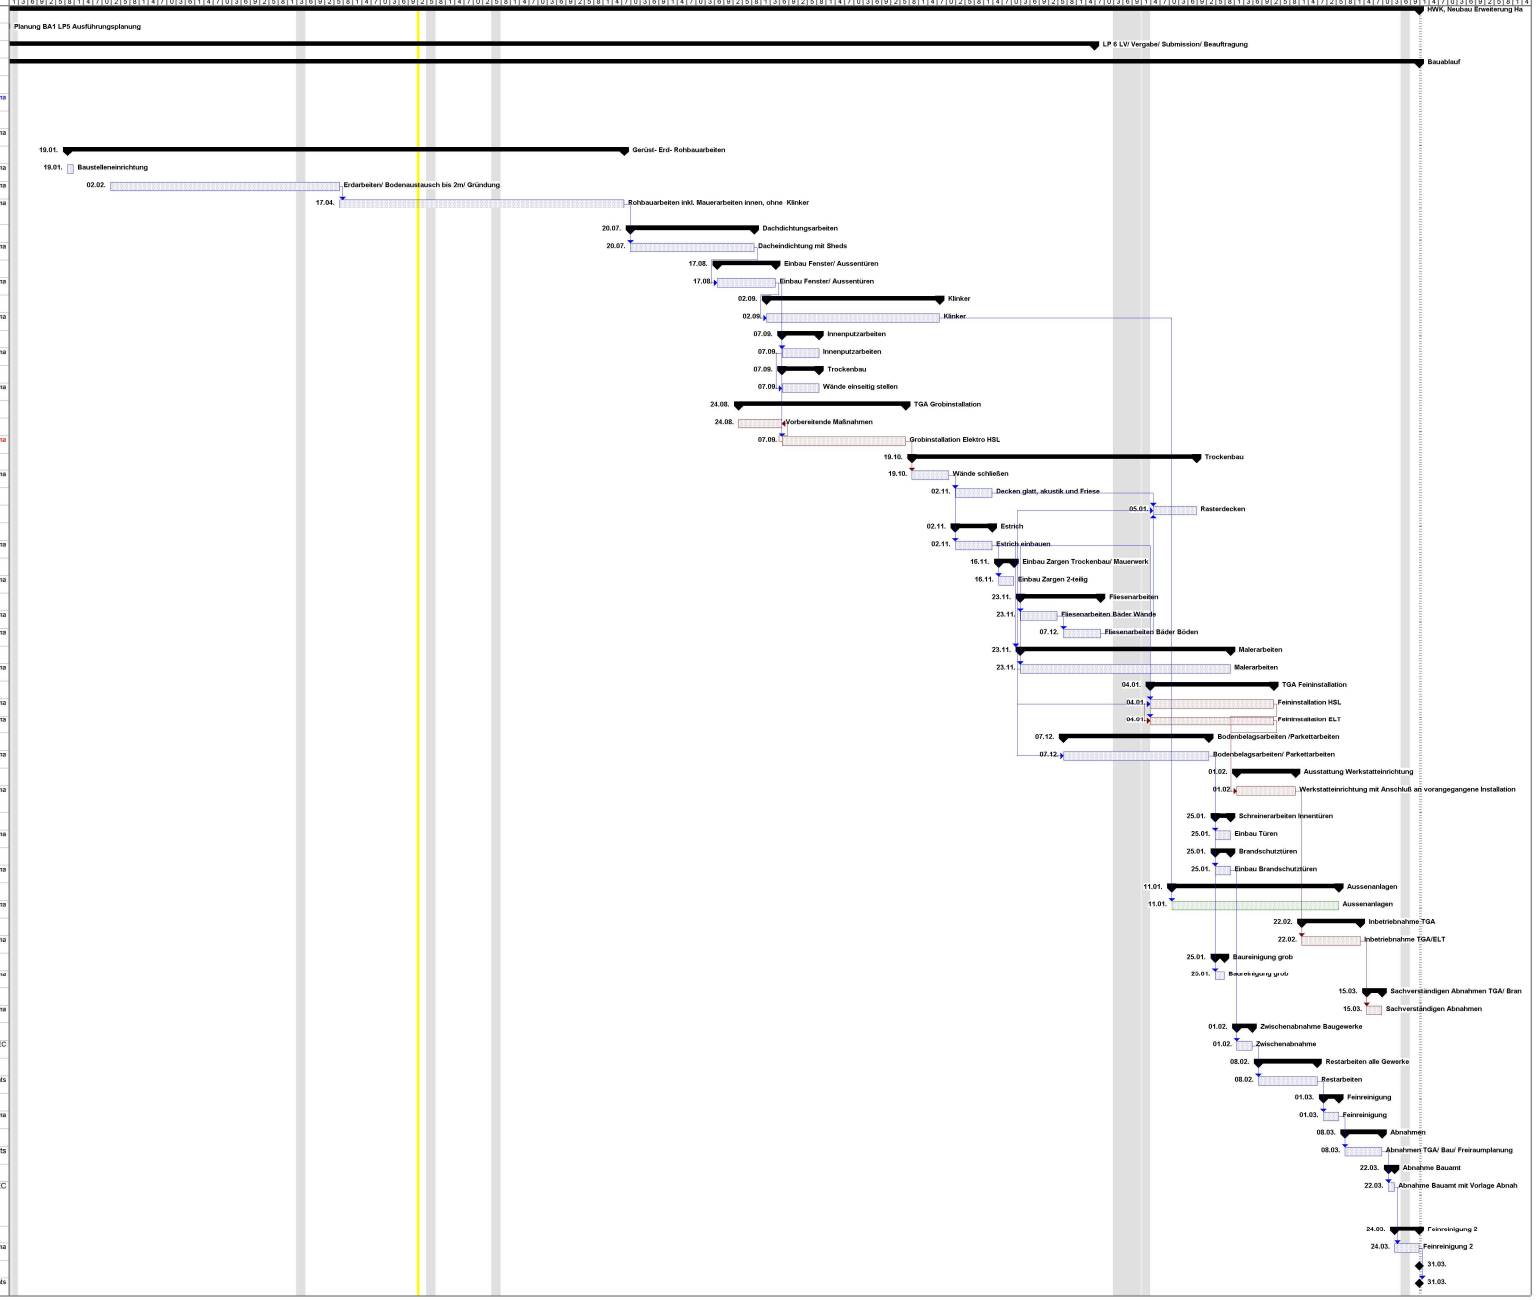

HWK_BDO-HN Handwerkskammer Standort Hansemann
Terminplan 05
Di 12.05.26

Vorgang | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Rollup: Vorgang | Rollup: Meilenstein | Rollup: In Arbeit | Unterbrechung | Externe Vorgänge | Projektsammelvorgang | Gruppenkopf | Stichtag
