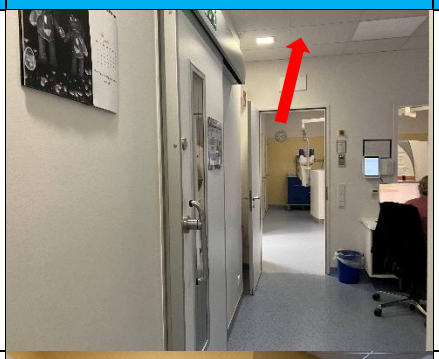
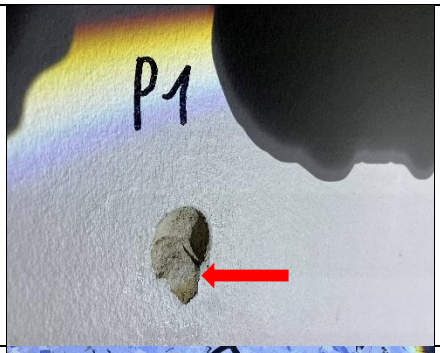
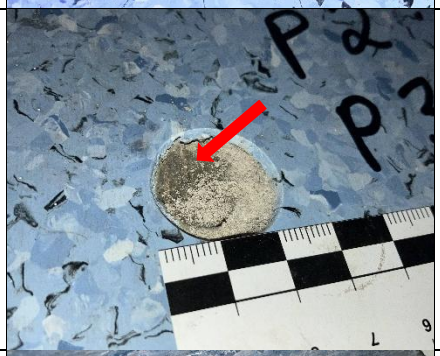
Fotodokumentation schadstoffhaltiger Baustoffe-/Teile (gegliedert nach Schadstoffen)

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
Asbesthaltige Baustoffe					
E01, R306, Wand (Fenster, Außenseite)	Kittdichtung, grau		Asbest	P 15	**Asbest nachweisbar** (1-5 M.-% Chrysotil)
E01, R306, Fensterbank (Fenster, Außenseite)	Abdichtungs-bahn, schwarz		Asbest/KMF, PAK	P 21	**Asbest nachweisbar** (Chrysotil) PAK n.b.
E01, R306, Wand (Fenster, Innenseite)	Kittdichtung, grau		Asbest	P 22	**Asbest*** (vgl. P 15)
Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) (Einstufung als „Altprodukte" bei unbekanntem BJ)					
E01, Fassade, Dämm-matten hinter Beton-elementen	KMF-Dämmung		KMF	/	**KMF der WHO-Kategorie 1B***

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
E1, Bereich MRT/ Röntgen, Decke	KMF-Deckenplatten		KMF	/	**KMF der WHO-Kategorie 1B***
E1, Bereich MRT/ Röntgen, Leichtbau-wände	Dämmung vermutet		KMF	/	**KMF der WHO-Kategorie 1B***
PCB-haltige Baustoffe					
E01, R306, Fenster-laibung (Anschluss-fuge)	Fugendicht-stoff, grau		Asbest, PCB/ Chlorparaffine	P 16	kein Asbest nachweisbar **150 mg/kg PCB** 21.000 mg/kg EOX[1]
E01, Fassade, Wand (Dehnfuge)	Fugendicht-stoff, grau		Asbest, PCB/ Chlorparaffine	P 17	kein Asbest nachweisbar **24.000 mg/kg PCB** 23.000 mg/kg EOX[1]

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
Bituminöse Baustoffe (< 30 mg/kg PAK; < 50 mg/kg Benzo[a]pyren) (Asphalt: < 25 mg/kg PAK)					
E01, Fassade, Sockel-bereich	Anstrich, schwarz		Asbest, PAK	P 18	kein Asbest nachweisbar 2,17 mg/kg PAK
E1, Außen-bereich, Feuerwehr-zufahrt, Boden	Asphalt		PAK, Phenole	KB 1	2,39 mg/kg PAK < 0,01 mg/l Phenolindex
E1, 1305.1, Bodenauf-bau	Abdichtung, schwarz		Asbest/KMF, PAK	KB 2.4	keine kanzerogenen Fasern nachweisbar 19,4 mg/kg PAK
Althölzer der Kategorie IV					
E01, Außen-bereich	Holzrahmen-fenster		Holzschutz -mittel	/	**Altholz der Kategorie IV***

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
Fotodokumentation aller Materialproben ohne Schadstoffbefund bzw. ohne Überschreitung von Grenzwerten					
E1, R1304.1, Wand (fassadenseitig)	Anstrich, weiß + Putz, hellgrau		Asbest	P 1	kein Asbest nachweisbar *(vgl. MP-Putz-1)*
E1, 1303.3, Boden	PVC, blau-gefleckt		Asbest	P 2	kein Asbest nachweisbar
E1, 1303.3, Boden	Klebstoff grau + Ausgleichs-masse, grau		Asbest	P 3	kein Asbest nachweisbar
E1, R1304.1, Boden	PVC, hellblau-gestreift		Asbest	P 4	kein Asbest nachweisbar

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
E1, R1304.1, Boden	Kleber, gelb		Asbest	P 5	kein Asbest nachweisbar
E1, R1304.1, Boden	Ausgleichs-masse, grau		Asbest	P 6	kein Asbest nachweisbar
E1, R1304.1, Wand	Anstrich, gelb + Putz, weiß-beige		Asbest	P 7	kein Asbest nachweisbar *(vgl. MP-Putz-1)*
E1, R1305, Boden	PVC, beige-schwarz-gefleckt		Asbest	P 8	kein Asbest nachweisbar

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
E1, R1305, Boden	Klebstoff, grau + Ausgleichs-masse, grau		Asbest	P 9	kein Asbest nachweisbar
E1, R1305, Wand (fassaden-seitig)	Gipskarton		Asbest	P 10	*Rückstellprobe (vgl. P 1)*
E1, R1305, Wand	Gipskarton		Asbest	P 11	*Rückstellprobe (vgl. P 7)*
E01, R306, Wand (fassaden-seitig)	Fliese, weiß		Schwer-metalle	P 12	kein erhöhter Schwermetallgehalt

Entnahme-ort/ Einbauort	Baustoff/ Konta-mination	Foto	Schadstoff - verdacht	Probe	Ergebnis/ (*= Einstufung ohne Analyse)
E01, R306, Wand (fassaden-seitig)	Dünnbett-mörtel, grau		Asbest	P 13	kein Asbest nachweisbar
E01, R306, Wand	Putz, grau		Asbest	P 14	kein Asbest nachweisbar
E01, Fassade, Wand	Beschichtung, beige		Asbest, PCB, SM	P 19	kein Asbest nachweisbar 26 mg/kg PCB kein erhöhter Schwermetallgehalt
E01, R306, Fenster-laibung (Reste Holzfenster, Außenseite)	Fugendicht-stoff, grau		Asbest, PCB/ Chlorparaffine	P 20	kein Asbest nachweisbar 31 mg/kg PCB 17 mg/kg EOX[1]

[1] *Durch den Indikator-Analysenparameter „EOX“ (extrahierbare organisch gebundene Halogene) werden Fugendichtmassen indirekt auf das Vorhandensein von „Chlorparaffinen“ (CP) analysiert. Ein hoher EOX-Gehalt in Fugendichtmassen bestätigt i.d.R. den materialspezifischen Verdacht auf den Zusatz von Chlorparaffinen (Summenparameter EOX wird durch das Chlor in den CP-Verbindungen erhöht).*
