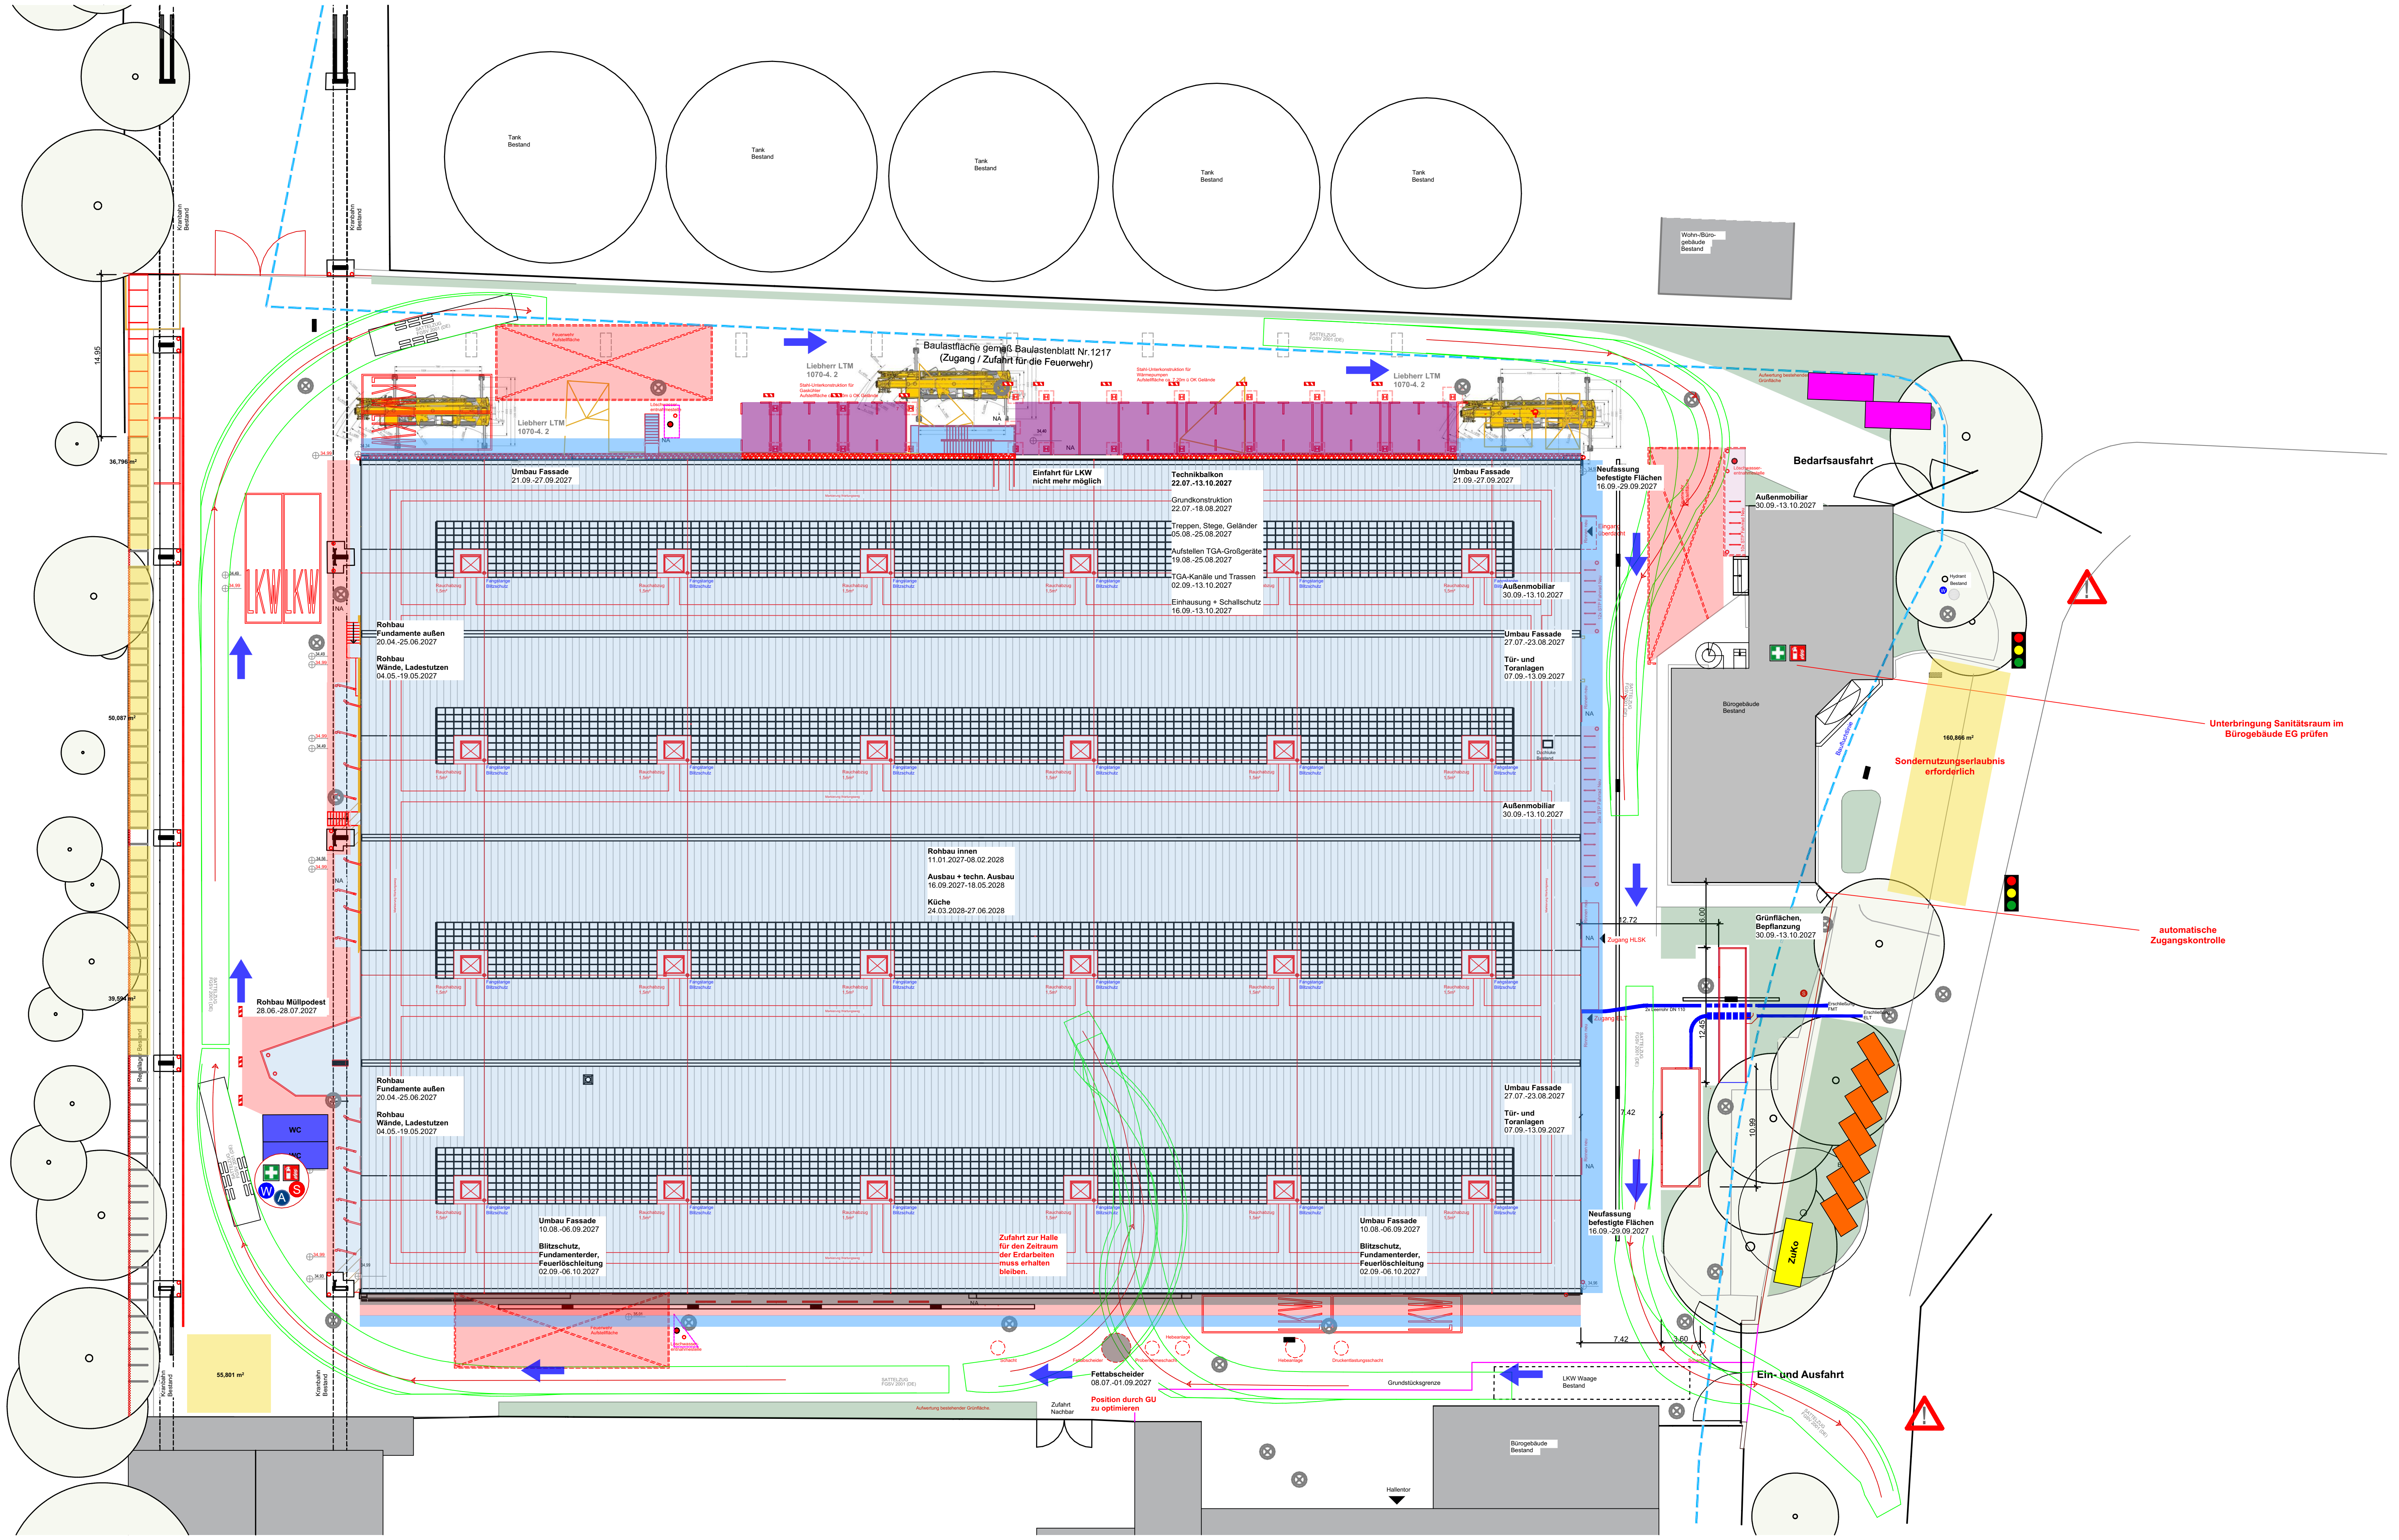

LEGENDE

- – – Bauzaun, offen
- — Bauzaun, geschlossen
- – – Grundstücksgrenze
- – – Veränderte Verkehrsführung Baustellenzufahrt
- ➡ Baustellenverkehr
- ➡ Fußverkehr
- ▭ Baustraße, Asphalt
- 🟨 Logistikfläche
- ▭ Erdarbeiten, Leitungsbau, Fundamente
- 🟦 Fassaden- / Hochbauarbeiten
- 🟪 Technikbauten / TGA-Montagen
- 🟩 Grünflächen / Bepflanzung
- ▭ Aushubebene Endzustand
- ▭ Oberflächenarbeiten
- ▭ Rohbau
- ▨ Baugerüst
- — Verbaulinie
- – – Außenkante Bauwerk
- – – Böschungskante
- – – Führung Fußgänger, Leit/Warnbaken
- — Rückbau
- 🟨 Zugangscontainer/-kontrolle
- 🟩 Büro-/Unterkunftscontainer
- 🟦 Sanitärcontainer
- 🟪 Magazincontainer
- 🟧 Entsorgungscontainer/Absetzmulde
- ▭ Gastank
- ▨ mögl. Stellfläche Betonpumpe
- ☒ mögl. Stellfläche Turmdrehkran
- 🟥 Öffentlicher Bereich, nicht mit Lasten zu überschwenken
- ▶ Zu-/Ausgang
- Bauzauntor
- ⊗ Drehkreuz
- — Schranke mit Unterlaufschutz
- – – Baumschutzzaun mit Wurzelschutz
- Mastleuchte
- Beleuchtung Verkehrswege am Bauzaun
- ⊡ Videoüberwachung mit Lautsprecher und Beleuchtung
- S Ein-/Ausspeisung Baustrom
- W Ein-/Ausspeisung Frischwasser
- A Abführung Abwasser
- SW Einspeisung Schmutzwasser
- RW Einspeisung Regenwasser
- – – Versorgungsleitung Baustrom
- – – Versorgungsleitung Bauwasser
- Baustrom-Mietstation
- mögl. Standort Transportbühne
- H Standort Hydrant
- ✚ Standort großer Erste-Hilfe-Kasten
- Standort Feuerlöscher
- Fluchtweg
- Leit-/Warnbake
- ⚠ Vorsicht Baustellenverkehr kreuzt
- Gegenverkehr Vorrang gewähren
- 12t max. Gesamtlast
- 3,5m max. Durchfahrtshöhe
- 3m max. Durchfahrtsbreite
- 🚦 Ampelanlage
- Feuerwehrzufahrt

TERMINLISTE PHASE B

	Phase B1 26.02.-19.04.2027	Phase B2 20.04.-26.05.2027	Phase B3 27.05.-07.07.2027	Phase B4 08.07.-13.10.2027	Phase B5 14.10.2027-20.01.2028	Phase B6 21.01.-17.02.2028	Phase B7 18.02.-18.05.2028
NO	Fundamente	Blitzschutz, Fundamenterder, Feuerlöschleitung	--	Umbau Fassade	--	--	--
SO	--	--	Blitzschutz, Fundamenterder, Feuerlöschleitung	Umbau Fassade, Neufassung befestigter Flächen, Außenmobiliar, Grünflächen	--	--	--
SW	--	--	--	Blitzschutz, Fundamenterder, Feuerlöschleitung Fettabscheider, Umbau Fassade	Außenmobiliar, Markierungen, Grünfläche	--	--
NW	Rohbau Abbruch Wandbauteile	Rohbau Fundamente außen, Blitzschutz, Fundamenterder	Rohbau Fundamente außen, Rohbau Wände und Ladestutzen, Müllpodest	Rohbau Fundamente außen, Rohbau Wände und Ladestutzen, Müllpodest	Logistikfläche Rampenbereich innere Fahrspur, Schallschutzwand	Logistikfläche Rampenbereich äußere Fahrspur (Sperrung der Umfahrung)	Logistikfläche Rampenbereich äußere Fahrspur (Sperrung der Umfahrung)
Technikbalkon	Fundamente	--	--	Grundkonstruktion, TGA-Großgeräte, Geländer und Treppen, Kanäle und Trassen	--	--	--
Technikbauten	NEA- und ELT-Fundament, Stützmast, Abgasrohr	--	--	--	--	Montage/Aufstellen NEA, ELT, Rückkühler	--

Änderungen	*Name*	*Datum*	*Index*
Erstellt	SH	20.08.2026	00

HINWEISE:

STANDORTE UND AUSFÜHRUNG KRAN, CONTAINER, RAMPEN ETC. SIND KEINE VORGABE DER BAULOGISTIK UND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN, ZU PLANEN UND UMZUSETZEN

ZUFAHRTSSITUATION UND BAUSTELLEN-SICHERUNG SIND SACHE DES AUFTRAGNEHMERS

EINGRIFFE IN ÖFFENTLICHE BEREICHE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER MIT DEN ENTSPRECHENDEN ÄMTERN ABZUSTIMMEN UND GGF. ZU BEANTRAGEN - DIE VORGABEN AUS GENEHMIGUNGEN SIND UMZUSETZEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

Projektnummer	*LP*	*Fachplaner*	*Planinhalt*	*Planteil*	*Index*
0804	E	BL_	LP04_	--	00

Fachplanung

Ebel Scientific Consulting GmbH

Maximilianstraße 56
48147 Münster
0251 922 615 62
ge@ebel-sc.de

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

BAUHERR

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH
vertreten durch
VIVANTES SERVICE GmbH
Fachbereich Bau
Aroser Allee 72-76,13407 Berlin

PROJEKT

Speiseverteilzentrum VZ II
Seidelbastweg 145
12357 Berlin

PLANUNG

HPP Generalplanung GmbH
Zollhof 26
40221 Düsseldorf

Standort Berlin
Neue Grünstraße 18
10179 Berlin

Baulogistik	Phasenplanung BPH B4: 08.07.-13.10.2027	
Blattgröße: 841 / 594 cm	*Bearb.* SH	*Maßstab:* 1:500
	DATEI 2026-08-19_SVZ_Bauphasenplanung	*PLOTDATUM*
		ERSTELLDATUM 20.08.2026
