Vivantes Speiseverteilzentrum VZ II
Seidelbastweg 145, 12357 Berlin Neukölln
Projekt-Nr. Vivantes: 0804 (SBW)

Rahmenterminplan
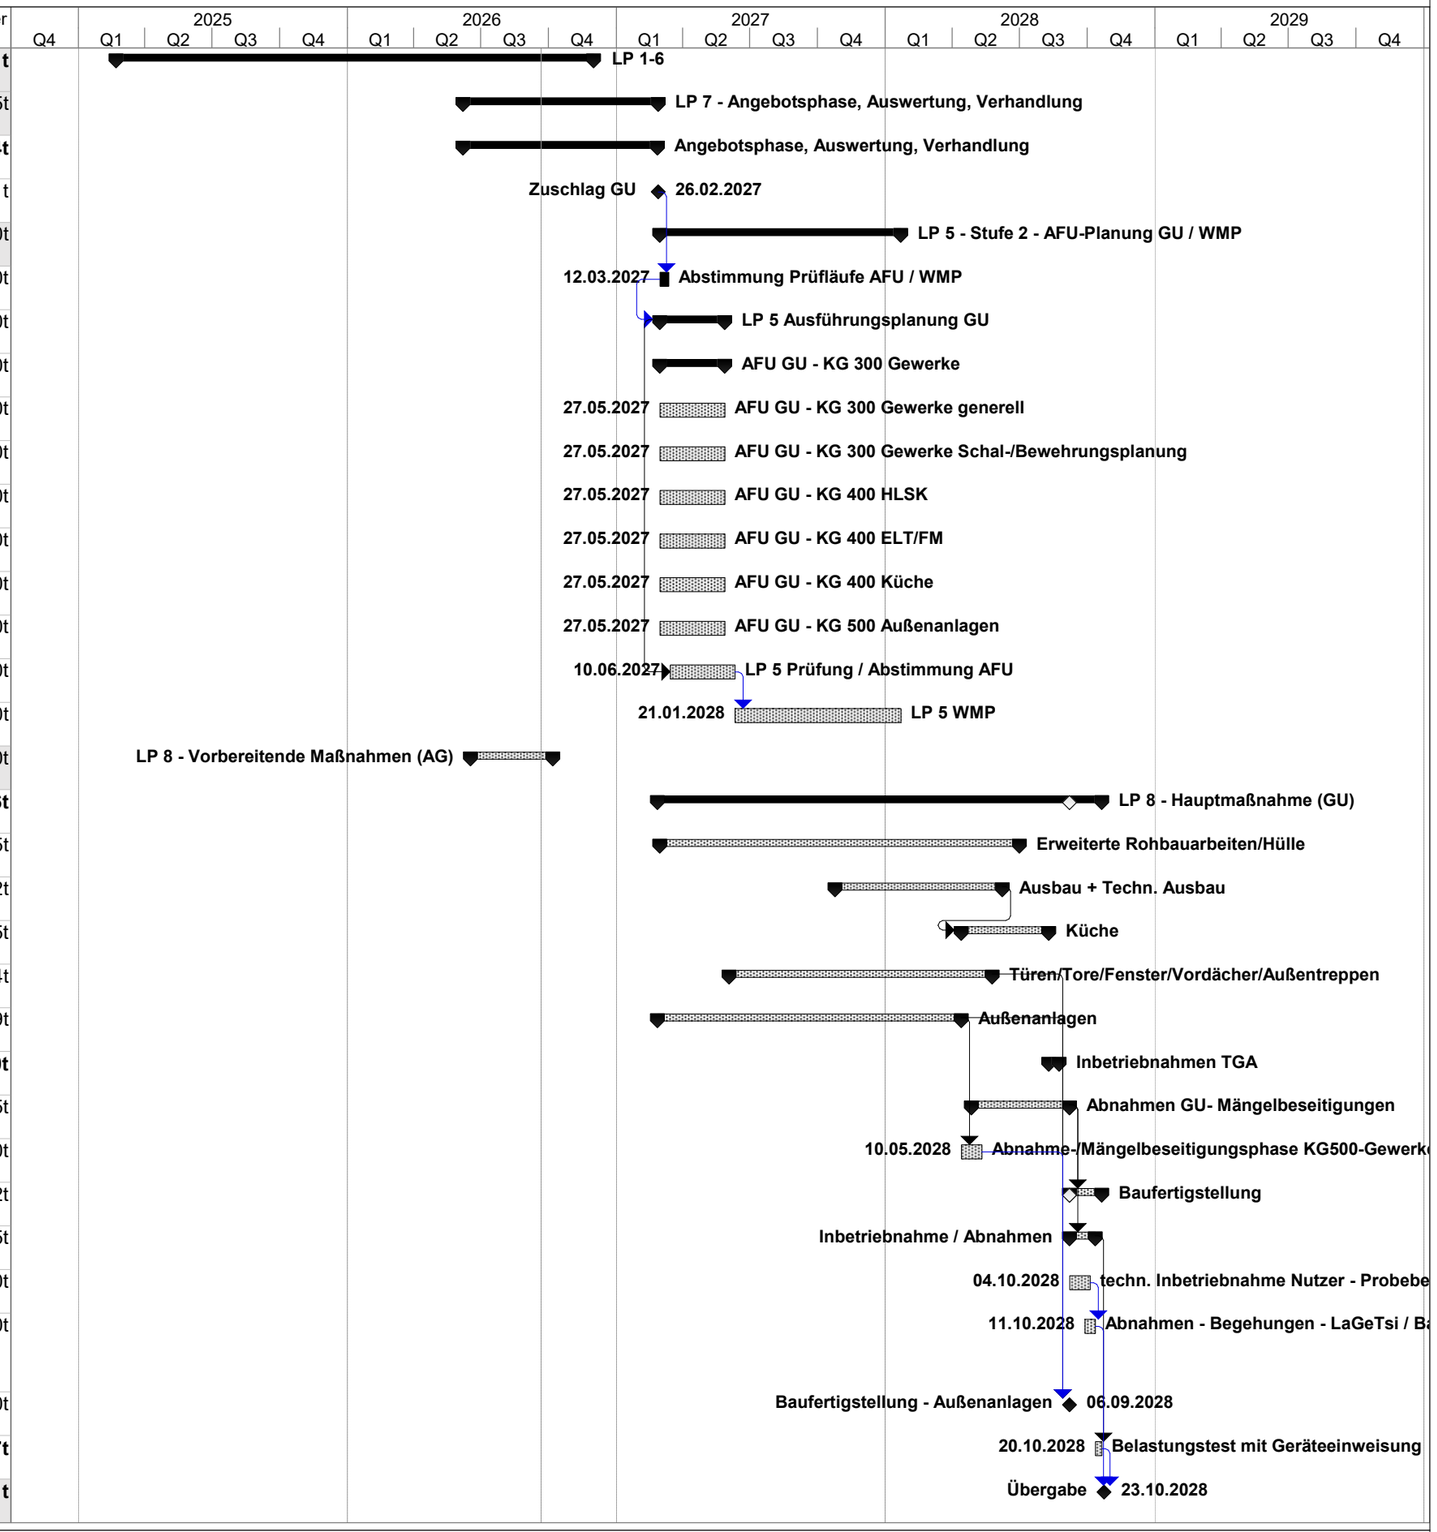
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**LP 1-6**	**Fre 21.02.25**	**Mon 30.11.26**	**441t**
96	**LP 7 - Angebotsphase, Auswertung, Verhandlung**	**Son 07.06.26**	**Fre 26.02.27**	175t
97	**Angebotsphase, Auswertung, Verhandlung**	**Son 07.06.26**	**Don 25.02.27**	**174t**
110	**Zuschlag GU**	**Fre 26.02.27**	**Fre 26.02.27**	1t
111	**LP 5 - Stufe 2 - AFU-Planung GU / WMP**	**Mon 01.03.27**	**Fre 21.01.28**	220t
112	Abstimmung Prüfläufe AFU / WMP	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	10t
113	**LP 5 Ausführungsplanung GU**	**Mon 01.03.27**	**Don 27.05.27**	60t
114	**AFU GU - KG 300 Gewerke**	**Mon 01.03.27**	**Don 27.05.27**	60t
115	AFU GU - KG 300 Gewerke generell	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
116	AFU GU - KG 300 Gewerke Schal-/Bewehrungsplanung	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
117	AFU GU - KG 400 HLSK	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
118	AFU GU - KG 400 ELT/FM	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
119	AFU GU - KG 400 Küche	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
120	AFU GU - KG 500 Außenanlagen	Mon 01.03.27	Don 27.05.27	60t
121	LP 5 Prüfung / Abstimmung AFU	Mon 15.03.27	Don 10.06.27	60t
122	LP 5 WMP	Fre 11.06.27	Fre 21.01.28	150t
123	**LP 8 - Vorbereitende Maßnahmen (AG)**	**Mit 17.06.26**	**Die 06.10.26**	80t
132	**LP 8 - Hauptmaßnahme (GU)**	**Fre 26.02.27**	**Fre 20.10.28**	**416t**
133	**Erweiterte Rohbauarbeiten/Hülle**	**Mon 01.03.27**	**Fre 30.06.28**	335t
190	**Ausbau + Techn. Ausbau**	**Mon 25.10.27**	**Mit 07.06.28**	152t
223	**Küche**	**Don 13.04.28**	**Mit 09.08.28**	85t
237	**Türen/Tore/Fenster/Vordächer/Außentreppen**	**Don 03.06.27**	**Mit 24.05.28**	244t
250	**Außenanlagen**	**Fre 26.02.27**	**Mit 12.04.28**	279t
305	**Inbetriebnahmen TGA**	**Don 10.08.28**	**Mit 23.08.28**	**10t**
308	**Abnahmen GU- Mängelbeseitigungen**	**Don 27.04.28**	**Mit 06.09.28**	95t
317	**Abnahme-/Mängelbeseitigungsphase KG500-Gewerke**	**Don 13.04.28**	**Mit 10.05.28**	20t
318	**Baufertigstellung**	**Mit 06.09.28**	**Fre 20.10.28**	32t
319	**Inbetriebnahme / Abnahmen**	**Don 07.09.28**	**Mit 11.10.28**	25t
320	techn. Inbetriebnahme Nutzer - Probebetrieb	Don 07.09.28	Mit 04.10.28	20t
321	Abnahmen - Begehungen - LaGeTsi / Bauordungsamt / Lebensmittelaufsicht	Don 28.09.28	Mit 11.10.28	10t
322	**Baufertigstellung - Außenanlagen**	**Mit 06.09.28**	**Mit 06.09.28**	0t
323	**Belastungstest mit Geräteeinweisung**	**Don 12.10.28**	**Fre 20.10.28**	**7t**
324	**Übergabe**	**Mon 23.10.28**	**Mon 23.10.28**	**1t**
