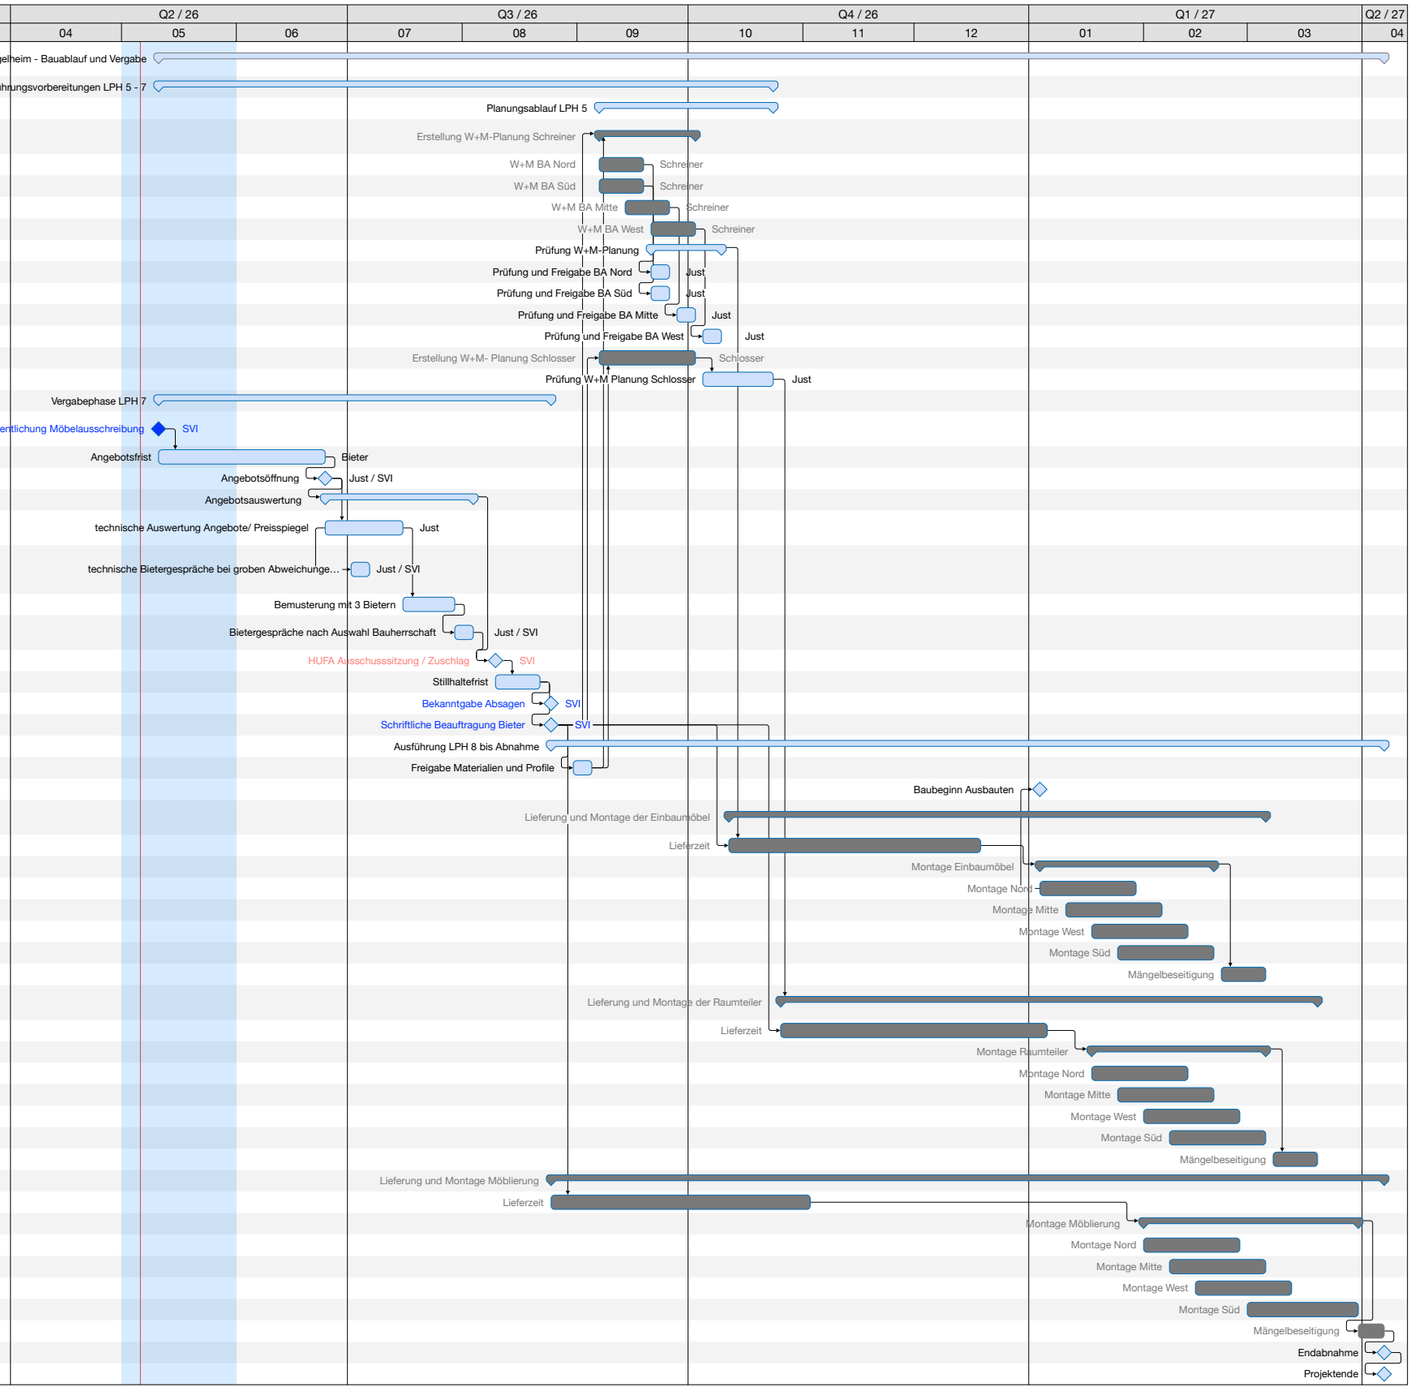#	Titel	Vorgabe Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Zuständigkeit	Wirklicher Start	Wirkliches Ende
0	**Neues Rathaus Ingelheim - Bauablauf und Vergabe**		**11.05.2026**	**06.04.2027**	**Schreiner; Just; Schlosser; SVI…**		
1	**Ausführungsvorbereitungen LPH 5 - 7**		**11.05.2026**	**23.10.2026**	**Schreiner; Jus…**		
2	**Planungsablauf LPH 5**		**07.09.2026**	**23.10.2026**	**Schreiner; Jus…**		
3	**Erstellung W+M-Planung Schreiner**	**5 Wochen**	**07.09.2026**	**02.10.2026**	**Schreiner**		
4	W+M BA Nord	2 Wochen	07.09.2026	18.09.2026	Schreiner		
5	W+M BA Süd	2 Wochen	07.09.2026	18.09.2026	Schreiner		
6	W+M BA Mitte	2 Wochen	14.09.2026	25.09.2026	Schreiner		
7	W+M BA West	2 Wochen	21.09.2026	02.10.2026	Schreiner		
8	**Prüfung W+M-Planung**	**3 Wochen**	**21.09.2026**	**09.10.2026**	**Just**		
9	Prüfung und Freigabe BA Nord	1 Woche	21.09.2026	25.09.2026	Just		
10	Prüfung und Freigabe BA Süd	1 Woche	21.09.2026	25.09.2026	Just		
11	Prüfung und Freigabe BA Mitte	1 Woche	28.09.2026	02.10.2026	Just		
12	Prüfung und Freigabe BA West	1 Woche	05.10.2026	09.10.2026	Just		
13	Erstellung W+M- Planung Schlosser	4 Wochen	07.09.2026	02.10.2026	Schlosser		
14	Prüfung W+M Planung Schlosser	3 Wochen	05.10.2026	23.10.2026	Just		
15	**Vergabephase LPH 7**		**11.05.2026**	**24.08.2026**	**SVI; Bieter; Ju…**		
16	Veröffentlichung Möbelausschreibung		11.05.2026	11.05.2026	SVI		
17	Angebotsfrist	30 Tage	11.05.2026	24.06.2026	Bieter		
18	Angebotsöffnung		24.06.2026	24.06.2026	Just / SVI		
19	**Angebotsauswertung**	**5 Wochen**	**25.06.2026**	**03.08.2026**	**Just; Just / SVI**		
20	technische Auswertung Angebote/ Preisspiegel	3 Wochen	25.06.2026	15.07.2026	Just		
21	technische Bietergespräche bei groben Abweichungen vom Preisspiegel	3 Tage	02.07.2026	06.07.2026	Just / SVI		
22	Bemusterung mit 3 Bietern	2 Wochen	16.07.2026	29.07.2026			
23	Bietergespräche nach Auswahl Bauherrschaft	3 Tage	30.07.2026	03.08.2026	Just / SVI		
24	HUFA Ausschusssitzung / Zuschlag		10.08.2026	10.08.2026	SVI		
25	Stillhaltefrist	10 Tage	10.08.2026	21.08.2026			
26	Bekanntgabe Absagen		24.08.2026	24.08.2026	SVI		
27	Schriftliche Beauftragung Bieter		24.08.2026	24.08.2026	SVI		
28	**Ausführung LPH 8 bis Abnahme**		**25.08.2026**	**06.04.2027**			
29	Freigabe Materialien und Profile	1 Woche	31.08.2026	04.09.2026			
30	Baubeginn Ausbauten		04.01.2027	04.01.2027			
31	**Lieferung und Montage der Einbaumöbel**	**14 Wochen**	**12.10.2026**	**05.03.2027**			
32	Lieferzeit	10 Wochen	12.10.2026	18.12.2026			
33	**Montage Einbaumöbel**	**4 Wochen**	**04.01.2027**	**19.02.2027**			
34	Montage Nord	4 Wochen	04.01.2027	29.01.2027			
35	Montage Mitte	4 Wochen	11.01.2027	05.02.2027			
36	Montage West	4 Wochen	18.01.2027	12.02.2027			
37	Montage Süd	4 Wochen	25.01.2027	19.02.2027			
38	Mängelbeseitigung	2 Wochen	22.02.2027	05.03.2027			
39	**Lieferung und Montage der Raumteiler**	**14 Wochen**	**26.10.2026**	**19.03.2027**			
40	Lieferzeit	10 Wochen	26.10.2026	05.01.2027			
41	**Montage Raumteiler**	**4 Wochen**	**18.01.2027**	**05.03.2027**			
42	Montage Nord	4 Wochen	18.01.2027	12.02.2027			
43	Montage Mitte	4 Wochen	25.01.2027	19.02.2027			
44	Montage West	4 Wochen	01.02.2027	26.02.2027			
45	Montage Süd	4 Wochen	08.02.2027	05.03.2027			
46	Mängelbeseitigung	2 Wochen	08.03.2027	19.03.2027			
47	**Lieferung und Montage Möblierung**	**14 Wochen**	**25.08.2026**	**06.04.2027**			
48	Lieferzeit	10 Wochen	25.08.2026	02.11.2026			
49	**Montage Möblierung**	**4 Wochen**	**01.02.2027**	**30.03.2027**			
50	Montage Nord	4 Wochen	01.02.2027	26.02.2027			
51	Montage Mitte	4 Wochen	08.02.2027	05.03.2027			
52	Montage West	4 Wochen	15.02.2027	12.03.2027			
53	Montage Süd	4 Wochen	01.03.2027	30.03.2027			
54	Mängelbeseitigung	1 Woche	31.03.2027	06.04.2027			
55	**Endabnahme**		**06.04.2027**	**06.04.2027**			
56	Projektende		06.04.2027	06.04.2027
