Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Bauphase 1 + 2 - Baufeldfreimachung und Kampfmittelsondierung im Verbaubereich	62 Tage	Mon 04.12.28 08:00	Die 30.01.29 17:00	
2	*bahnbetriebliche Vorleistungen werden in 24 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche ausgeführt*	0 Tage	Mon 04.12.28 08:00	Mon 04.12.28 08:00	
3	TSP Str 1280 (Sperrung 1280-1 und 1280-2, 1291 offen)	96 Std.	Mit 03.01.29 00:00	Son 07.01.29 00:00	7AA
4	du. Glsp 1280-2 und Strsp 1291 (1280-1 offen)	96 Std.	Son 07.01.29 00:00	Don 11.01.29 00:00	9AA
5	Baumfäll- und Rodungsarbeiten ausführen	7 Tage	Mon 04.12.28 08:00	Die 12.12.28 17:00	
6	Herstellen Baustelleneinrichtung (Baufeld freimachen, Fläche herrichten, Bauzaun stellen, Stromversorgung sowie Wasser -ver und -entsorgung einrichten)	15 Tage	Mit 13.12.28 08:00	Die 02.01.29 17:00	5
7	bahnbetriebliche Vorleistungen auf der Nordseite: Baufeldfreimachung in Form von Verlegen der Speiseleitung und Speisekabel auf eine bauzeitliche	96 Std.	Mit 03.01.29 00:00	Son 07.01.29 00:00	6
8	Kampfmittelsondierung im Verbaubereich (nachrichtlich)	43 Std.	Mit 03.01.29 00:00	Don 04.01.29 19:00	7AA
9	bahnbetriebliche Vorleistungen auf der Südseite: Baufeldfreimachung in Form von Verlegen der Kabel auf eine bauzeitliche Behelfsbrücke	96 Std.	Son 07.01.29 00:00	Don 11.01.29 00:00	7
10	Kampfmittelsondierung im Verbaubereich (nachrichtlich)	43 Std.	Son 07.01.29 00:00	Mon 08.01.29 19:00	9AA
11	Anschütten der Zufahrtsrampen zum Bahndamm auf der Nord- und der Südseite	10 Tage	Don 11.01.29 08:00	Die 23.01.29 17:00	9EA+8 Std.
12	Rückbau der LSW auf der Südseite im betroffenen Bereich	5 Tage	Mit 24.01.29 08:00	Die 30.01.29 17:00	11
13	Stahlbestellung für Sonderhilfsbrücke und Vormontage Sonderhilfsbrücke	0 Tage	Die 30.01.29 17:00	Die 30.01.29 17:00	12
14	Bauphase 3 + 4 - Herstellung Verbau + HB in allen 3 Gleisen	437 Std.	Sam 03.02.29 02:00	Mit 21.02.29 16:00	
15	*Bauphase 3+4 werden in 24 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche ausgeführt*	0 Tage	Sam 03.02.29 02:00	Sam 03.02.29 02:00	
16	TSP Str 1280 (Sperrung 1280-1 und 1280-2, 1291 offen)	247 Std.	Sam 03.02.29 02:00	Die 13.02.29 09:00	18AA;24EE
17	du. Glsp 1280-2 und Strsp 1291 (1280-1 offen)	190 Std.	Die 13.02.29 09:00	Mit 21.02.29 16:00	29EE;24
18	OLA-Arbeiten für Baufreiheit Verbau, 1280-1 und 1280-2	15 Std.	Sam 03.02.29 02:00	Sam 03.02.29 17:00	
19	LST und Oberbau ausbauen für Verbau, 1280-1 und 1280-2	10 Std.	Sam 03.02.29 17:00	Son 04.02.29 03:00	18
20	Kampfmittelsondierung im Bereich der Anker	45 Std.	Son 04.02.29 03:00	Die 06.02.29 00:00	19
21	Verbauarbeiten und Hilfsbrückeneinbau (Zwillingsträgerhilfsbrücke), 1280-1 und 1280-2	92 Std.	Die 06.02.29 00:00	Fre 09.02.29 20:00	20
22	Wiederherstellung Oberbau und LST, nur Gleis 1280-1	24 Std.	Fre 09.02.29 20:00	Sam 10.02.29 20:00	21
23	Wiederherstellen OLA 1280-1, Abbau OLA 1291	17 Std.	Sam 10.02.29 16:00	Son 11.02.29 09:00	22EA-4 Std.
24	Puffer für Sperrung 1280	48 Std.	Son 11.02.29 09:00	Die 13.02.29 09:00	23
25	LST und Oberbau ausbauen für Verbau, 1291	7 Std.	Die 13.02.29 09:00	Die 13.02.29 16:00	24
26	Kampfmittelsondierung im Bereich der Anker	16 Std.	Die 13.02.29 16:00	Mit 14.02.29 08:00	25
27	Verbauarbeiten und Hilfsbrückeneinbau (Sonderhilfsbrücke), 1280-2 und 1291	93 Std.	Mit 14.02.29 08:00	Son 18.02.29 05:00	26
28	Wiederherstellung Oberbau und LST, 1280-2 und 1291	30 Std.	Son 18.02.29 01:00	Mon 19.02.29 07:00	27EA-4 Std.
29	Puffer für Sperrung 1280-2 und 1291	48 Std.	Mon 19.02.29 07:00	Mit 21.02.29 16:00	28
30	Bauphasen 5 + 6 + 7 - Arbeiten unter rollendem Rad	297,25 Tage	Don 22.02.29 14:00	Son 17.03.30 15:00	
31	Bauphase 5	69 Tage	Don 22.02.29 14:00	Mit 30.05.29 14:00	
32	Herstellung Verbau inkl. Gurtung und Rückverankerung außerhalb Bahnbereich	13 Tage	Don 22.02.29 14:00	Die 13.03.29 14:00	29EA+6 Std.
33	Anker verspannen	3 Tage	Die 13.03.29 14:00	Fre 16.03.29 14:00	32
34	Baugrubenaushub (ca. 1500 m3)	7 Tage	Fre 13.04.29 14:00	Die 24.04.29 14:00	33EA+20 Tage
35	ggf. Grundwasserbehandlungsanlage installieren	3 Tage	Mon 16.04.29 16:00	Don 19.04.29 16:00	34AA+10 Std.
36	Herstellung Mikropfähle	24 Tage	Die 24.04.29 14:00	Mon 28.05.29 14:00	34
37	Einbau der Sauberkeitsschicht	2 Tage	Mon 28.05.29 14:00	Mit 30.05.29 14:00	36
38	Grundwasserbehandlungsanlage innerhalb der geschlossenen Baugrube betreiben	260 Tage	Mon 16.04.29 16:00	Son 17.03.30 15:00	35AA
39	Bauphase 6	187 Tage	Mit 30.05.29 14:00	Fre 15.02.30 14:00	
40	Schalen und Bewehren Bodenplatte	10 Tage	Mit 30.05.29 14:00	Mit 13.06.29 14:00	37
41	Betonage Bodenplatte	1 Tag	Mit 13.06.29 14:00	Don 14.06.29 14:00	40
42	Schalen und Bewehren Tunneldecke in abgesenkter Lage	16 Tage	Don 12.07.29 14:00	Fre 03.08.29 14:00	41EA+20 Tage
43	Betonage Tunneldecke	1 Tag	Fre 03.08.29 14:00	Mon 06.08.29 14:00	42
44	Abdichtung Tunneldecke	10 Tage	Mon 03.09.29 14:00	Mon 17.09.29 14:00	43EA+20 Tage
45	Aufbeton	5 Tage	Mon 17.09.29 14:00	Mon 24.09.29 14:00	44
46	Anheben der Decke, Aufbocken auf Traggerüst	5 Tage	Mon 24.09.29 14:00	Mon 01.10.29 14:00	45
47	Schalen und Bewehren der Tunnelwände	23 Tage	Mon 01.10.29 14:00	Don 01.11.29 14:00	46
48	Betonage der Tunnelwände	2 Tage	Don 01.11.29 14:00	Mon 05.11.29 14:00	47
49	Ausbau des Deckentraggerüstes	5 Tage	Mon 03.12.29 14:00	Mon 10.12.29 14:00	48EA+20 Tage
50	Vorbereitung + Puffer	20 Tage	Mon 10.12.29 14:00	Mon 07.01.30 14:00	49
51	Innenausbau (Bodenbelag, Wandleuchten, Entwässerungsrinnen inkl. Anschlüssen an Vorflut)	29 Tage	Mon 07.01.30 14:00	Fre 15.02.30 14:00	50
52	Bauphase 7	15,38 Tage	Fre 15.02.30 14:00	Fre 08.03.30 17:00	
53	Herstellung Abdichtung	8 Tage	Fre 15.02.30 14:00	Mit 27.02.30 14:00	51
54	Herstellung Sickerwand sowie Betonsockel mit teilporösem Grundrohr an den Außenwänden	5 Tage	Mit 27.02.30 14:00	Mit 06.03.30 14:00	53
55	Teilverfüllung und Vedichten des Hinterfüllmaterials zwischen Verbauwänden und Außenwänden	2,38 Tage	Mit 06.03.30 14:00	Fre 08.03.30 17:00	54
56	Bauphase 8 - Rückbau Zwillingsträgerhilfsbrücke	12 Tage	Sam 09.03.30 02:00	Mit 13.03.30 02:00	
57	*Bauphase 8 wird in 24 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche ausgeführt*	0 Tage	Sam 09.03.30 02:00	Sam 09.03.30 02:00	55EA+2 Std.
58	TSP Str 1280 (Sperrung 1280-1 und 1280-2, 1291 offen)	96 Std.	Sam 09.03.30 02:00	Mit 13.03.30 02:00	55EA+2 Std.
59	Gleisarbeiten, Trennschnitte, Ausbau der Zwillingsträgerhilfsbrücke	38 Std.	Sam 09.03.30 02:00	Son 10.03.30 16:00	55EA+2 Std.
60	Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem Abbrennen der Spundwände bis 1,70 m unter SOK	12 Std.	Son 10.03.30 16:00	Mon 11.03.30 04:00	59
61	Teilverfüllung und Verdichten des Hinterfüllmaterials, Herstellen Fahrbahnübergang von Dammbauwerk auf Kunstbauwerk	23 Std.	Mon 11.03.30 04:00	Die 12.03.30 03:00	60
62	Wiederherstellung Oberbau (Schotter, Schwellen, Schienen	23 Std.	Die 12.03.30 03:00	Mit 13.03.30 02:00	61
63	Bauphase 9 - Rückbau Sonderhilfsbrücke	24 Tage	Mit 13.03.30 02:00	Don 21.03.30 10:00	
64	*Bauphase 9 wird in 24 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche ausgeführt*	0 Tage	Mit 13.03.30 02:00	Mit 13.03.30 02:00	62
65	du. Glsp 1280-2 und Strsp 1291 (1280-1 offen)	192 Std.	Mit 13.03.30 02:00	Don 21.03.30 10:00	62
66	Gleisarbeiten, Trennschnitte, Ausbau der Sonderhilfsbrücke	84 Std.	Mit 13.03.30 02:00	Sam 16.03.30 14:00	62
67	Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem Abbrennen der Spundwände bis 1,70 m unter SOK	32 Std.	Sam 16.03.30 14:00	Son 17.03.30 22:00	66
68	Teilverfüllung und Verdichten des Hinterfüllmaterials, Herstellen Fahrbahnübergang von Dammbauwerk auf Kunstbauwerk	38 Std.	Son 17.03.30 22:00	Die 19.03.30 12:00	67
69	Wiederherstellung Oberbau (Schotter, Schwellen, Schienen	38 Std.	Die 19.03.30 12:00	Don 21.03.30 10:00	68
70	Bauphase 10 - nachlaufende Maßnahmen	43,75 Tage	Don 21.03.30 13:00	Die 30.04.30 10:00	
71	*bahnbetriebliche Nachleistungen werden in 24 Stunden Schichten, 7 Tage die Woche ausgeführt*	0 Tage	Fre 19.04.30 02:00	Fre 19.04.30 02:00	77AA
72	TSP Str 1280 (Sperrung 1280-1 und 1280-2, 1291 offen)	72 Std.	Fre 19.04.30 02:00	Mon 22.04.30 02:00	77AA
73	du. Glsp 1280-2 und Strsp 1291 (1280-1 offen)	72 Std.	Mon 22.04.30 02:00	Don 25.04.30 02:00	72
74	Wiederherstellung Lärmschutzwand	4 Tage	Don 21.03.30 13:00	Mit 27.03.30 12:00	69EA+2 Std.
75	Rückbau der bauzeitlichen Rampen	6 Tage	Mit 27.03.30 13:00	Don 04.04.30 12:00	74
76	Herstellung der Anschlussbereiche Nord und Süd (Straßenbau, Wegebau)	10 Tage	Don 04.04.30 13:00	Don 18.04.30 12:00	75
77	Rückbau der bauzeitlichen Kabelhilfsbrücken, Wiederherstellung der Lage der Speiseleitungen und Speisekabel	144 Std.	Fre 19.04.30 02:00	Don 25.04.30 02:00	76EA+6 Std.
78	Rückbau Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 25.04.30 02:00	Die 30.04.30 10:00	77
79	Abnahme und Verkehrsfreigabe	0 Tage	Die 30.04.30 10:00	Die 30.04.30 10:00	78

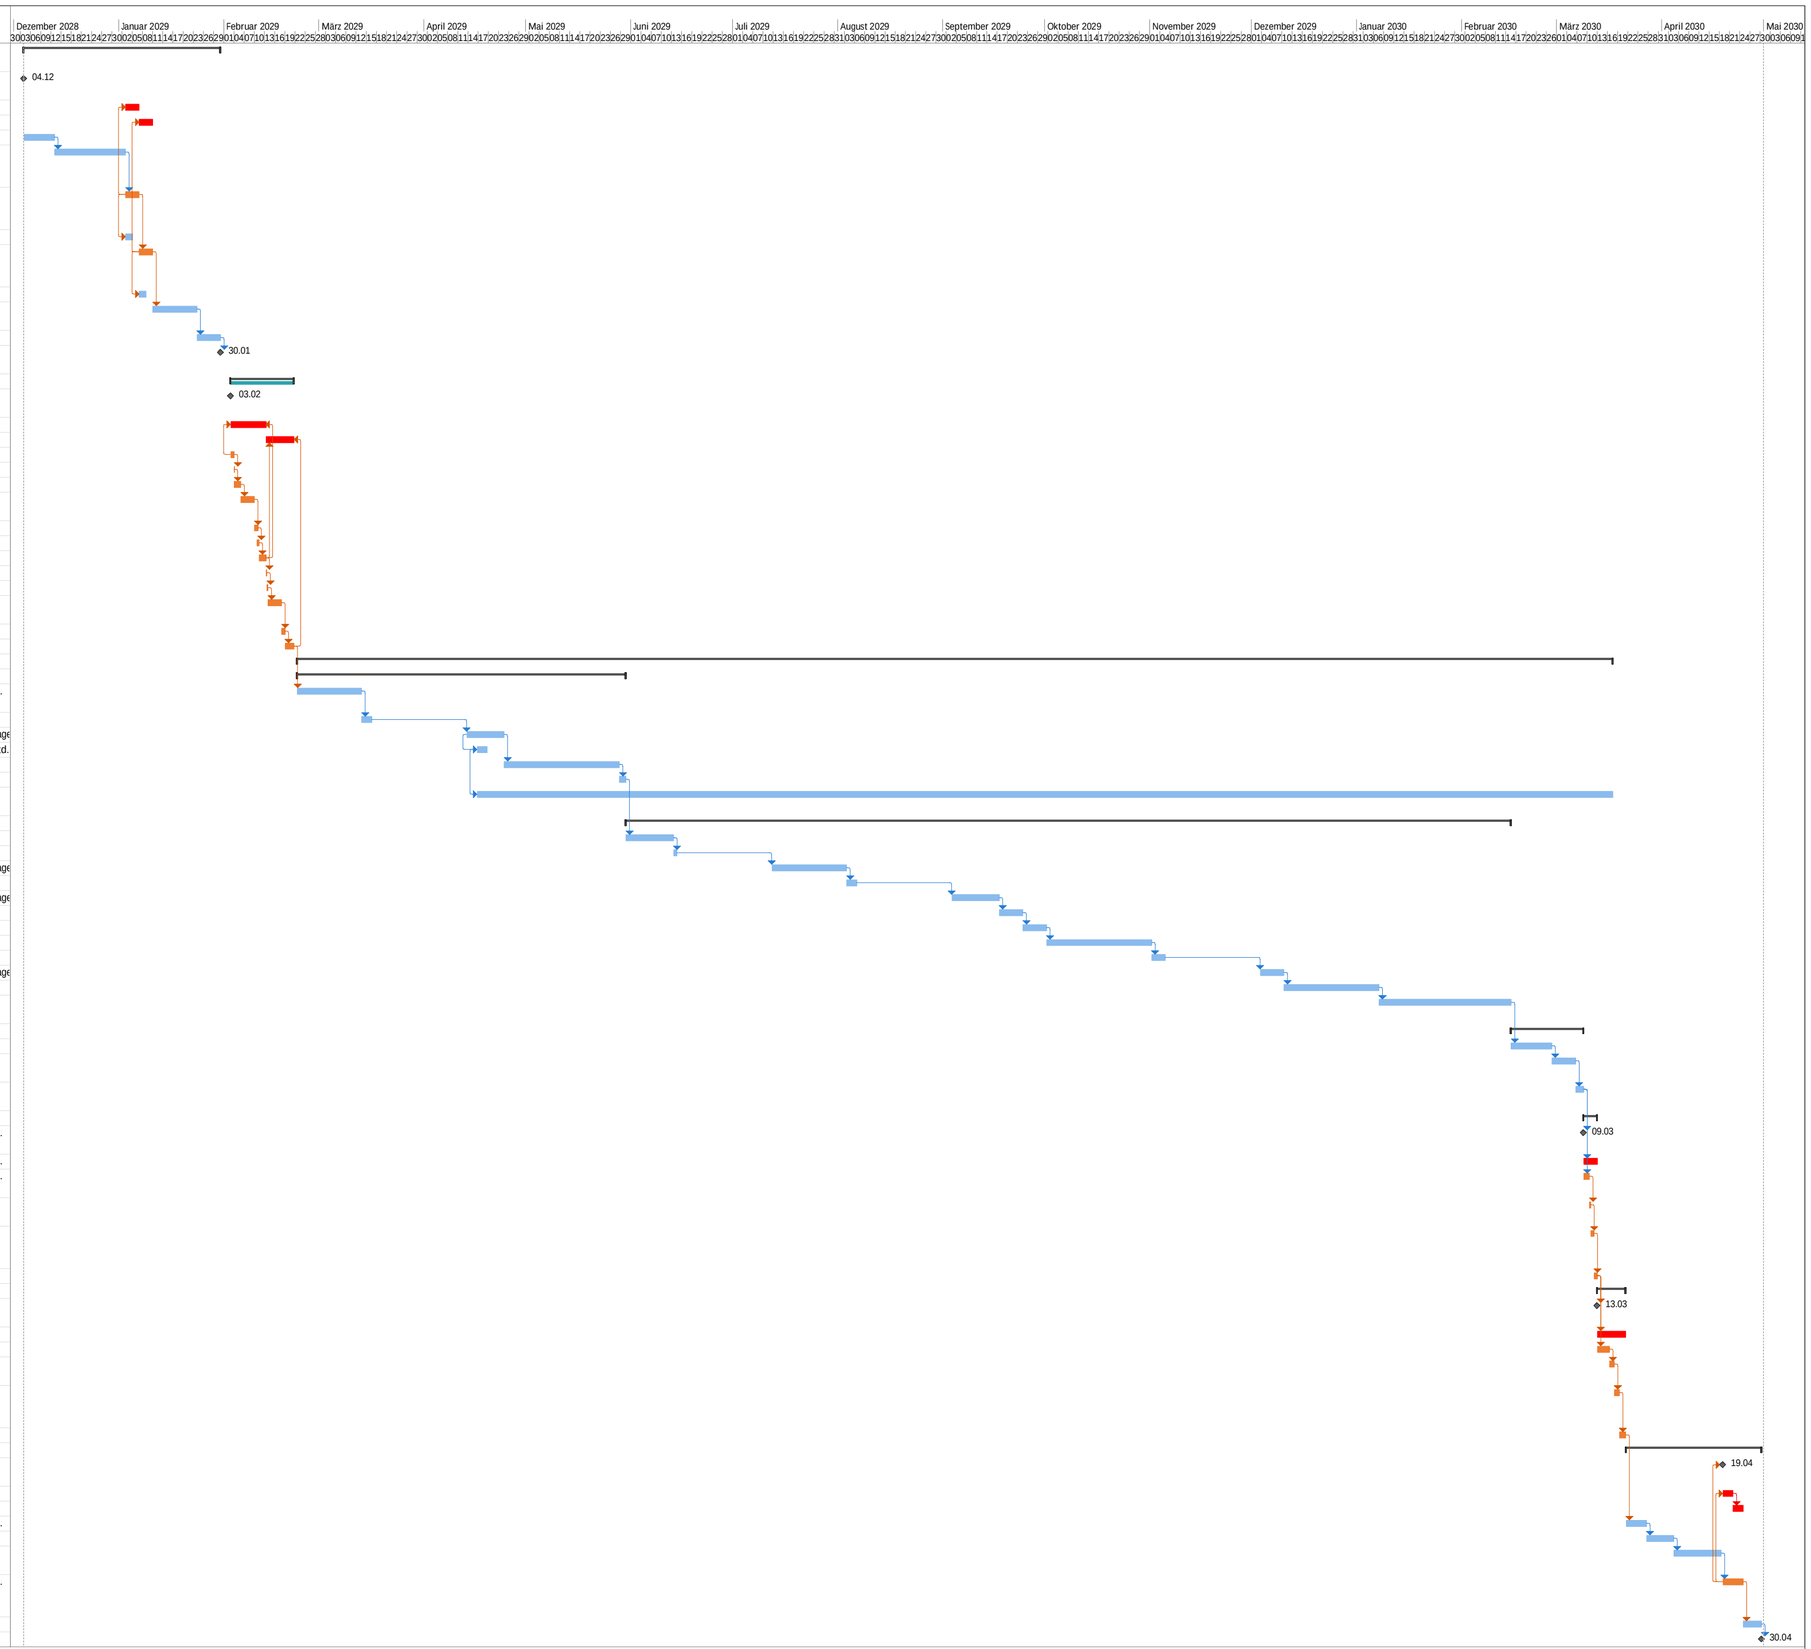

DRO-Gesamtbauablaufplan_kurz.mpp
Datum: Mit 11.02.26 12:35

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Externer Meilenstein · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Stichtag · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Externe Vorgänge · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · In Arbeit
