**41423 GS Arnum**

Auftraggeber: Stadt Hemmingen

Datum: 14.04.2023
Geändert: 18.08.2026

Unterschrift: TG

| Nr. | Bezeichnung | Start | Dauer | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzbau Neubau Baustelleneinrichtung | 19.10.2026 | 1w | 23.10.2026 |
| 2 | Holzbau Neubau Wände EG | 26.10.2026 | 2w | 06.11.2026 |
| 3 | Holzbau Neubau Decke + Dach Mensa | 09.11.2026 | 2w | 20.11.2026 |
| 4 | Holzbau Neubau Wände OG | 23.11.2026 | 2w | 04.12.2026 |
| 5 | Holzbau Neubau Dach | 07.12.2026 | 2w | 18.12.2026 |
| 6 | Holzbau Neubau Wetterdicht - Start Ausbau | 21.12.2026 | | 21.12.2026 |
| 7 | Holzbau Neubau Fassade | 15.02.2027 | 4w | 12.03.2027 |
| 8 | Holzbau Neubau Rückbau Baustelleneinrichtung | 15.03.2027 | 1w | 19.03.2027 |
| 9 | Puffer Schlechtwetter | 21.12.2026 | 8w | 12.02.2027 |
| 10 | Dachabdichtungsarbeiten Neubau Mensa | 30.11.2026 | 3w | 18.12.2026 |
| 11 | Dachabdichtungsarbeiten Neubau Ganztag | 15.02.2027 | 3w | 05.03.2027 |
| 12 | Dachabdichtungsarbeiten Neubau Einsaat | 08.03.2027 | 1w | 12.03.2027 |
| 13 | Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren Neubau EG | 30.11.2026 | 3w | 18.12.2026 |
| 14 | Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren Neubau OG | 15.02.2027 | 3w | 05.03.2027 |
| 15 | Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren Neubau Rückbau Baustellentüren | 28.06.2027 | 1w | 02.07.2027 |
| 16 | Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wände einseitig Neubau | 04.01.2027 | 2w | 15.01.2027 |
| 17 | ELT Grobinstallation Neubau Vor Estrich | 04.01.2027 | 8w | 26.02.2027 |
| 18 | HLS Grobinstallation Neubau Vor Estrich | 04.01.2027 | 8w | 26.02.2027 |
| 19 | Ableitungen Neubau | 15.02.2027 | 2w | 26.02.2027 |

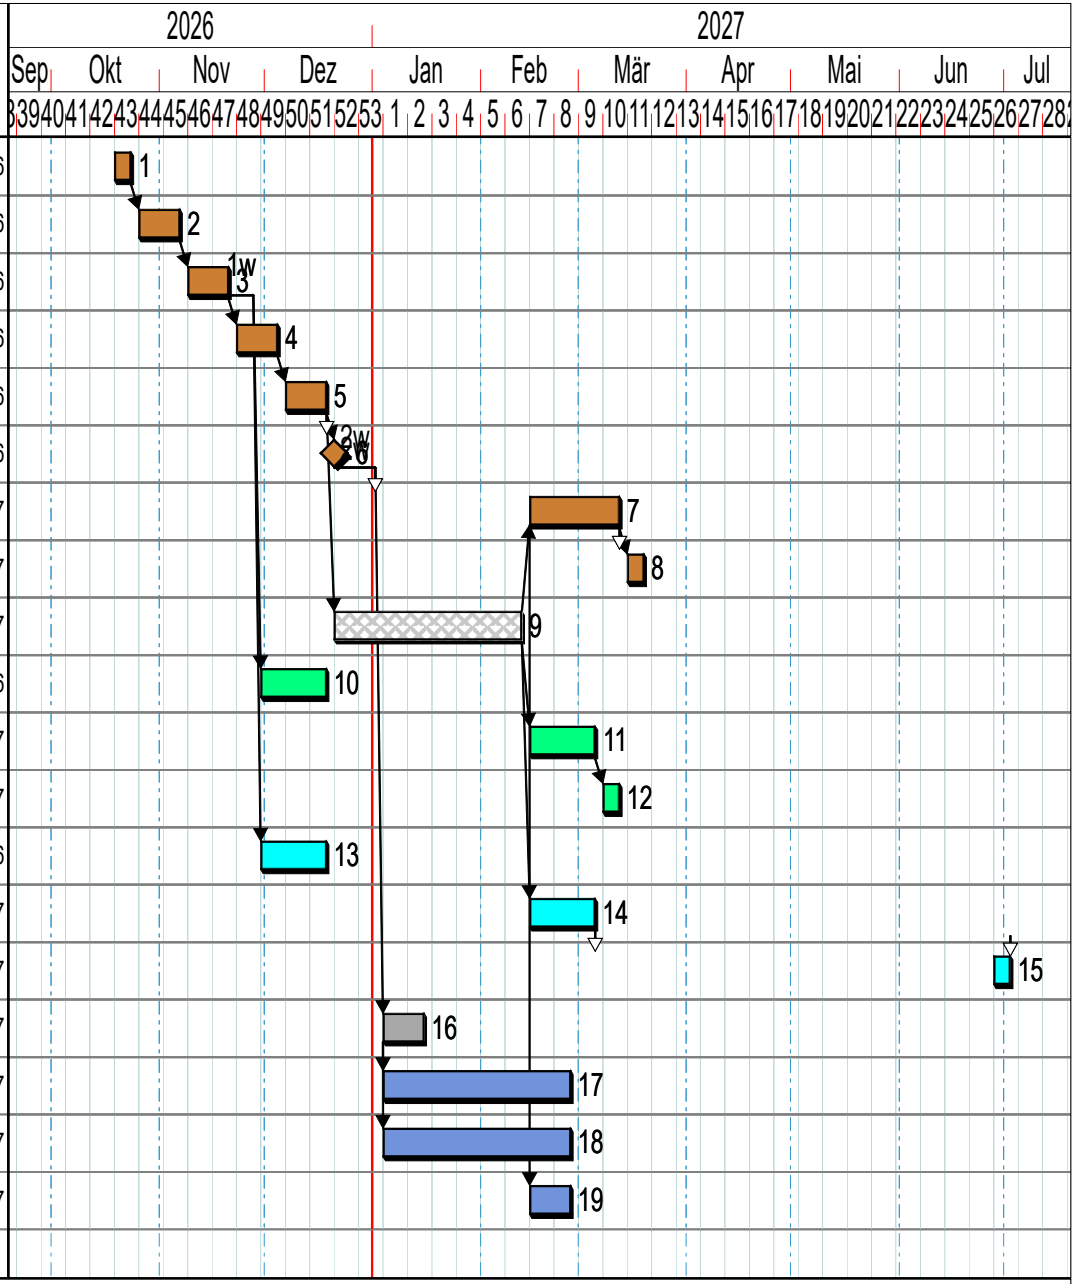


Projektphasen

03.1 - Holzbau Neubau | Fremdphasen | 04.1 - Dach Neubau | 05.1 - Fenster Neubau | 07.1 - Trockenbau Neubau | Techn. Anlagen Neubau
