Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig
1	**Beauftragung Vergabepaket -I- Bauhauptgewerke**	23 Tage	Mit 13.05.26	Fre 12.06.26	AG
2	**GESAMTBAUZEIT**	**525 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 14.07.28**	
3	**Arbeitsvorbereitung Bauhauptgewerke**	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26	AN
4	**Baubeginn**	0 Std.	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26	
5	**Freischaltung Medien (Wasser-Strom etc.)**	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	AN TGA
6	**Baustelleneinrichtung Medien**	**450 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Fre 28.04.28**	AN TGA
7	Baustrom / Bauwasser/ Baubeleuchtung	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	
8	Baubeheizung	195 Tage	Mon 19.07.27	Fre 28.04.28	
9	**Baustellensicherung / Überwachung**	**490 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 14.07.28**	AN
10	Baustellensich./Verschlusskontr./Videoüberw.	490 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.07.28	
11	**Rückbau- und Abbruch HLSE**	**30 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 11.09.26**	AN TGA
12	TGA Gefahrstoffsanierung	25 Tage	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26	
13	TGA Rückbau- und Abbruch HLSE	30 Tage	Mon 03.08.26	Fre 11.09.26	
14	**Erweiterter Rohbau**	**450 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Fre 28.04.28**	AN
15	BE (Bauzaun-Container-Bau-WC)	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	
16	Rückbau- und Abbrucharbeiten	60 Tage	Mon 03.08.26	Fre 23.10.26	
17	Schutz- und stat. Sicherungsmaßnahmen	60 Tage	Mon 03.08.26	Fre 23.10.26	
18	Mauer-/ Beton- und Stahlbetonarbeiten	90 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.02.27	
19	Erdarbeiten-Verbau-Grundleitungen-Abdichtung etc.	90 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.02.27	
20	Beton-/ und Fassadensanierung	40 Tage	Mon 08.02.27	Fre 02.04.27	
21	Putzarbeiten	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27	
22	Wand- und Deckendurchbrüche ohne Brandschutz schließen	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	
23	Estricharbeiten	25 Tage	Mon 04.10.27	Fre 05.11.27	
24	BE Rückbau sukzessiv	10 Tage	Mon 17.04.28	Fre 28.04.28	
25	**Trockenestrich**	**25 Tage**	**Mon 04.10.27**	**Fre 05.11.27**	**AN**
26	**Gerüstarbeiten**	**360 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 14.01.28**	AN
27	Fassadengerüste Aufbau	60 Tage	Mon 03.08.26	Fre 19.02.27	
28	Fassadengerüste Rückbau	15 Tage	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	
29	Raumgerüste Aufbau	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	
30	Raumgerüste Rückbau	10 Tage	Mon 03.01.28	Fre 14.01.28	
31	**Dachdeckung- und Klempner**	**75 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 02.07.27**	AN
32	Stahlbauarbeiten	20 Tage	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27	
33	Zimmer- und Holzbauarbeiten	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	
34	Dachdeckung und Dachabdichtung	35 Tage	Mon 17.05.27	Fre 02.07.27	
35	**PV Anlagen**	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	**AN TGA**
36	**Trockenbauarbeiten**	**110 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Fre 17.12.27**	AN
37	**Wände**	**55 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Fre 01.10.27**	
38	Beplankung 1. Seite	30 Tage	Mon 19.07.27	Fre 27.08.27	
39	Beplankung 2. Seite	25 Tage	Mon 30.08.27	Fre 01.10.27	
40	Vorsatzschalen/ Schächte	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	
41	Abgehängte Decken	30 Tage	Mon 08.11.27	Fre 17.12.27	
42	**Fliesen- und Platten**	**35 Tage**	**Mon 29.11.27**	**Fre 28.01.28**	AN
43	Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume	35 Tage	Mon 29.11.27	Fre 28.01.28	
44	Fliesen- und Plattenarbeiten Flure + TRH	35 Tage	Mon 29.11.27	Fre 28.01.28	
45	**WDVS / Klinkerriemchen**	**35 Tage**	**Mon 19.07.27**	**Fre 03.09.27**	AN
46	Wärmedämmverbundsystem	35 Tage	Mon 19.07.27	Fre 03.09.27	
47	**Metallbau-u. Verglasungsarbeiten**	**215 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 21.04.28**	AN
48	Aussen-Fenster, Türen UG+DG	25 Tage	Mon 14.06.27	Fre 16.07.27	
49	Rohrrahmen / Metallglastüren	15 Tage	Mon 03.04.28	Fre 21.04.28	
50	**Malerarbeiten**	**75 Tage**	**Mon 29.11.27**	**Fre 24.03.28**	AN
51	Tapezier- und Anstricharbeiten	60 Tage	Mon 03.01.28	Fre 24.03.28	
52	Bodenbeschichtungen	10 Tage	Mon 28.02.28	Fre 10.03.28	
53	Bodenbeschichtung in TGA Zentralen	15 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.12.27	
54	**Bodenbelagsarbeiten**	**45 Tage**	**Mon 31.01.28**	**Fre 31.03.28**	AN
55	Bodenbeläge	45 Tage	Mon 31.01.28	Fre 31.03.28	
56	**Parkettarbeiten**	**45 Tage**	**Mon 31.01.28**	**Fre 31.03.28**	AN
57	Parkettarbeiten	45 Tage	Mon 31.01.28	Fre 31.03.28	
58	**Tischler Innentüren**	**80 Tage**	**Mon 03.01.28**	**Fre 21.04.28**	AN
59	Zargen	15 Tage	Mon 03.01.28	Fre 21.01.28	
60	Türblätter	15 Tage	Mon 03.04.28	Fre 21.04.28	
61	**Schlosserarbeiten**	**35 Tage**	**Mon 08.11.27**	**Fre 07.01.28**	AN
62	Stahltüren	15 Tage	Mon 06.12.27	Fre 07.01.28	
63	Geländer/Roste/Kantenschutzwinkel etc.	20 Tage	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27	
64	**Technische Gebäudeausrüstung**	**390 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 28.04.28**	TGA
65	**Arbeiten in Zentralen TGA**	200 Tage	Mon 14.06.27	Fre 21.04.28	AN
66	**Heizung / Sanitär**	**220 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 28.04.28**	AN
67	Rohinstallation	50 Tage	Mon 14.06.27	Fre 20.08.27	
68	Feininstallation	45 Tage	Mon 28.02.28	Fre 28.04.28	
69	**Lüftungstechnik**	**220 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 28.04.28**	AN
70	Rohinstallation	50 Tage	Mon 14.06.27	Fre 20.08.27	
71	Feininstallation	45 Tage	Mon 28.02.28	Fre 28.04.28	
72	**Starkstrom / Fernmeldetechnik**	**220 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 28.04.28**	AN
73	Rohinstallation	50 Tage	Mon 14.06.27	Fre 20.08.27	
74	Feininstallation	45 Tage	Mon 28.02.28	Fre 28.04.28	
75	**Blitzschutz**	230 Tage	Mon 05.10.26	Fre 03.09.27	AN
76	**Förderanlagen**	**115 Tage**	**Mon 08.11.27**	**Fre 28.04.28**	AN
77	Rohmontage	20 Tage	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27	
78	Endmontage	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	
79	**Ausstattung Einbaumöbel**	**20 Tage**	**Mon 03.04.28**	**Fre 28.04.28**	AN
80	Einbaumöbel	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	
81	**Ausstattung loses Mobiliar**	**9 Tage**	**Mon 03.07.28**	**Don 13.07.28**	AN
82	Loses Mobiliar	9 Tage	Mon 03.07.28	Don 13.07.28	
83	**Feuerlöscher**	5 Tage	Mon 01.05.28	Fre 05.05.28	AN
84	**Schließanlage**	5 Tage	Mon 01.05.28	Fre 05.05.28	AN
85	**Beschilderung / Wegeleitsystem**	5 Tage	Mon 01.05.28	Fre 05.05.28	AN
86	**Freianlagen**	**50 Tage**	**Mon 01.05.28**	**Fre 07.07.28**	AN
87	Wiederherrichten Gelände/ Gala-Bau	50 Tage	Mon 01.05.28	Fre 07.07.28	
88	**Baureinigung**	**45 Tage**	**Mon 01.05.28**	**Fre 30.06.28**	
89	Endreinigung grob	10 Tage	Mon 01.05.28	Fre 12.05.28	AN
90	Endreinigung fein	20 Tage	Mon 05.06.28	Fre 30.06.28	AN
91	**VOB Abnahmen / Mangelbeseitigung**	**15 Tage**	**Mon 15.05.28**	**Fre 02.06.28**	
92	Abnahmen Sachverständige	5 Tage	Mon 15.05.28	Fre 19.05.28	AN
93	Abnahmen VOB / SV	5 Tage	Mon 22.05.28	Fre 26.05.28	Alle
94	Mängelbeseitigung	5 Tage	Mon 29.05.28	Fre 02.06.28	AN
95	**Bauliche Fertigstellung**	0 Std.	Fre 02.06.28	Fre 02.06.28	Alle
96	**Techn. Inbetr.-Einweis.-Probebetrieb**	29 Tage	Mon 05.06.28	Don 13.07.28	Alle
97	**Übergabe**	0 Std.	Fre 14.07.28	Fre 14.07.28	
98					

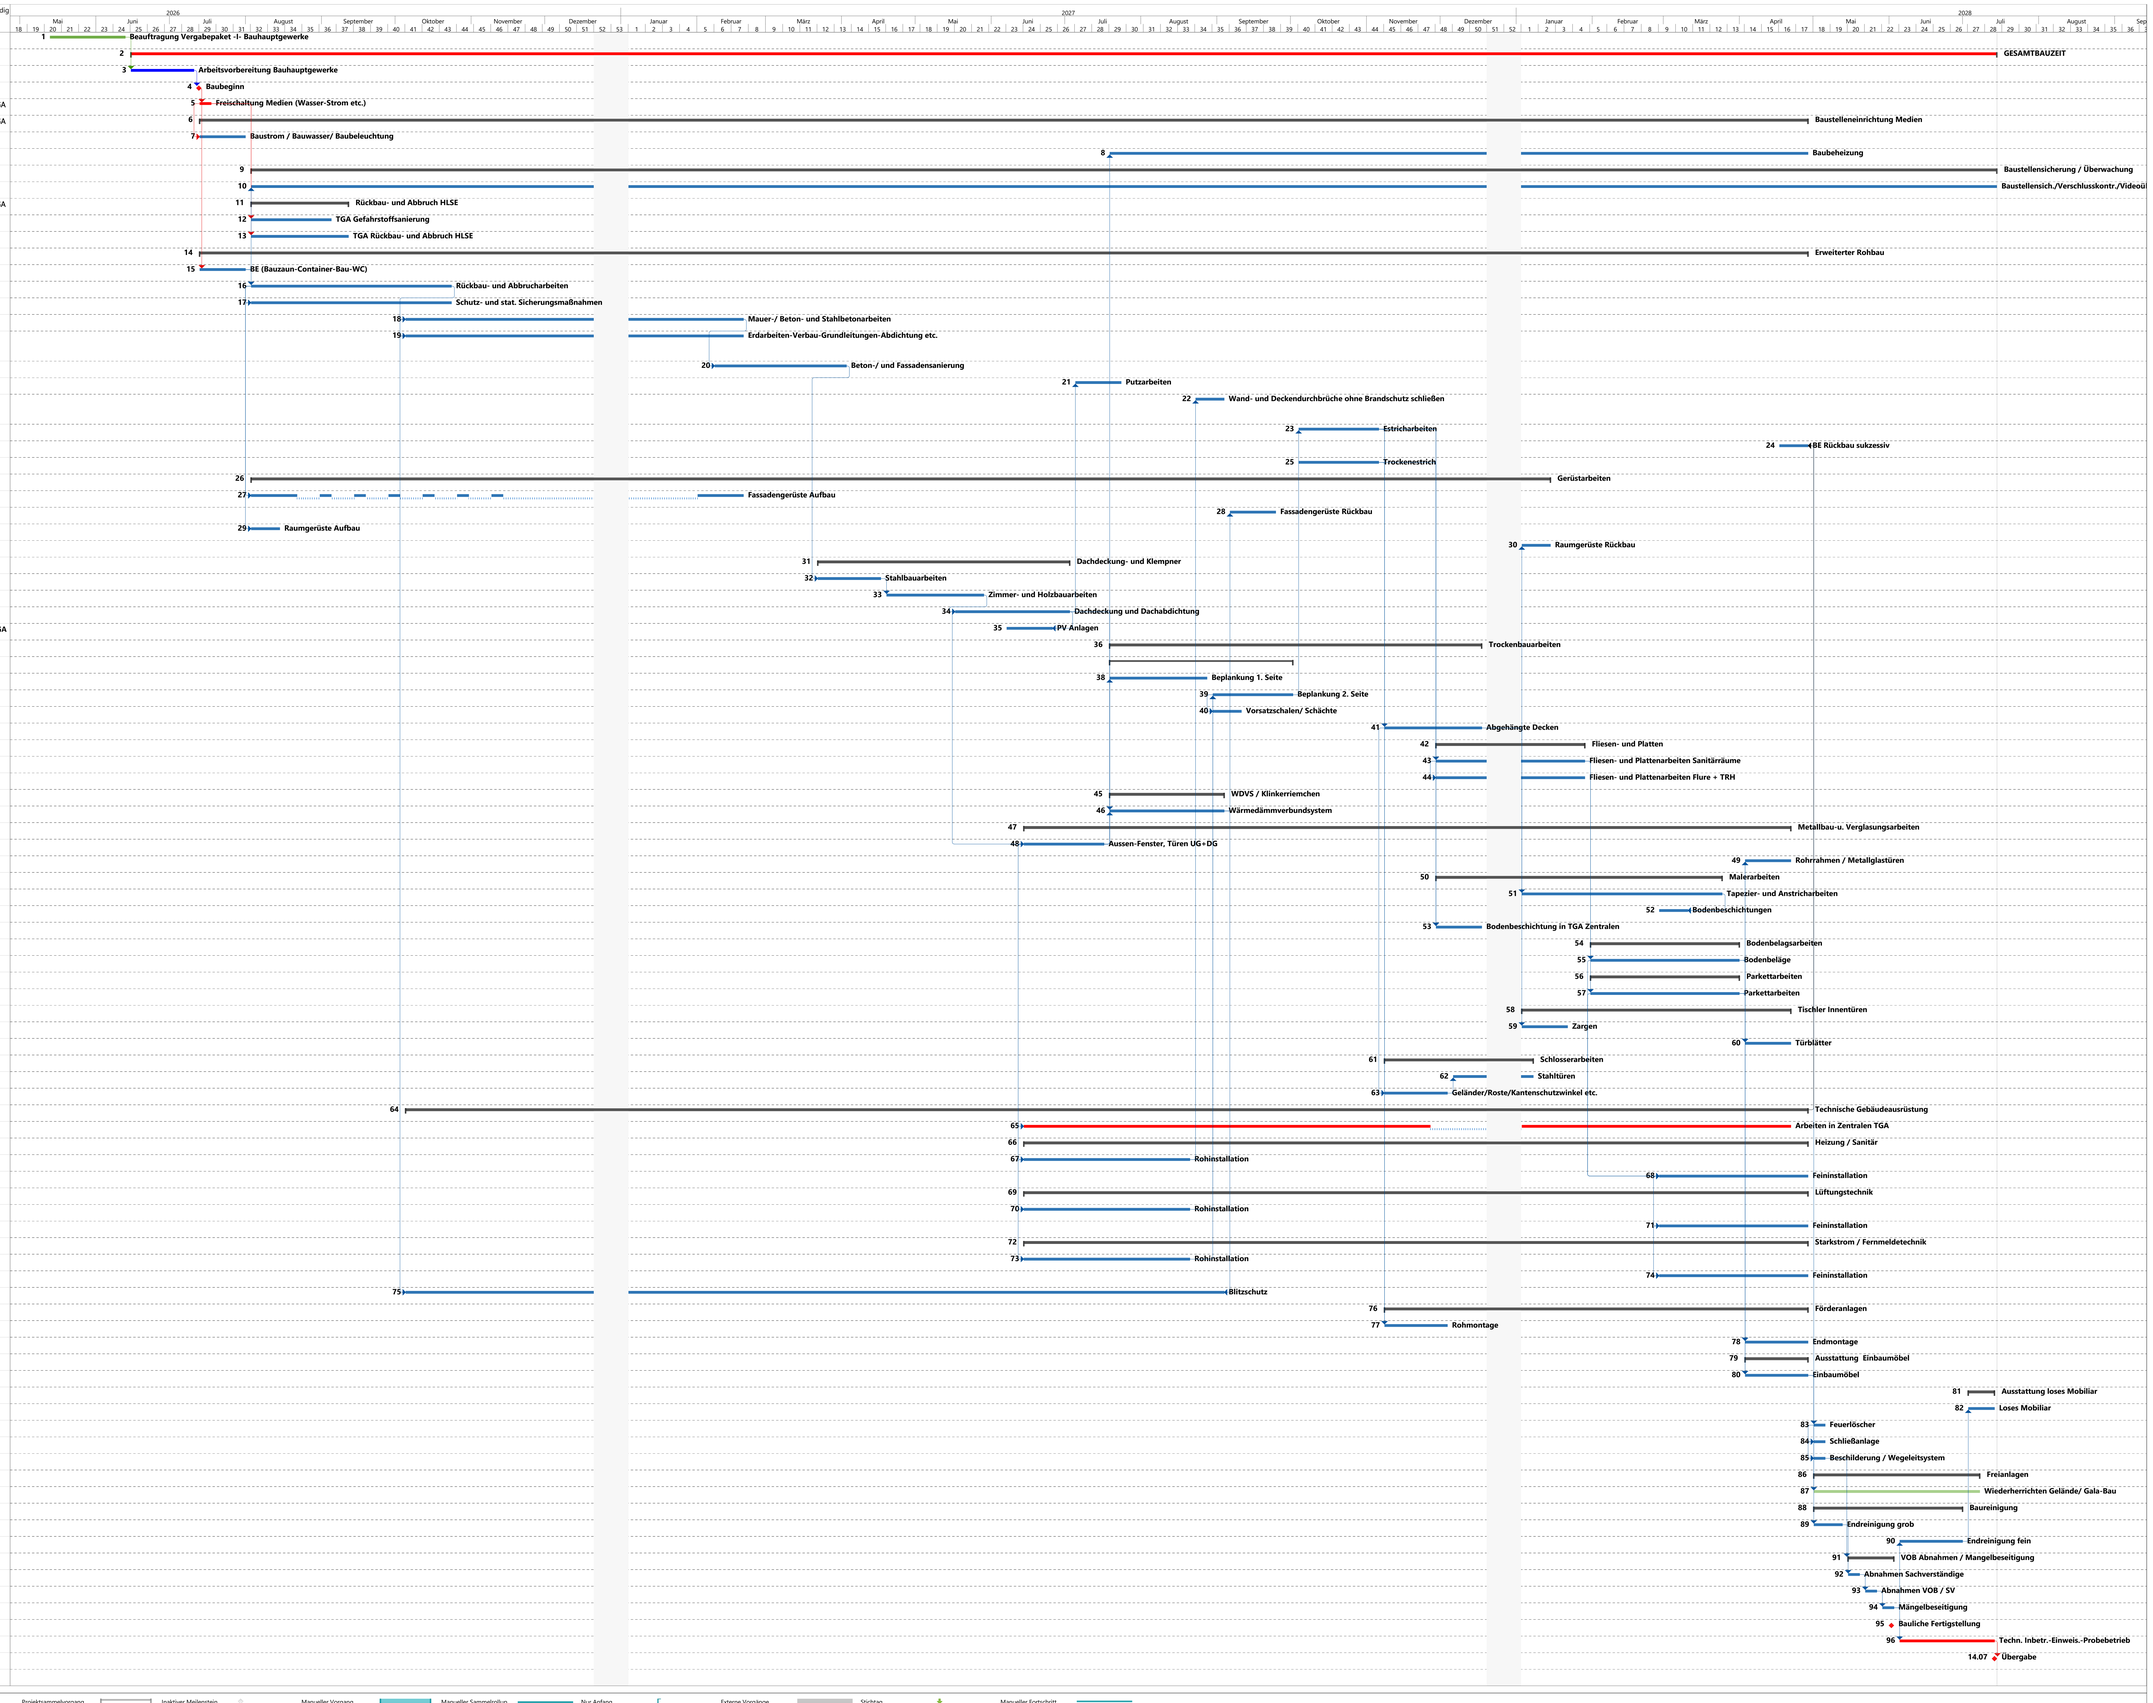

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt
