RAHMENTERMINPLAN

BV: 2020-489 GuKE BA2 - Grundschule und Kindertagesstätte Estenfeld

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**PROJEKTZEITRAUM**	**795 Tage?**	**Mon 24.03.25**	**Fre 07.04.28**
2	**UMZUG**	**144 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Don 09.10.25**
7	**BAUPHASE**	**670 Tage?**	**Mon 15.09.25**	**Fre 07.04.28**
8	Abbrucharbeiten Bestand	30 Wochen	Mon 15.09.25	Fre 10.04.26
9	Rohbauarbeiten	8 Monate	Mon 27.04.26	Fre 04.12.26
10	Aufbau Gerüst	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
11	Standzeit Gerüst	39 Wochen	Mon 30.11.26	Fre 27.08.27
12	Abbau Gerüst	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
13	Dachabdichtungsarbeiten	4,75 Monate	Mon 30.11.26	Fre 09.04.27
14	Fassadenarbeiten - Vorlauf	3,3 Monate	Mon 31.08.26	Mon 30.11.26
15	Fassadenarbeiten - Montage	5,75 Monate	Mon 30.11.26	Fre 07.05.27
16	Stahlbauarbeiten - Vorlauf	3,3 Monate	Mon 31.08.26	Mon 30.11.26
17	Stahlbauarbeiten - Montage	3,75 Monate	Mon 30.11.26	Fre 12.03.27
18	Innenputzarbeiten	2,5 Monate	Mon 10.05.27	Fre 16.07.27
19	Malerarbeiten	50 Tage	Mon 19.07.27	Fre 24.09.27
20	Trockenbauarbeiten - UK Decken/Wände	2,5 Monate	Mon 10.05.27	Mon 19.07.27
21	Rohmontage Elektro	12 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 30.07.27
22	Fertigmontage Elektro	60 Tage	Mon 27.09.27	Fre 17.12.27
23	Rohmontage HLS	12 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 30.07.27
24	Einbau Fußbodenheizung	3 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
25	Fertigmontage HLS	60 Tage	Mon 27.09.27	Fre 17.12.27
26	Inbetriebnahme HLS	4 Wochen	Mon 06.12.27	Fre 31.12.27
27	Trockenbauarbeiten - Bekleidung Decken	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27
28	Mobile Trennwände - Vorlauf	4 Monate	Mon 29.03.27	Mon 19.07.27
29	Mobile Trennwände - Deckenschiene	0,75 Monate	Mon 19.07.27	Fre 06.08.27
30	Mobile Trennwände - Einhang	1 Monat	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27
31	Estricharbeiten - Einbau	1 Monat	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27
32	Estricharbeiten - Trocknung	1 Monat	Mon 16.08.27	Fre 10.09.27
33	Schreiner Innentüren - Vorlauf	5 Monate	Mon 28.06.27	Mon 15.11.27
34	Schreiner Innentüren - Schwellen	0,5 Monate	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27
35	Schreiner Innentüren - Montage	1 Monat	Mon 15.11.27	Fre 10.12.27
36	Fliesen Küchenwände	20 Tage?	Mon 16.08.27	Fre 10.09.27
37	Bodenbelagsarbeiten	2 Monate	Mon 13.09.27	Fre 05.11.27
38	Natursteinarbeiten	2 Monate	Mon 13.09.27	Fre 05.11.27
39	Fliesenarbeiten	2 Monate	Mon 13.09.27	Fre 05.11.27
40	Schreiner Festeinbauten - Vorlauf	4 Monate	Mon 28.06.27	Mon 18.10.27
41	Schreiner Festeinbauten - Montage	1,75 Monate	Mon 18.10.27	Fre 03.12.27
42	Aufmass Küche	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
43	Materialbestellung, Produktion Küche	8 Wochen	Mon 20.09.27	Fre 12.11.27
44	Fertigmontage Küche	14 Tage	Mon 15.11.27	Don 02.12.27
45	Schließanlage - Vorlauf	3 Monate	Mon 16.08.27	Mon 08.11.27
46	Schließanlage - Montage	1 Monat	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27
47	Beschilderung	1 Monat	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27
48	Feuerlöscher	1 Monat	Mon 08.11.27	Fre 03.12.27
49	Gebäudereinigung	1 Monat	Mon 06.12.27	Fre 31.12.27
50	Lose Möblierung - Vorlauf	3 Monate	Mon 13.09.27	Mon 06.12.27
51	Lose Möblierung - Montage	1 Monat	Mon 06.12.27	Fre 31.12.27
52	Außenanlagen	12 Monate	Mon 10.05.27	Fre 07.04.28
53	Remise	3 Monate	Mon 10.05.27	Fre 30.07.27

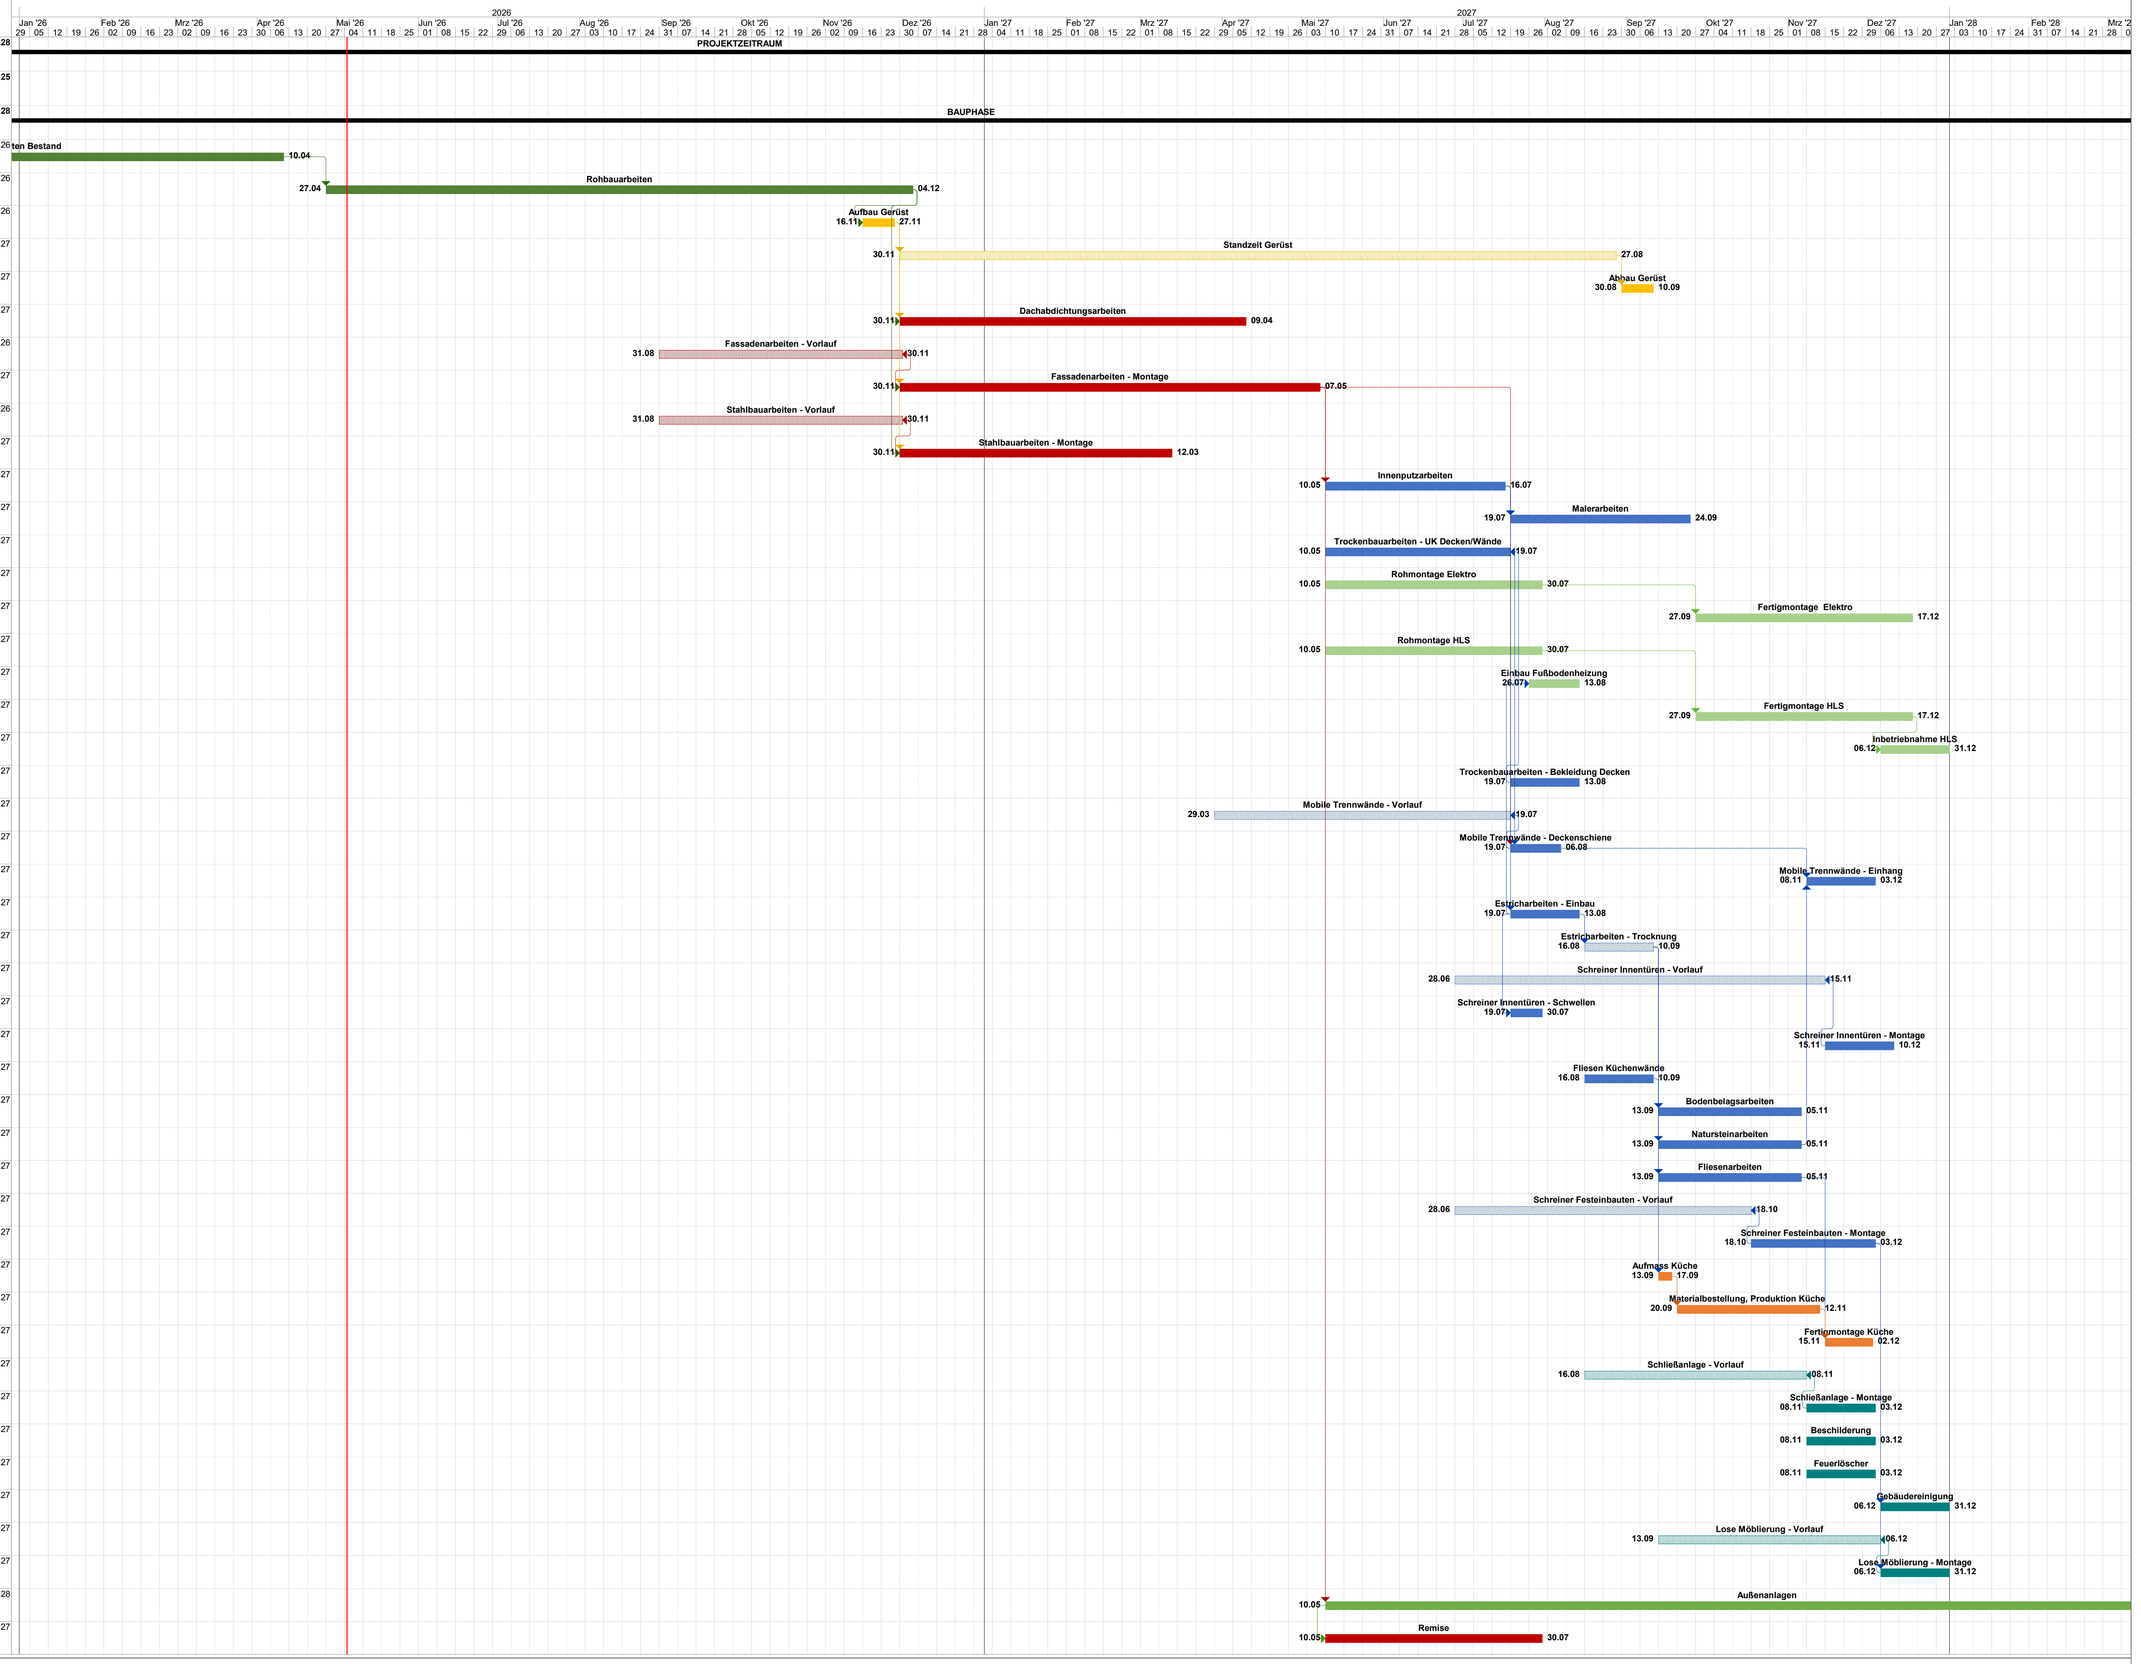

Datum: Die 05.05.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Unterbrechung | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

Unterbrechung | Sammelvorgang | ExVorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | In Arbeit
