Rahmenterminplan

Projektnummer: P835-7

Marien-Hospital_Wesel_Tagesklinik Kinder+Jugendliche,Psychatrie_Physiotherapie

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Vorplanung / Förderantrag	183at	Mo, 10.11.25	Mi, 05.08.26
1.1	LP 1	79at	Mo, 10.11.25	Mi, 04.03.26
1.2	LP 2	62at	Di, 10.03.26	Do, 11.06.26
1.3	Einreichung Änderungsantrag	1at	Do, 25.06.26	Do, 25.06.26
1.4	Prüfung Änderungsantrag	30at	Do, 25.06.26	Mi, 05.08.26
1.5	Bescheid Förderantrag	1at	Mi, 05.08.26	Mi, 05.08.26
2	Erste Rate	1at	Mo, 20.07.26	Mo, 20.07.26
3	Vergabeverfahren	51at	Mo, 27.07.26	Mo, 05.10.26
4	weiterführende Planung	126at	Mo, 12.10.26	Mo, 12.04.27
4.1	LP 3	41at	Mo, 12.10.26	Mo, 07.12.26
4.2	LP 4	39at	Di, 24.11.26	Mi, 20.01.27
4.3	LP 5	65at	Fr, 08.01.27	Mo, 12.04.27
5	Baugenehmigung	1at	Fr, 16.04.27	Fr, 16.04.27
6	Ausschreibung / Vergabe	165at	Di, 23.02.27	Mo, 18.10.27
6.1	LP 6	164at	Di, 23.02.27	Fr, 15.10.27
6.2	LP 7	122at	Di, 27.04.27	Mo, 18.10.27
7	Neubau Erweiterungsbau	573at	Mo, 24.05.27	Mi, 29.08.29
7.1	Baufreimachung	27at	Mo, 24.05.27	Mi, 30.06.27
7.2	Baubeginn	1at	Mo, 21.06.27	Mo, 21.06.27
7.3	Baugrundaufbereitung und zusätzliche Gründungsarbeiten im Bereich der historischen Mauer	111at	Do, 01.07.27	Fr, 03.12.27
7.4	Gründung	33at	Mo, 06.12.27	Do, 20.01.28
7.5	Rohbau EG	27at	Fr, 21.01.28	Mo, 28.02.28
7.6	Rohbau 1.OG	29at	Di, 29.02.28	Fr, 07.04.28
7.7	Rohbau 2.OG	35at	Mo, 10.04.28	Do, 01.06.28
7.8	Dachabdichtung	19at	Fr, 02.06.28	Fr, 30.06.28
7.9	Fenster	19at	Fr, 02.06.28	Fr, 30.06.28
7.10	WDVS	33at	Mo, 03.07.28	Mi, 16.08.28
7.11	Trockenbau einseitig	33at	Mo, 03.07.28	Mi, 16.08.28
7.12	HLS Rohinstallation	43at	Fr, 04.08.28	Mi, 04.10.28
7.13	ELT Rohinstallation	43at	Fr, 04.08.28	Mi, 04.10.28
7.14	Trockenbau schließen	34at	Mi, 20.09.28	Mi, 08.11.28
7.15	Estrich	15at	Do, 09.11.28	Mi, 29.11.28
7.16	Trockenbau Decken	41at	Do, 07.12.28	Di, 06.02.29
7.17	Fliesenarbeiten Wände	28at	Mi, 31.01.29	Fr, 09.03.29
7.18	Fliesenarbeiten Boden	20at	Mo, 12.03.29	Di, 10.04.29
7.19	Bodenbelagsarbeiten	20at	Mo, 12.03.29	Di, 10.04.29
7.20	Malerarbeiten	25at	Mi, 04.04.29	Mi, 09.05.29
7.21	Türen	10at	Do, 03.05.29	Do, 17.05.29
7.22	HLS Feininstallation	20at	Do, 03.05.29	Mo, 04.06.29
7.23	ELT Feininstallation	20at	Do, 03.05.29	Mo, 04.06.29
7.24	Tischlerarbeiten	25at	Fr, 18.05.29	Mo, 25.06.29
7.25	Reinigung	9at	Di, 26.06.29	Fr, 06.07.29
7.26	Abnahmen	10at	Mo, 09.07.29	Fr, 20.07.29
7.27	Mängelbeseitigung	14at	Mo, 23.07.29	Do, 09.08.29
7.28	lose Möblierung	5at	Fr, 10.08.29	Do, 16.08.29
7.29	Bezug	14at	Fr, 10.08.29	Mi, 29.08.29
8	Außenanlagen und Freiflächen	169at	Mo, 02.07.29	Do, 28.02.30
8.1	Geländemodellierungen	55at	Mo, 02.07.29	Fr, 14.09.29
8.2	Zuwegung	45at	Mo, 17.09.29	Di, 20.11.29
8.3	Mauern und Treppen	24at	Mi, 21.11.29	Mo, 24.12.29
8.4	Einbauten	20at	Do, 27.12.29	Do, 24.01.30
8.5	Vegetationsflächen	25at	Fr, 25.01.30	Do, 28.02.30
9	Fertigstellung	1at	Fr, 01.03.30	Fr, 01.03.30

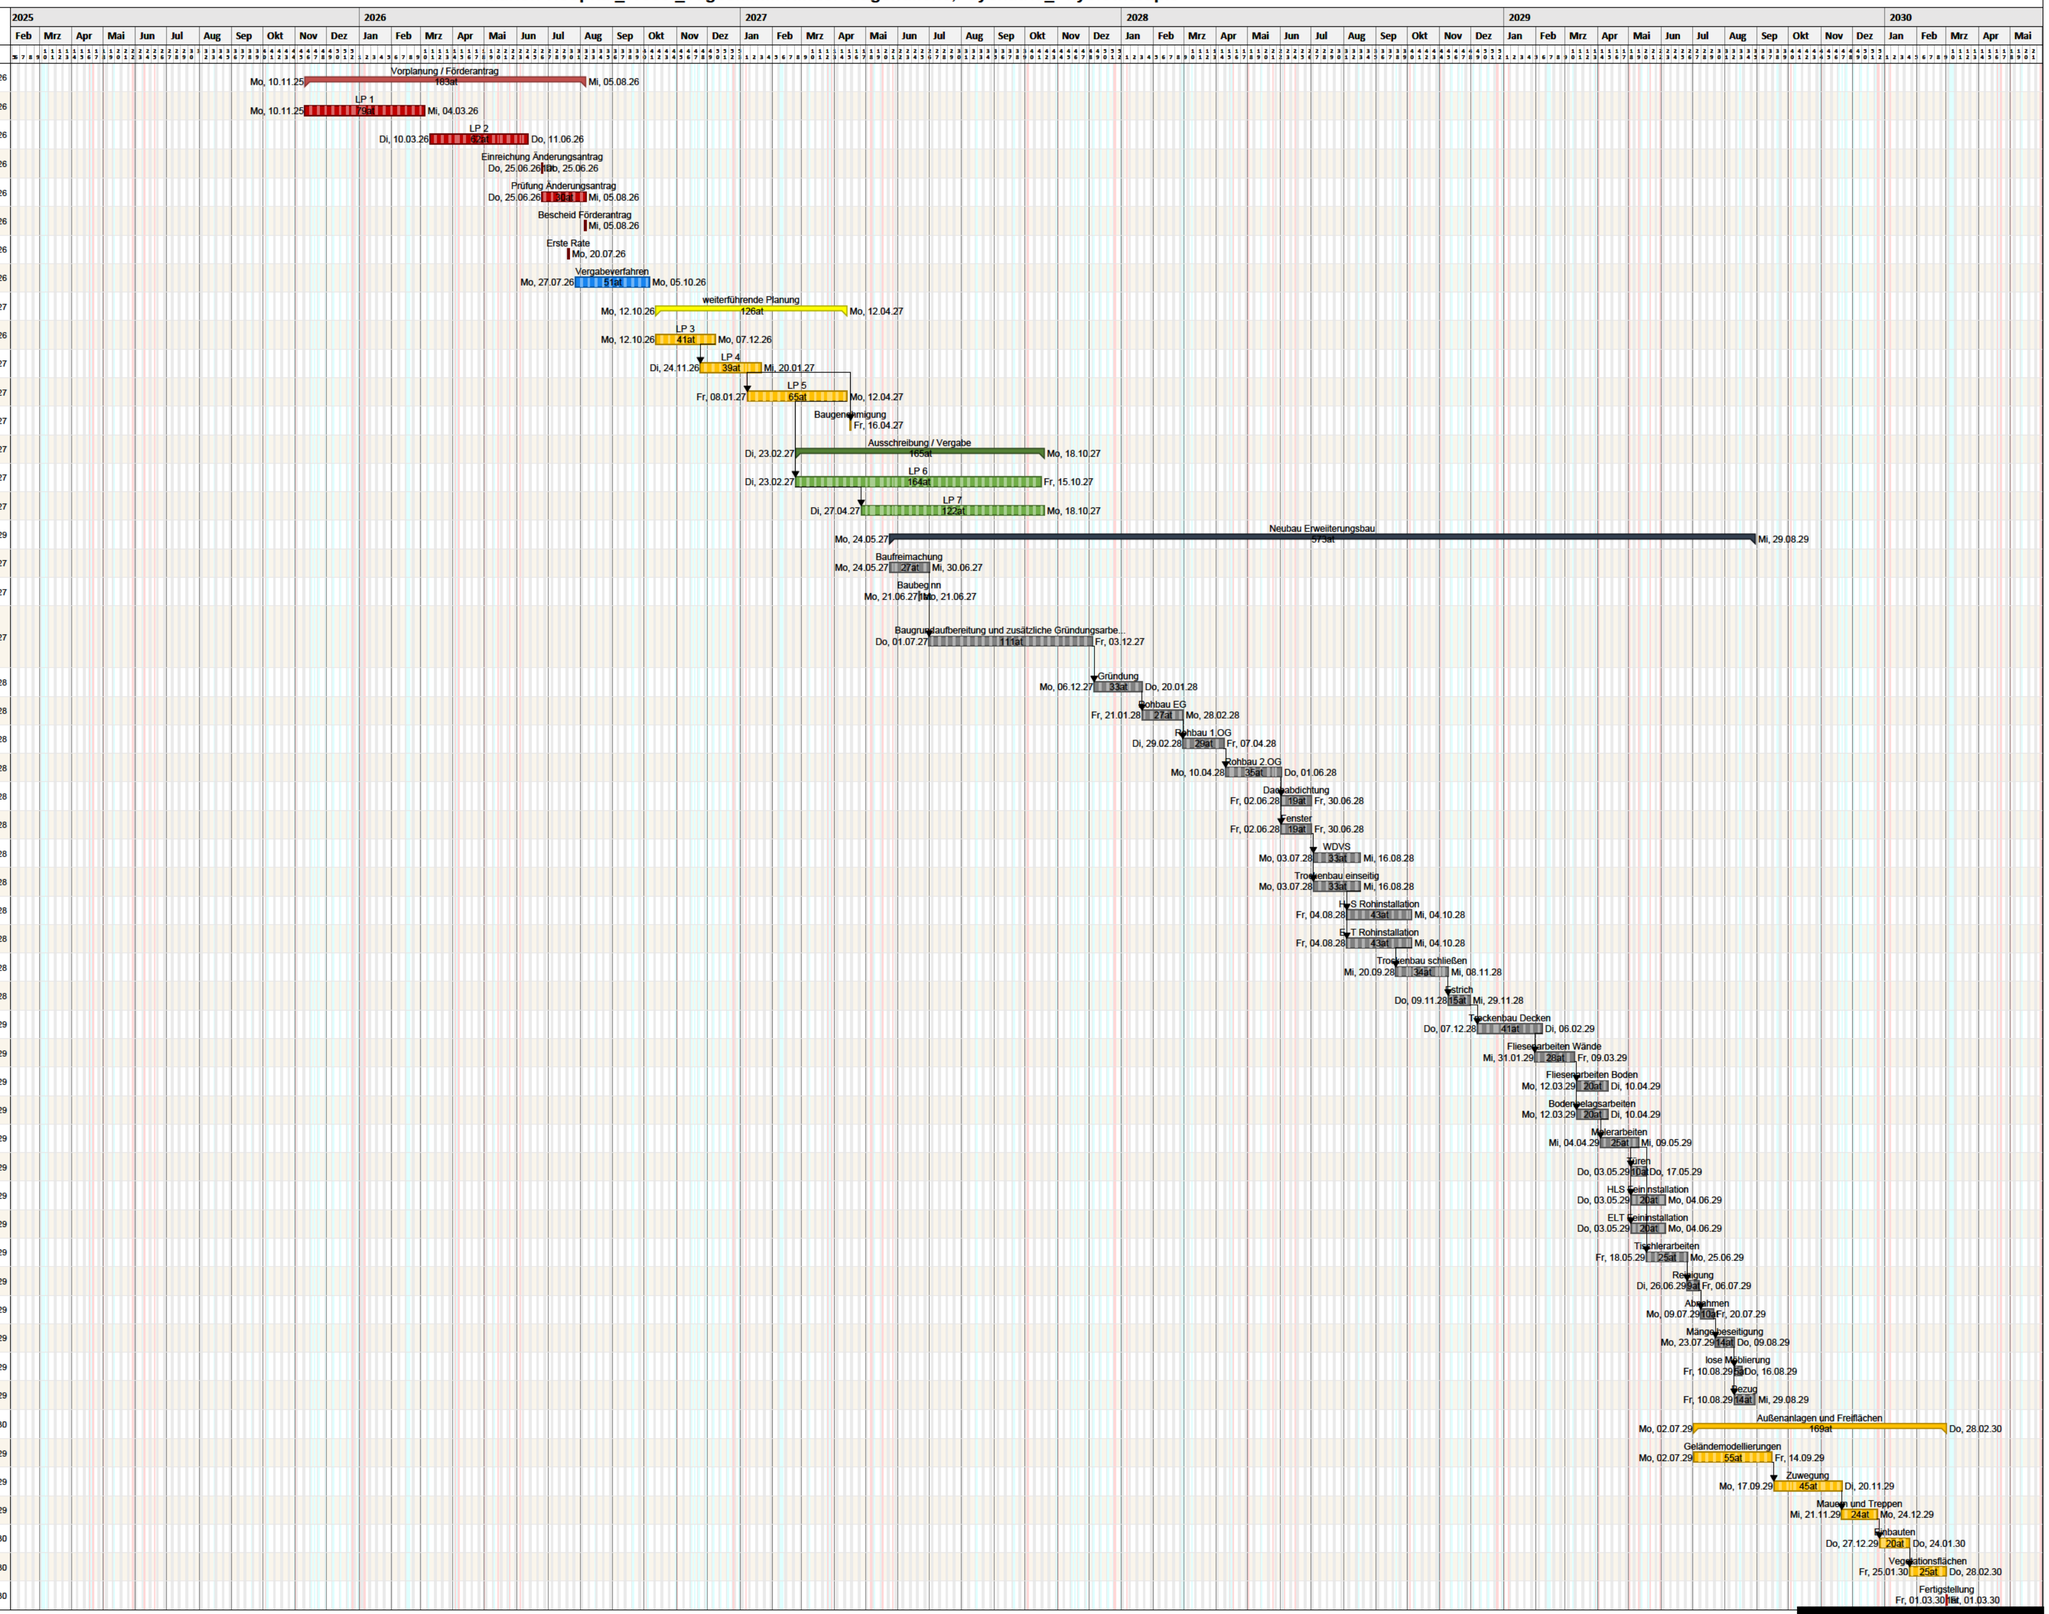

Druckdatum: 25.06.2026 07:15

[redacted]
