Samtgemeinde Neuenhaus
Veldhauser Straße 26
49828 Neuenhaus

Bauzeitenplan
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Neuenhaus
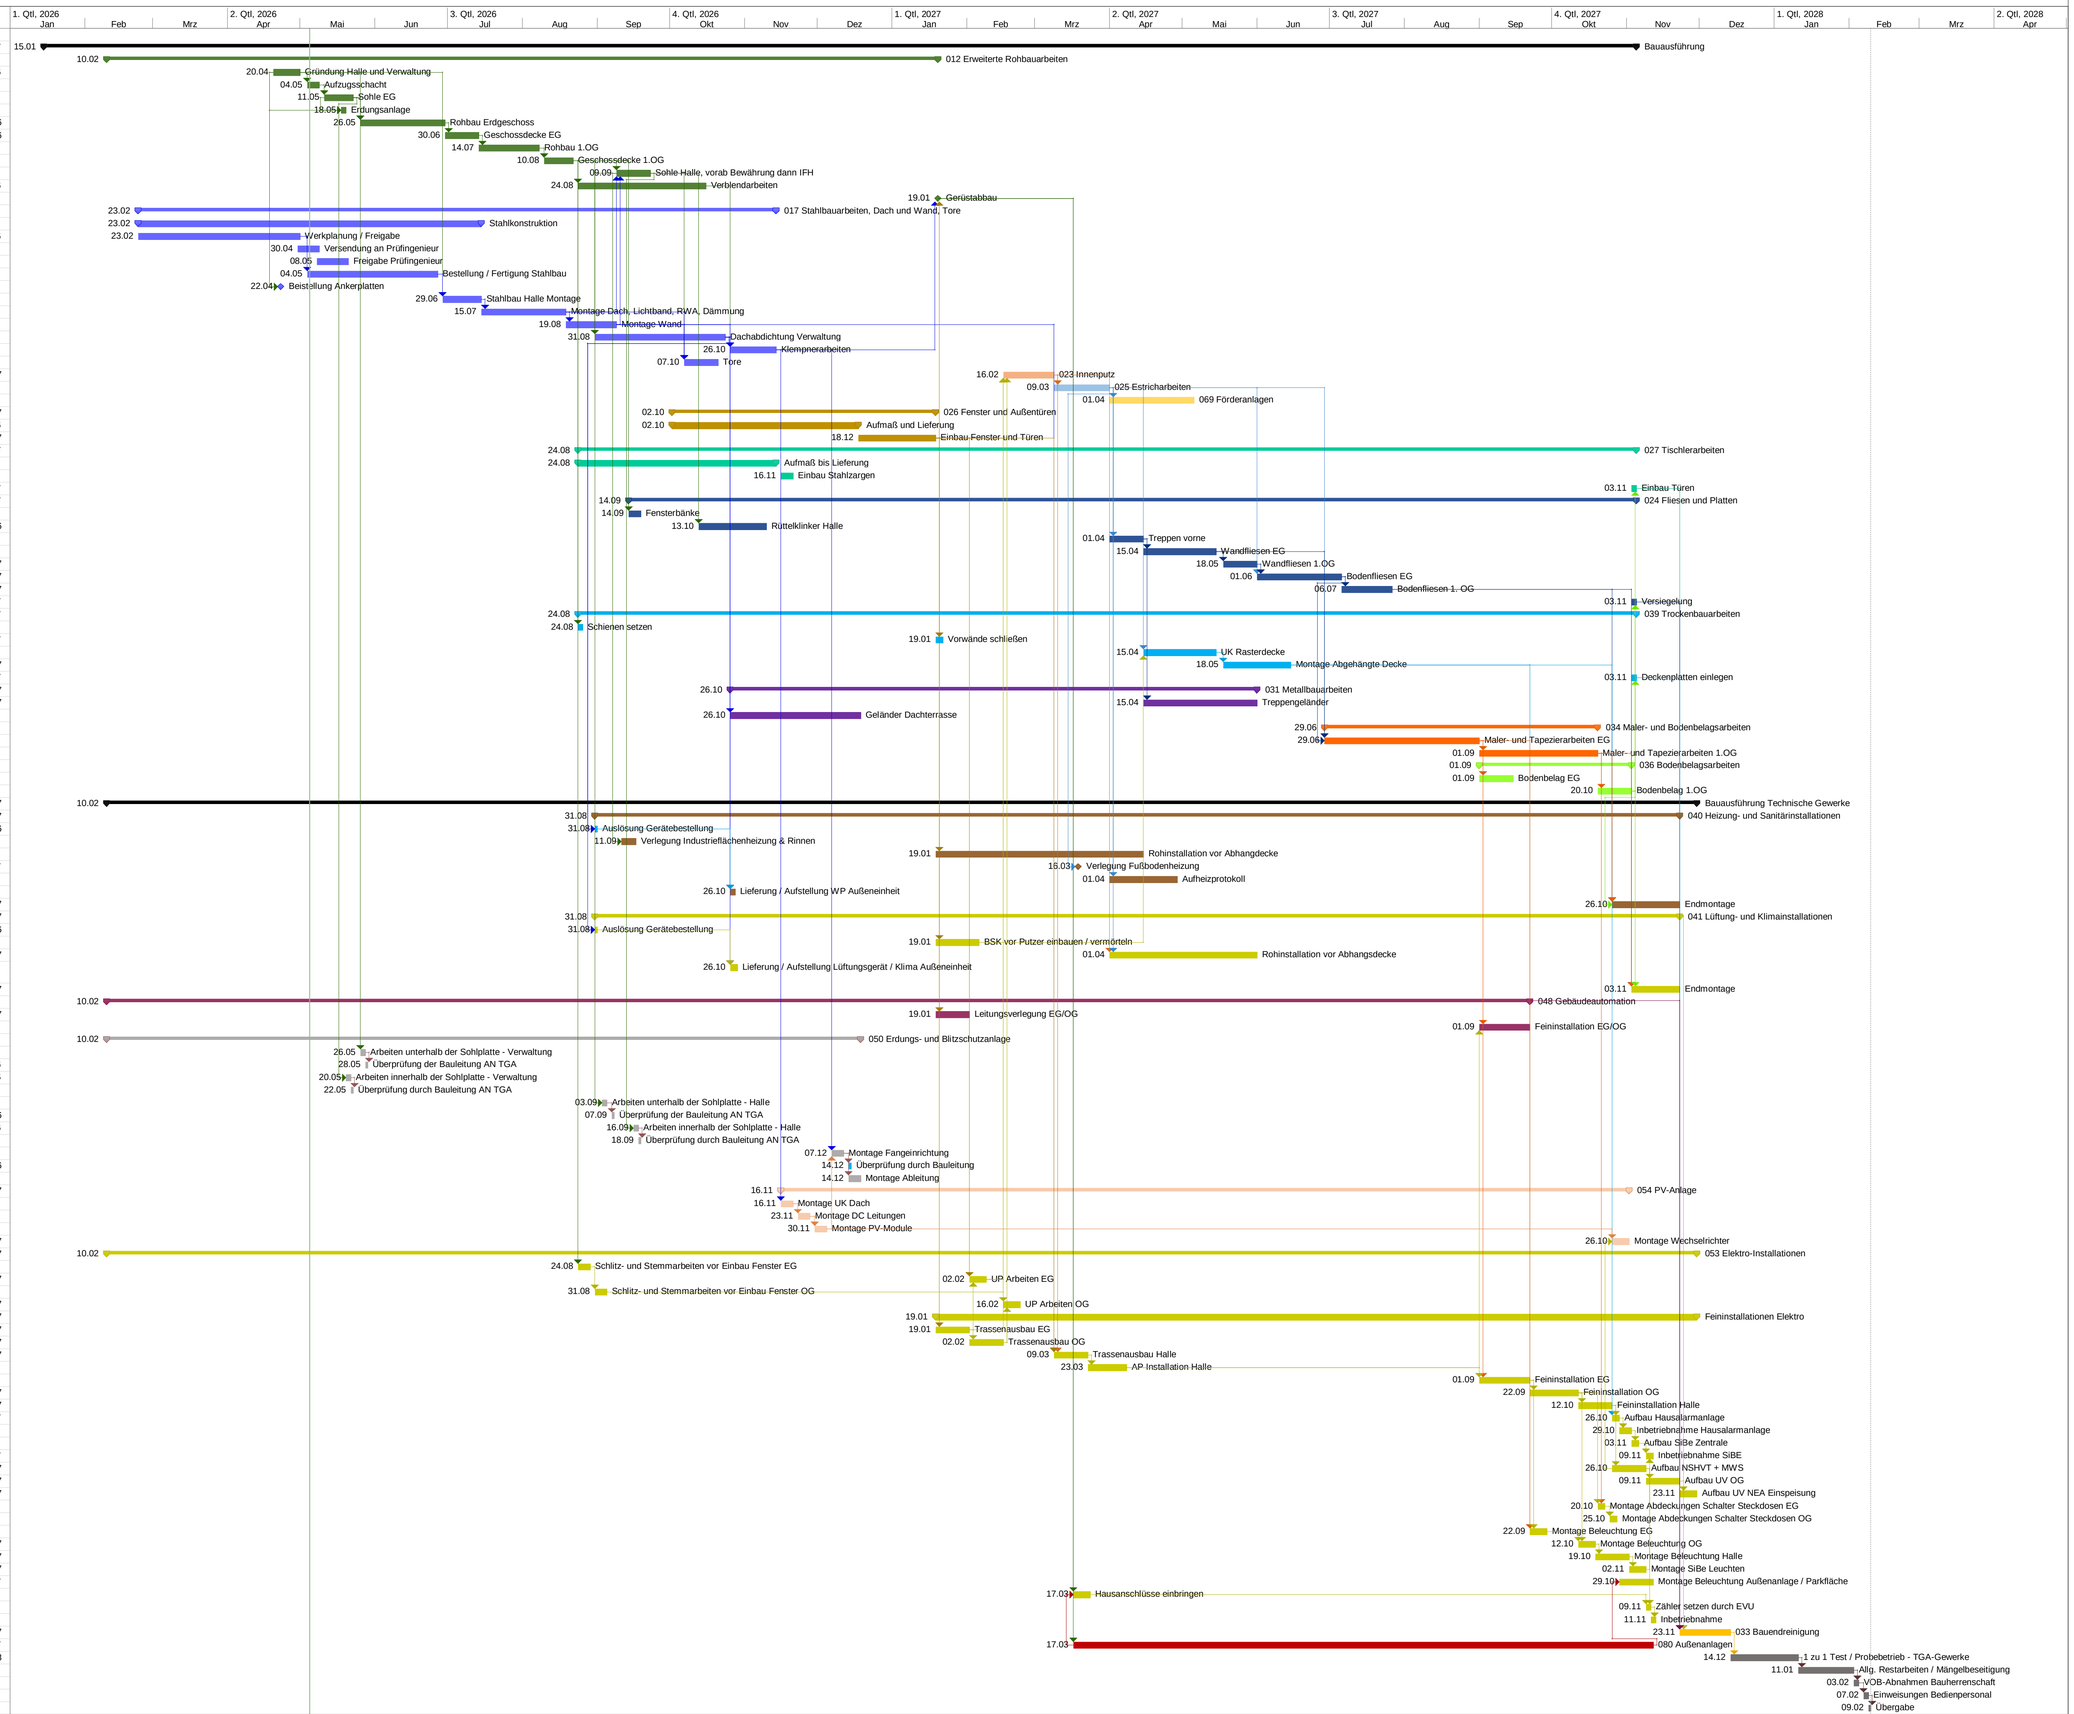
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	23-219 Neubau Feuerwehr, Neuenhaus	516 Tage	Don 15.01.26	Mit 09.02.28
2	Bauausführung	453 Tage	Don 15.01.26	Don 04.11.27
4	012 Erweiterte Rohbauarbeiten	233 Tage	Die 10.02.26	Die 19.01.27
7	Gründung Halle und Verwaltung	9 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26
8	Aufzugsschacht	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
9	Sohle EG	8 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
10	Erdungsanlage	2 Tage	Mon 18.05.26	Die 19.05.26
11	Rohbau Erdgeschoss	25 Tage	Die 26.05.26	Mon 29.06.26
12	Geschossdecke EG	10 Tage	Die 30.06.26	Mon 13.07.26
13	Rohbau 1.OG	19 Tage	Die 14.07.26	Fre 07.08.26
14	Geschossdecke 1.OG	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
15	Sohle Halle, vorab Bewährung dann IFH	10 Tage	Mit 09.09.26	Die 22.09.26
16	Verblendarbeiten	39 Tage	Mon 24.08.26	Don 15.10.26
17	Gerüstabbau	1 Tag	Die 19.01.27	Die 19.01.27
18	017 Stahlbauarbeiten, Dach und Wand, Tore	184 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.11.26
19	Stahlkonstruktion	96 Tage	Mon 23.02.26	Die 14.07.26
20	Werkplanung / Freigabe	47 Tage	Mon 23.02.26	Don 30.04.26
21	Versendung an Prüfingenieur	6 Tage	Don 30.04.26	Fre 08.05.26
22	Freigabe Prüfingenieur	7 Tage	Fre 08.05.26	Mit 20.05.26
23	Bestellung / Fertigung Stahlbau	37 Tage	Mon 04.05.26	Fre 26.06.26
24	Beistellung Ankerplatten	1 Tag	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26
25	Stahlbau Halle Montage	12 Tage	Mon 29.06.26	Die 14.07.26
26	Montage Dach, Lichtband, RWA, Dämmung	25 Tage	Mit 15.07.26	Die 18.08.26
27	Montage Wand	15 Tage	Mit 19.08.26	Die 08.09.26
28	Dachabdichtung Verwaltung	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26
29	Klempnerarbeiten	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
30	Tore	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26
31	023 Innenputz	15 Tage	Die 16.02.27	Mon 08.03.27
32	025 Estricharbeiten	15 Tage	Die 09.03.27	Mit 31.03.27
33	069 Förderanlagen	25 Tage	Don 01.04.27	Mit 05.05.27
34	026 Fenster und Außentüren	70 Tage	Fre 02.10.26	Mon 18.01.27
35	Aufmaß und Lieferung	55 Tage	Fre 02.10.26	Don 17.12.26
39	Einbau Fenster und Türen	15 Tage	Fre 18.12.26	Mon 18.01.27
40	027 Tischlerarbeiten	302 Tage	Mon 24.08.26	Don 04.11.27
41	Aufmaß bis Lieferung	60 Tage	Mon 24.08.26	Fre 13.11.26
45	Einbau Stahlzargen	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26
46	Einbau Türen	2 Tage	Mit 03.11.27	Don 04.11.27
47	024 Fliesen und Platten	287 Tage	Mon 14.09.26	Don 04.11.27
48	Fensterbänke	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
49	Rüttelklinker Halle	20 Tage	Die 13.10.26	Mon 09.11.26
50	Treppen vorne	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27
51	Wandfliesen EG	20 Tage	Don 15.04.27	Fre 14.05.27
52	Wandfliesen 1.OG	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27
53	Bodenfliesen EG	25 Tage	Die 01.06.27	Mon 05.07.27
54	Bodenfliesen 1. OG	15 Tage	Die 06.07.27	Mon 26.07.27
55	Versiegelung	2 Tage	Mit 03.11.27	Don 04.11.27
56	039 Trockenbauarbeiten	302 Tage	Mon 24.08.26	Don 04.11.27
57	Schienen setzen	2 Tage	Mon 24.08.26	Die 25.08.26
58	Vorwände schließen	3 Tage	Die 19.01.27	Don 21.01.27
59	UK Rasterdecke	20 Tage	Don 15.04.27	Fre 14.05.27
60	Montage Abgehängte Decke	20 Tage	Die 18.05.27	Mon 14.06.27
61	Deckenplatten einlegen	2 Tage	Mit 03.11.27	Don 04.11.27
62	031 Metallbauarbeiten	144 Tage	Mon 26.10.26	Mon 31.05.27
63	Treppengeländer	30 Tage	Don 15.04.27	Mon 31.05.27
64	Geländer Dachterrasse	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26
65	034 Maler- und Bodenbelagsarbeiten	81 Tage	Die 29.06.27	Die 19.10.27
66	Maler- und Tapezierarbeiten EG	46 Tage	Die 29.06.27	Die 31.08.27
67	Maler- und Tapezierarbeiten 1.OG	35 Tage	Mit 01.09.27	Die 19.10.27
68	036 Bodenbelagsarbeiten	45 Tage	Mit 01.09.27	Die 02.11.27
69	Bodenbelag EG	10 Tage	Mit 01.09.27	Die 14.09.27
70	Bodenbelag 1.OG	10 Tage	Mit 20.10.27	Die 02.11.27
71	Bauausführung Technische Gewerke	452 Tage	Die 10.02.26	Mon 29.11.27
72	040 Heizung- und Sanitärinstallationen	309 Tage	Mon 31.08.26	Mon 22.11.27
73	Auslösung Gerätebestellung	1 Tag	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
74	Verlegung Industrieflächenheizung & Rinnen	4 Tage	Fre 11.09.26	Mit 16.09.26
75	Rohinstallation vor Abhangdecke	60 Tage	Die 19.01.27	Mit 14.04.27
76	Verlegung Fußbodenheizung	3 Tage	Die 16.03.27	Don 18.03.27
77	Aufheizprotokoll	20 Tage	Don 01.04.27	Mit 28.04.27
78	Lieferung / Aufstellung WP Außeneinheit	2 Tage	Mon 26.10.26	Die 27.10.26
79	Endmontage	20 Tage	Die 26.10.27	Mon 22.11.27
80	041 Lüftung- und Klimainstallationen	309 Tage	Mon 31.08.26	Mon 22.11.27
81	Auslösung Gerätebestellung	1 Tag	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
82	BSK vor Putzer einbauen / vermörteln	14 Tage	Die 19.01.27	Fre 05.02.27
83	Rohinstallation vor Abhangsdecke	40 Tage	Don 01.04.27	Mon 31.05.27
84	Lieferung / Aufstellung Lüftungsgerät / Klima Außeneinheit	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26
85	Endmontage	14 Tage	Mit 03.11.27	Mon 22.11.27
86	048 Gebäudeautomation	403 Tage	Die 10.02.26	Die 21.09.27
89	Leitungsverlegung EG/OG	10 Tage	Die 19.01.27	Mon 01.02.27
90	Feininstallation EG/OG	15 Tage	Mit 01.09.27	Die 21.09.27
91	050 Erdungs- und Blitzschutzanlage	218 Tage	Die 10.02.26	Fre 18.12.26
92	Arbeiten unterhalb der Sohlplatte - Verwaltung	2 Tage	Die 26.05.26	Mit 27.05.26
93	Überprüfung der Bauleitung AN TGA	1 Tag	Don 28.05.26	Don 28.05.26
94	Arbeiten innerhalb der Sohlplatte - Verwaltung	2 Tage	Mit 20.05.26	Don 21.05.26
95	Überprüfung durch Bauleitung AN TGA	1 Tag	Fre 22.05.26	Fre 22.05.26
96	Arbeiten unterhalb der Sohlplatte - Halle	2 Tage	Don 03.09.26	Fre 04.09.26
97	Überprüfung der Bauleitung AN TGA	1 Tag	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26
100	Arbeiten innerhalb der Sohlplatte - Halle	2 Tage	Mit 16.09.26	Don 17.09.26
101	Überprüfung durch Bauleitung AN TGA	1 Tag	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
102	Montage Fangeinrichtung	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
103	Überprüfung durch Bauleitung	1 Tag	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26
104	Montage Ableitung	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26
105	054 PV-Anlage	239 Tage	Mon 16.11.26	Mon 01.11.27
106	Montage UK Dach	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26
107	Montage DC Leitungen	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26
108	Montage PV-Module	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
109	Montage Wechselrichter	5 Tage	Die 26.10.27	Mon 01.11.27
110	053 Elektro-Installationen	452 Tage	Die 10.02.26	Mon 29.11.27
114	Schlitz- und Stemmarbeiten vor Einbau Fenster EG	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
115	UP Arbeiten EG	5 Tage	Die 02.02.27	Mon 08.02.27
116	Schlitz- und Stemmarbeiten vor Einbau Fenster OG	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
117	UP Arbeiten OG	5 Tage	Die 16.02.27	Mon 22.02.27
118	Feininstallationen Elektro	220 Tage	Die 19.01.27	Mon 29.11.27
119	Trassenausbau EG	10 Tage	Die 19.01.27	Mon 01.02.27
120	Trassenausbau OG	10 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.02.27
121	Trassenausbau Halle	10 Tage	Die 09.03.27	Mon 22.03.27
122	AP Installation Halle	10 Tage	Die 23.03.27	Mit 07.04.27
123	Feininstallation EG	15 Tage	Mit 01.09.27	Die 21.09.27
124	Feininstallation OG	14 Tage	Mit 22.09.27	Mon 11.10.27
125	Feininstallation Halle	10 Tage	Die 12.10.27	Mon 25.10.27
126	Aufbau Hausalarmanlage	3 Tage	Die 26.10.27	Don 28.10.27
127	Inbetriebnahme Hausalarmanlage	3 Tage	Fre 29.10.27	Die 02.11.27
128	Aufbau SiBe Zentrale	3 Tage	Mit 03.11.27	Fre 05.11.27
129	Inbetriebnahme SiBE	3 Tage	Die 09.11.27	Don 11.11.27
130	Aufbau NSHVT + MWS	10 Tage	Die 26.10.27	Mon 08.11.27
131	Aufbau UV OG	10 Tage	Die 09.11.27	Mon 22.11.27
132	Aufbau UV NEA Einspeisung	5 Tage	Die 23.11.27	Mon 29.11.27
133	Montage Abdeckungen Schalter Steckdosen EG	3 Tage	Mit 20.10.27	Fre 22.10.27
134	Montage Abdeckungen Schalter Steckdosen OG	3 Tage	Mon 25.10.27	Mit 27.10.27
135	Montage Beleuchtung EG	5 Tage	Mit 22.09.27	Die 28.09.27
136	Montage Beleuchtung OG	5 Tage	Die 12.10.27	Mon 18.10.27
137	Montage Beleuchtung Halle	10 Tage	Die 19.10.27	Mon 01.11.27
138	Montage SiBe Leuchten	5 Tage	Die 02.11.27	Mon 08.11.27
139	Montage Beleuchtung Außenanlage / Parkfläche	10 Tage	Fre 29.10.27	Don 11.11.27
140	Hausanschlüsse einbringen	5 Tage	Mit 17.03.27	Die 23.03.27
141	Zähler setzen durch EVU	2 Tage	Die 09.11.27	Mit 10.11.27
142	Inbetriebnahme	2 Tage	Don 11.11.27	Fre 12.11.27
143	033 Bauendreinigung	15 Tage	Die 23.11.27	Mon 13.12.27
144	080 Außenanlagen	167 Tage	Mit 17.03.27	Don 11.11.27
145	1 zu 1 Test / Probebetrieb - TGA-Gewerke	14 Tage	Die 14.12.27	Mon 10.01.28
146	Allg. Restarbeiten / Mängelbeseitigung	17 Tage	Die 11.01.28	Mit 02.02.28
147	VOB-Abnahmen Bauherrenschaft	2 Tage	Don 03.02.28	Fre 04.02.28
148	Einweisungen Bedienpersonal	2 Tage	Mon 07.02.28	Die 08.02.28
149	Übergabe	1 Tag	Mit 09.02.28	Mit 09.02.28
