Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Baustelle einrichten, Gelände roden, Mutterboden abschieben	16 Tage	Mon 03.07.23	Mon 24.07.23	
2	Umschluss Elt, 10 Tage in den Ferien, Rest davor	18 Tage	Sam 24.06.23	Die 18.07.23	
3	Demontage Elt	4 Tage	Mit 19.07.23	Mon 24.07.23	2
4	**Schadstoffsanierung + Rückbau**	**81 Tage**	**Die 25.07.23**	**Die 14.11.23**	
5	**Schadstoffsanierung**	**62 Tage**	**Die 25.07.23**	**Mit 18.10.23**	
6	Schadstoffsanierung Trakt H - Haupttrakt	30 Tage	Die 25.07.23	Mon 04.09.23	3;1;2
7	Verschluss der Gebäudeöffnungen von Trakt D zum Trakt N im EG und Einbau Baustellentür	5 Tage	Die 29.08.23	Die 05.09.23	11AE
8	Herstellen neuer Durchbrüche im Trakt D im 1. OG	3 Tage	Don 24.08.23	Die 29.08.23	11AE-5 Tage
9	Verschluss der Gebäudeöffnungen von Trakt D zum Trakt N im 1. OG und einbau Baustellentür	3 Tage	Die 29.08.23	Don 31.08.23	8
10	Herstellen einer temporären Fluchttreppe aus dem Westtrakt - Trakt N	2 Tage	Don 31.08.23	Mon 04.09.23	11AE-1 Tag
11	Schadstoffsanierung Trakt N - Anbau Westtrakt	18 Tage	Die 05.09.23	Don 28.09.23	6
12	Schadstoffsanierung - Aulafoyer	14 Tage	Fre 29.09.23	Mit 18.10.23	11
13	**Konstruktiver Rückbau**	**51 Tage**	**Die 05.09.23**	**Die 14.11.23**	
14	Konstruktiver Rückbau Trakt H - Haupttrakt Ausführung bis Achse 3	22 Tage	Die 05.09.23	Mit 04.10.23	6
15	Kontruktiver Rückbau Trakt H - Haupttrakt Treppenhaus D Nord bis Decke über EG	3 Tage	Don 05.10.23	Mon 09.10.23	14
16	Verschluss der Öffnung im KG Trakt H - Haupttrakt Treppenhauswand, anschließend Abdichtung der Wand	4 Tage	Die 10.10.23	Fre 13.10.23	15
17	Start Herbstferien Rückbau der Trennwände in Achse XI' Treppenhaus Nord Trakt D und Verschluss der Öffnung	3 Tage	Mon 16.10.23	Mit 18.10.23	15EA+4 Tage
18	Konstruktiver Rückbau Trakt N - Anbau Westtrakt - Trakt N	14 Tage	Die 10.10.23	Fre 27.10.23	15
19	Baugrube verfüllen im Bereich Anbau Westtrakt - Trakt N	6 Tage	Mon 30.10.23	Mon 06.11.23	18
20	Temporäres Herrichten des Schulhofbereiches mit Mineralgemisch und hydraulisch gebundener Decke	5 Tage	Die 07.11.23	Mon 13.11.23	19
21	Konstruktiver Rückbau - Aulafoyer	12 Tage	Mon 30.10.23	Die 14.11.23	18

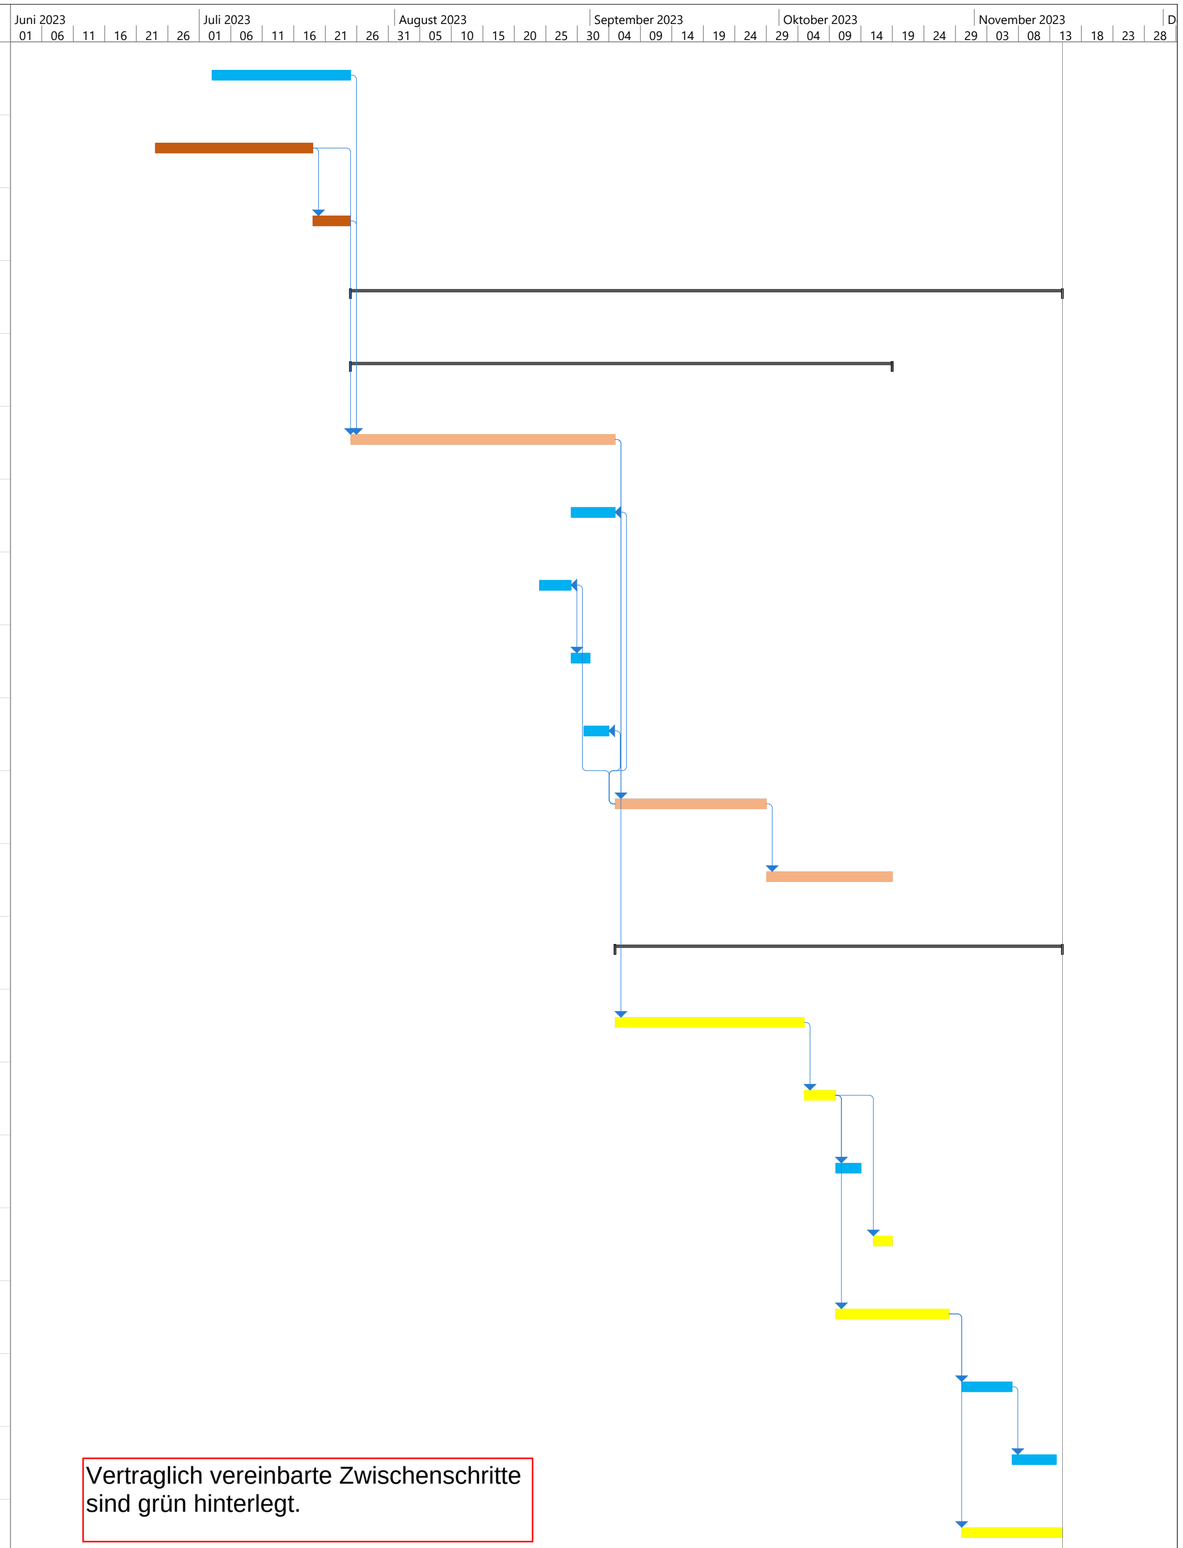

Vertraglich vereinbarte Zwischenschritte sind grün hinterlegt.

Projekt: 2022-10-25_Vergabete
Datum: Fre 27.01.23

Vorgang
Vorgang
Vorgang
Vorgang
Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang
Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Vorgang
Manueller Vorgang
Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang
Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein
Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt
