Rahmenterminplan Deponie Kolenfeld, Ausschreibung 2 - Pufferspeicher und Druckleitungen
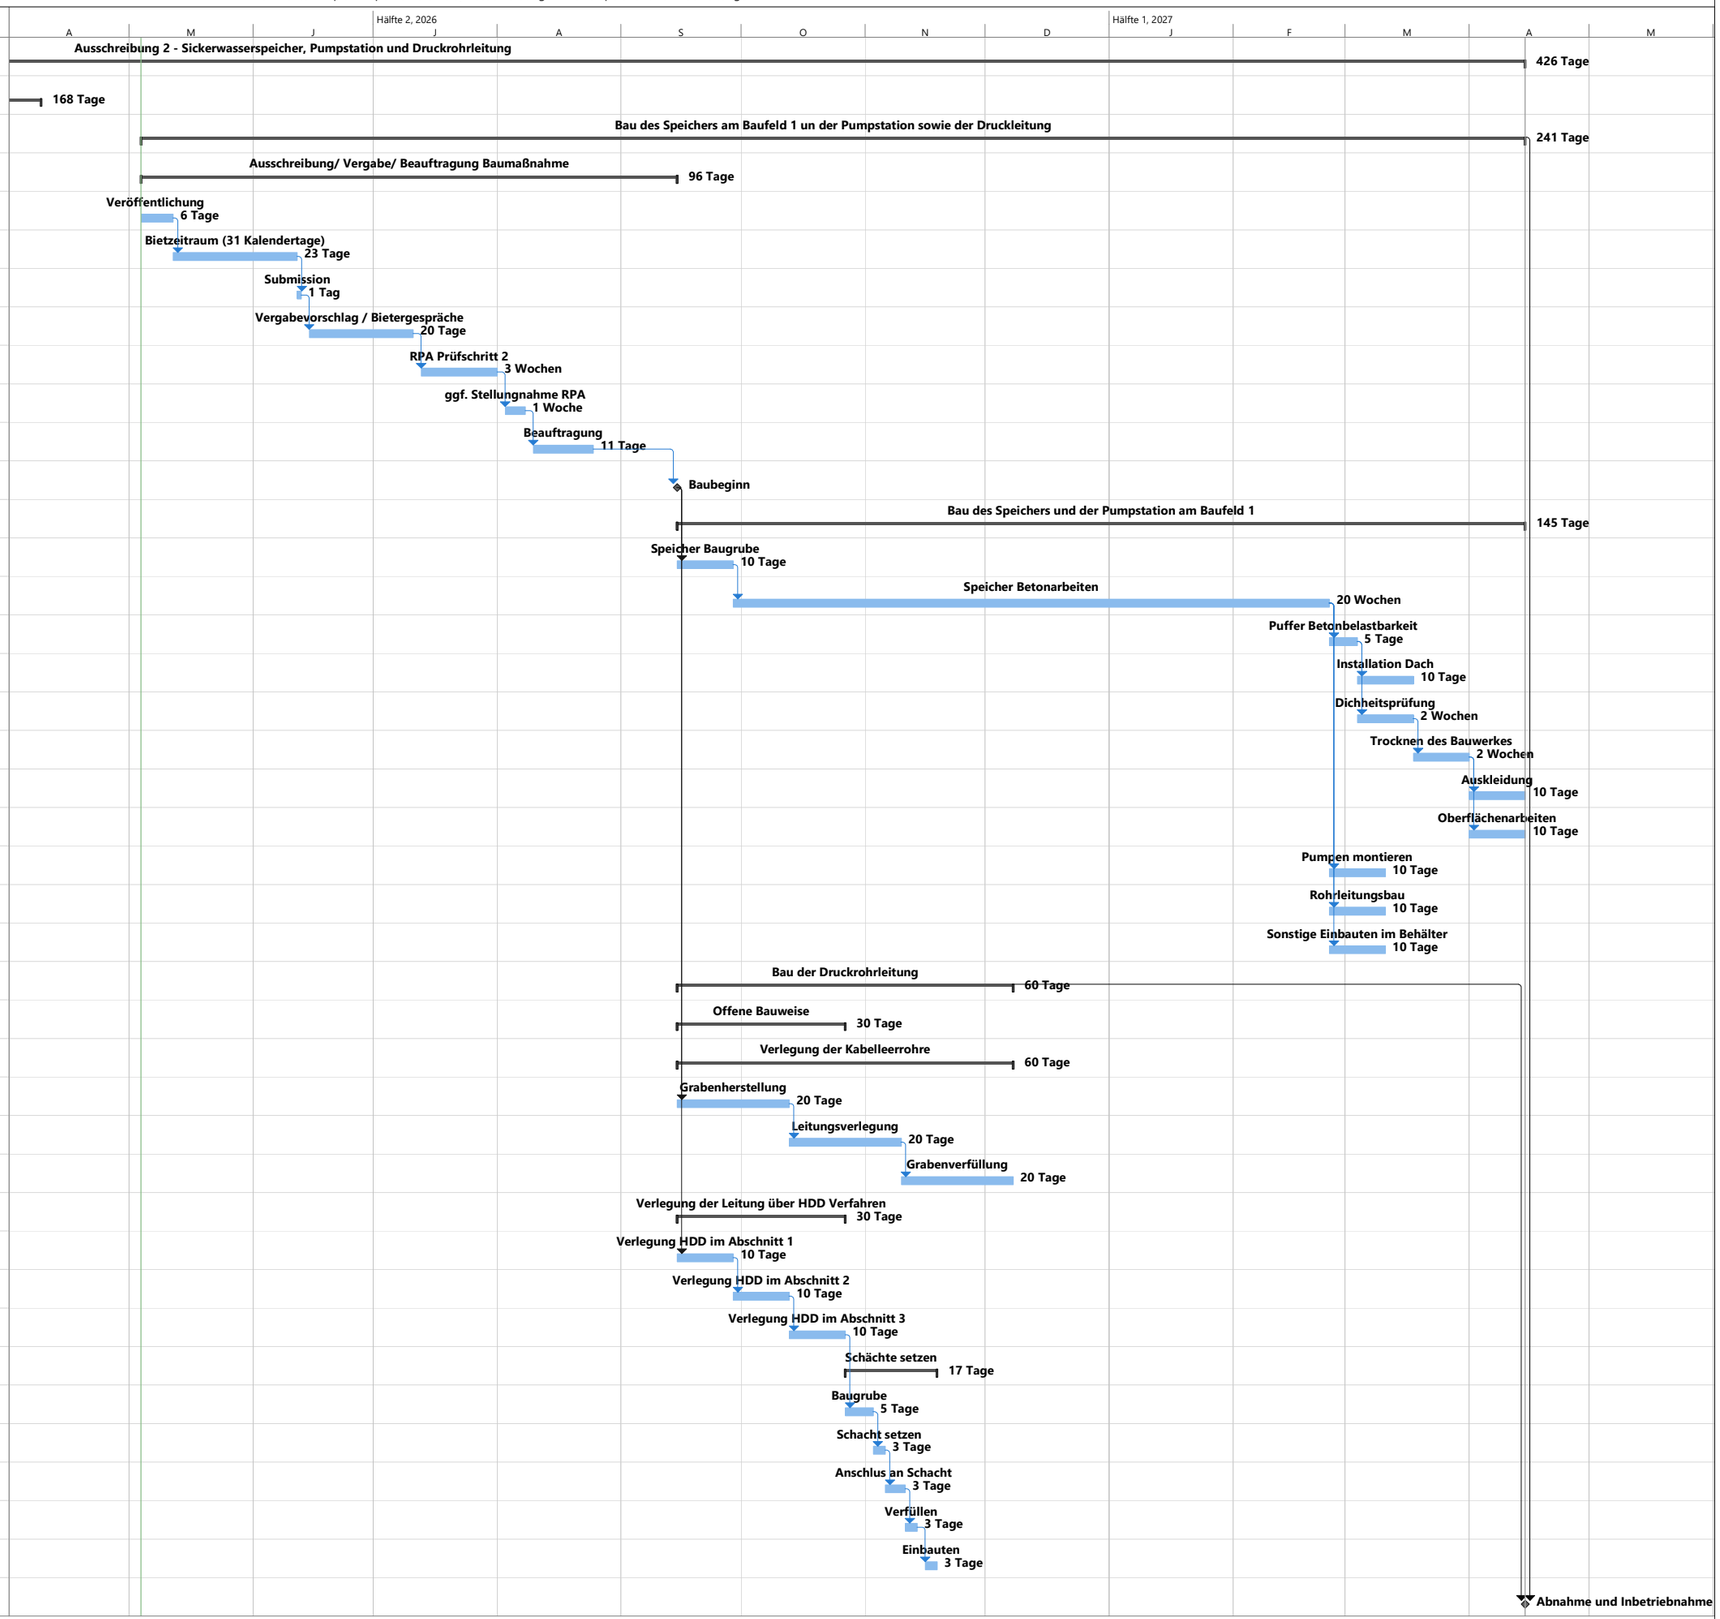
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Ausschreibung 2 - Sickerwasserspeicher, Pumpstation und Druckrohrleitung**	**426 Tage**	**Don 07.08.25**	**Mit 14.04.27**	
2	**Planung des Speichers, der Pumpstation am Baufeld 1 und der Druckleitung**	**168 Tage**	**Don 07.08.25**	**Mit 08.04.26**	
18	**Bau des Speichers am Baufeld 1 un der Pumpstation sowie der Druckleitung**	**241 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 14.04.27**	
19	**Ausschreibung/ Vergabe/ Beauftragung Baumaßnahme**	**96 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mon 14.09.26**	
20	Veröffentlichung	6 Tage	Mon 04.05.26	Mon 11.05.26	8;14;16;17
21	Bietzeitraum (31 Kalendertage)	23 Tage	Die 12.05.26	Don 11.06.26	20
22	Submission	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	21
23	Vergabevorschlag / Bietergespräche	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26	22
24	RPA Prüfschritt 2	3 Wochen	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	23
25	ggf. Stellungnahme RPA	1 Woche	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	24
26	Beauftragung	11 Tage	Mon 10.08.26	Mon 24.08.26	25
27	Baubeginn	0 Tage	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26	26EA+15 Tage
28	**Bau des Speichers und der Pumpstation am Baufeld 1**	**145 Tage**	**Die 15.09.26**	**Mit 14.04.27**	
29	Speicher Baugrube	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	27
30	Speicher Betonarbeiten	20 Wochen	Die 29.09.26	Mit 24.02.27	29
31	Puffer Betonbelastbarkeit	5 Tage	Don 25.02.27	Mit 03.03.27	30
32	Installation Dach	10 Tage	Don 04.03.27	Mit 17.03.27	31
33	Dichheitsprüfung	2 Wochen	Don 04.03.27	Mit 17.03.27	31
34	Trocknen des Bauwerkes	2 Wochen	Don 18.03.27	Mit 31.03.27	33
35	Auskleidung	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27	34
36	Oberflächenarbeiten	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27	34
37	Pumpen montieren	10 Tage	Don 25.02.27	Mit 10.03.27	30
38	Rohrleitungsbau	10 Tage	Don 25.02.27	Mit 10.03.27	30
39	Sonstige Einbauten im Behälter	10 Tage	Don 25.02.27	Mit 10.03.27	30
40	**Bau der Druckrohrleitung**	**60 Tage**	**Die 15.09.26**	**Mon 07.12.26**	
41	**Offene Bauweise**	**30 Tage**	**Die 15.09.26**	**Mon 26.10.26**	
45	**Verlegung der Kabelleerrohre**	**60 Tage**	**Die 15.09.26**	**Mon 07.12.26**	
46	Grabenherstellung	20 Tage	Die 15.09.26	Mon 12.10.26	27
47	Leitungsverlegung	20 Tage	Die 13.10.26	Mon 09.11.26	46
48	Grabenverfüllung	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26	47
49	**Verlegung der Leitung über HDD Verfahren**	**30 Tage**	**Die 15.09.26**	**Mon 26.10.26**	
50	Verlegung HDD im Abschnitt 1	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	27
51	Verlegung HDD im Abschnitt 2	10 Tage	Die 29.09.26	Mon 12.10.26	50
52	Verlegung HDD im Abschnitt 3	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	51
53	**Schächte setzen**	**17 Tage**	**Die 27.10.26**	**Mit 18.11.26**	
54	Baugrube	5 Tage	Die 27.10.26	Mon 02.11.26	52
55	Schacht setzen	3 Tage	Die 03.11.26	Don 05.11.26	54
56	Anschlus an Schacht	3 Tage	Fre 06.11.26	Die 10.11.26	55
57	Verfüllen	3 Tage	Mit 11.11.26	Fre 13.11.26	56
58	Einbauten	3 Tage	Mon 16.11.26	Mit 18.11.26	57
59	**Abnahme und Inbetriebnahme**	**0 Tage**	**Mit 14.04.27**	**Mit 14.04.27**	**18;40**
