
HOCHBAHN

Rahmenterminplan

U3 Bahnsteigverlängerungen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig
1	**Rahmenterminplan U3 Bahnsteigverlängerungen**	**2348 Tage**	**Don 01.01.26**	**Mon 01.01.35**	
2	**Abschnitt 1**	**1847 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 28.01.33**	
3	**Hauptbahnhof Süd (HB)**	**1847 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 28.01.33**	
4	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
5	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
6	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
7	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
8	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
9	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
10	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
11	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
12	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
13	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
14	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
15	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	110 Tage	Mon 02.10.28	Fre 02.03.29	TAB
16	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Mon 02.04.29	Mon 02.04.29	TAB
17	Ausführungsplanung (Lph 5) vorber. Maßnahmen	107 Tage	Don 01.02.29	Fre 29.06.29	Planer Lph 5-9
18	Vorbereitung Vergabe (Lph 6) vorber. Maßnahmen	65 Tage	Mon 02.07.29	Fre 28.09.29	Planer Lph 5-9
19	Ausschreibung u. Vergabe (Lph 7) vorber. Maßnahmen	65 Tage	Mon 01.10.29	Fre 28.12.29	Planer Lph 5-9
20	Bauausführung vorber. Maßnahmen	522 Tage	Die 01.01.30	Mit 31.12.31	AN Bau
21	Ausführungsplanung (Lph 5)	325 Tage	Mon 02.07.29	Fre 27.09.30	Planer Lph 5-9
22	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	130 Tage	Mon 30.09.30	Fre 28.03.31	Planer Lph 5-9
23	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mon 31.03.31	Fre 26.09.31	Planer Lph 5-9
24	Vorbereitung Baubeginn	59 Tage	Fre 10.10.31	Mit 31.12.31	AN Bau
25	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
26	Bauausführung	282 Tage	Don 01.01.32	Fre 28.01.33	AN Bau
27	**Mönckebergstraße (MO)**	**1847 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 28.01.33**	
28	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
29	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
30	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
31	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
32	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
33	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
34	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
35	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
36	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
37	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
38	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
39	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 02.10.28	Fre 29.03.30	BWI & TAB
40	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	BWI & TAB
41	Ausführungsplanung (Lph 5)	430 Tage	Mon 05.02.29	Fre 27.09.30	Planer Lph 5-9
42	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	130 Tage	Mon 30.09.30	Fre 28.03.31	Planer Lph 5-9
43	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mon 31.03.31	Fre 26.09.31	Planer Lph 5-9
44	Vorbereitende Leitungsverlegungen	260 Tage	Mon 30.09.30	Fre 26.09.31	Leitungsträger
45	Vorbereitung Baubeginn	59 Tage	Fre 10.10.31	Mit 31.12.31	AN Bau
46	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
47	Bauausführung	282 Tage	Don 01.01.32	Fre 28.01.33	AN Bau
48	**Rathaus (RA)**	**1695 Tage**	**Don 01.01.26**	**Mit 30.06.32**	
49	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
50	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
51	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
52	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
53	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
54	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
55	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
56	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
57	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
58	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
59	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
60	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 02.10.28	Fre 29.03.30	BWI & TAB
61	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	BWI & TAB
62	Ausführungsplanung (Lph 5)	430 Tage	Mon 05.02.29	Fre 27.09.30	Planer Lph 5-9
63	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	130 Tage	Mon 30.09.30	Fre 28.03.31	Planer Lph 5-9
64	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mon 31.03.31	Fre 26.09.31	Planer Lph 5-9
65	Vorbereitende Leitungsverlegungen	260 Tage	Mon 30.09.30	Fre 26.09.31	Leitungsträger
66	Vorbereitung Baubeginn	59 Tage	Fre 10.10.31	Mit 31.12.31	AN Bau
67	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
68	Bauausführung	130 Tage	Don 01.01.32	Mit 30.06.32	AN Bau
69	**Rödingsmarkt (RD)**	**1737 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 27.08.32**	
70	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
71	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
72	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
73	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
74	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
75	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
76	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
77	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
78	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
79	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
80	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
81	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 02.10.28	Fre 29.03.30	BWI & TAB
82	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	BWI & TAB
83	Ausführungsplanung (Lph 5)	367 Tage	Fre 02.02.29	Mon 01.07.30	Planer Lph 5-9
84	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	132 Tage	Die 02.07.30	Mit 01.01.31	Planer Lph 5-9
85	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	128 Tage	Don 02.01.31	Mon 30.06.31	Planer Lph 5-9
86	Vorbereitung Baubeginn	130 Tage	Die 01.07.31	Mon 29.12.31	AN Bau
87	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
88	Bauausführung	172 Tage	Don 01.01.32	Fre 27.08.32	AN Bau
89	**Baumwall (BL)**	**1737 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 27.08.32**	
90	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
91	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
92	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
93	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
94	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
95	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
96	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
97	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
98	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
99	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
100	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
101	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 02.10.28	Fre 29.03.30	BWI & TAB
102	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	BWI & TAB
103	Ausführungsplanung (Lph 5)	367 Tage	Fre 02.02.29	Mon 01.07.30	Planer Lph 5-9
104	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	132 Tage	Die 02.07.30	Mit 01.01.31	Planer Lph 5-9
105	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	128 Tage	Don 02.01.31	Mon 30.06.31	Planer Lph 5-9
106	Vorbereitung Baubeginn	130 Tage	Die 01.07.31	Mon 29.12.31	AN Bau
107	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
108	Bauausführung	172 Tage	Don 01.01.32	Fre 27.08.32	AN Bau
109	**Landungsbrücken (LB)**	**1737 Tage**	**Don 01.01.26**	**Fre 27.08.32**	
110	Planungsbeginn	0 Tage	Don 01.01.26	Don 01.01.26	
111	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Don 01.01.26	Don 31.12.26	Planer Lph 1-4
112	Entwurfsplanung (Lph 3)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
113	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
114	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
115	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
116	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
117	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
118	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Don 01.02.29	Don 01.02.29	BVM
119	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28	Planer Lph 1-4
120	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 29.09.28	Fre 29.09.28	HHA
121	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 02.10.28	Fre 29.03.30	BWI & TAB
122	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30	BWI & TAB
123	Ausführungsplanung (Lph 5)	367 Tage	Fre 02.02.29	Mon 01.07.30	Planer Lph 5-9
124	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	132 Tage	Die 02.07.30	Mit 01.01.31	Planer Lph 5-9
125	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	128 Tage	Don 02.01.31	Mon 30.06.31	Planer Lph 5-9
126	Vorbereitung Baubeginn	130 Tage	Die 01.07.31	Mon 29.12.31	AN Bau
127	Baubeginn	0 Tage	Don 01.01.32	Don 01.01.32	
128	Bauausführung	172 Tage	Don 01.01.32	Fre 27.08.32	AN Bau
129	**Abschnitt 2**	**2087 Tage**	**Fre 01.01.27**	**Mon 01.01.35**	
130	**Eppendorfer Baum (EP)**	**1761 Tage**	**Fre 01.01.27**	**Fre 30.09.33**	
131	Planungsbeginn	0 Tage	Fre 01.01.27	Fre 01.01.27	
132	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
133	Erstellung vertiefte Kostenschätzung	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
134	Technische Prüfung vertiefte KoSch	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
135	Übergabe vertiefte KoSch an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
136	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
137	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
138	Entwurfsplanung (Lph 3)	260 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.03.29	Planer Lph 1-4
139	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 02.04.29	Fre 29.06.29	Planer Lph 1-4
140	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 02.07.29	Fre 28.09.29	HHA
141	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
142	Prüfung Förderantrag	65 Tage	Mon 01.10.29	Fre 28.12.29	BVM
143	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	BVM
144	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 02.04.29	Fre 28.09.29	Planer Lph 1-4
145	Genehmigungsantrag	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
146	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 01.10.29	Fre 28.03.31	BWI & TAB
147	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Die 01.04.31	Die 01.04.31	BWI & TAB
148	Ausführungsplanung (Lph 5)	432 Tage	Mon 04.02.30	Die 30.09.31	Planer Lph 5-9
149	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	133 Tage	Mit 01.10.31	Fre 02.04.32	Planer Lph 5-9
150	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mon 05.04.32	Fre 01.10.32	Planer Lph 5-9
151	Vorbereitung Baubeginn	130 Tage	Mon 04.10.32	Fre 01.04.33	AN Bau
152	Baubeginn	0 Tage	Fre 01.04.33	Fre 01.04.33	
153	Bauausführung	130 Tage	Mon 04.04.33	Fre 30.09.33	AN Bau
154	**Hoheluftbrücke (HO)**	**1891 Tage**	**Fre 01.01.27**	**Fre 31.03.34**	
155	Planungsbeginn	0 Tage	Fre 01.01.27	Fre 01.01.27	
156	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
157	Erstellung vertiefte Kostenschätzung	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
158	Technische Prüfung vertiefte KoSch	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
159	Übergabe vertiefte KoSch an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
160	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
161	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
162	Entwurfsplanung (LPH 3)	260 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.03.29	Planer Lph 1-4
163	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 02.04.29	Fre 29.06.29	Planer Lph 1-4
164	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 02.07.29	Fre 28.09.29	HHA
165	Übergabe BuK und Förderantrag an BVM	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
166	Prüfung Förderantrag	65 Tage	Mon 01.10.29	Fre 28.12.29	BVM
167	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	BVM
168	Genehmigungsplanung (Lph 4)	130 Tage	Mon 02.04.29	Fre 28.09.29	Planer Lph 1-4
169	Genehmigungsantrag	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
170	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Mon 01.10.29	Fre 28.03.31	BWI & TAB
171	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Die 01.04.31	Die 01.04.31	BWI & TAB
172	Ausführungsplanung (Lph 5)	433 Tage	Fre 01.02.30	Die 30.09.31	Planer Lph 5-9
173	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	132 Tage	Mit 01.10.31	Don 01.04.32	Planer Lph 5-9
174	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Fre 02.04.32	Don 30.09.32	Planer Lph 5-9
175	Vorbereitende Maßnahmen (Kleingärten räumen)	130 Tage	Fre 01.10.32	Don 31.03.33	AN Bau
176	Baubeginn	0 Tage	Fre 01.04.33	Fre 01.04.33	
177	Bauausführung	131 Tage	Fre 01.04.33	Fre 30.09.33	AN Bau
178	Nachfolgende Maßnahmen (Kleingärten herstellen)	130 Tage	Mon 03.10.33	Fre 31.03.34	AN Bau
179	**Feldstraße (FE)**	**2087 Tage**	**Fre 01.01.27**	**Mon 01.01.35**	
180	Planungsbeginn	0 Tage	Fre 01.01.27	Fre 01.01.27	
181	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
182	Erstellung vertiefte Kostenschätzung	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
183	Technische Prüfung vertiefte KoSch	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
184	Übergabe vertiefte KoSch an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
185	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
186	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
187	Entwurfsplanung (LPH 3)	260 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.03.29	Planer Lph 1-4
188	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 02.04.29	Fre 29.06.29	Planer Lph 1-4
189	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 02.07.29	Fre 28.09.29	HHA
190	Übergabe BuK an BVM	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
191	Prüfung Förderantrag	63 Tage	Mon 01.10.29	Mit 26.12.29	BVM
192	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	BVM
193	Genehmigungsplanung (Lph 4)	153 Tage	Mon 02.07.29	Mit 30.01.30	Planer Lph 1-4
194	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	HHA
195	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Fre 01.02.30	Don 31.07.31	BWI & TAB
196	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Don 31.07.31	Don 31.07.31	BWI & TAB
197	Ausführungsplanung (Lph 5)	651 Tage	Mon 04.02.30	Mon 02.08.32	Planer Lph 5-9
198	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	131 Tage	Die 03.08.32	Die 01.02.33	Planer Lph 5-9
199	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mit 02.02.33	Die 02.08.33	Planer Lph 5-9
200	Vorbereitende Leitungsverlegung	260 Tage	Die 03.08.32	Mon 01.08.33	Leitungsträger
201	Vorbereitung Baubeginn	65 Tage	Mit 03.08.33	Die 01.11.33	AN Bau
202	Baubeginn	0 Tage	Die 01.11.33	Die 01.11.33	
203	Bauausführung	304 Tage	Mit 02.11.33	Mon 01.01.35	AN Bau
204	**St.Pauli (PA)**	**2087 Tage**	**Fre 01.01.27**	**Mon 01.01.35**	
205	Planungsbeginn	0 Tage	Fre 01.01.27	Fre 01.01.27	
206	Grundlagenermittlung+Vorplanung (Lph 1+2)	261 Tage	Fre 01.01.27	Fre 31.12.27	Planer Lph 1-4
207	Erstellung vertiefte Kostenschätzung	65 Tage	Mon 03.01.28	Fre 31.03.28	Planer Lph 1-4
208	Technische Prüfung vertiefte KoSch	65 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.06.28	HHA
209	Übergabe vertiefte KoSch an BVM	0 Tage	Fre 30.06.28	Fre 30.06.28	HHA
210	Zuarbeit bei Erstellung Drucksache	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	HHA
211	Abstimmung und Herbeiführung Beschluss Drucksache	130 Tage	Mon 03.07.28	Fre 29.12.28	BVM
212	Entwurfsplanung (Lph 3)	260 Tage	Mon 03.04.28	Fre 30.03.29	Planer Lph 1-4
213	Erstellung BuK	65 Tage	Mon 02.04.29	Fre 29.06.29	Planer Lph 1-4
214	Technische Prüfung BuK	65 Tage	Mon 02.07.29	Fre 28.09.29	HHA
215	Übergabe BuK an BVM	0 Tage	Mon 01.10.29	Mon 01.10.29	HHA
216	Prüfung Förderantrag	63 Tage	Mon 01.10.29	Mit 26.12.29	BVM
217	Zuwendungsbescheid Lph 5-9	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	BVM
218	Genehmigungsplanung (Lph 4)	153 Tage	Mon 02.07.29	Mit 30.01.30	Planer Lph 1-4
219	Genehmigungsantrag	0 Tage	Fre 01.02.30	Fre 01.02.30	HHA
220	Behördliche Prüfung Genehmigungsantrag	390 Tage	Fre 01.02.30	Don 31.07.31	BWI & TAB
221	Genehmigungsbescheid	0 Tage	Don 31.07.31	Don 31.07.31	BWI & TAB
222	Ausführungsplanung (Lph 5)	651 Tage	Mon 04.02.30	Mon 02.08.32	Planer Lph 5-9
223	Vorbereitung Vergabe (Lph 6)	131 Tage	Die 03.08.32	Die 01.02.33	Planer Lph 5-9
224	Ausschreibung und Vergabe (Lph 7)	130 Tage	Mit 02.02.33	Die 02.08.33	Planer Lph 5-9
225	Vorbereitende Leitungsverlegung	260 Tage	Die 03.08.32	Mon 01.08.33	Leitungsträger
226	Vorbereitung Baubeginn	65 Tage	Mit 03.08.33	Die 01.11.33	AN Bau
227	Baubeginn	0 Tage	Die 01.11.33	Die 01.11.33	
228	Bauausführung	304 Tage	Mit 02.11.33	Mon 01.01.35	AN Bau

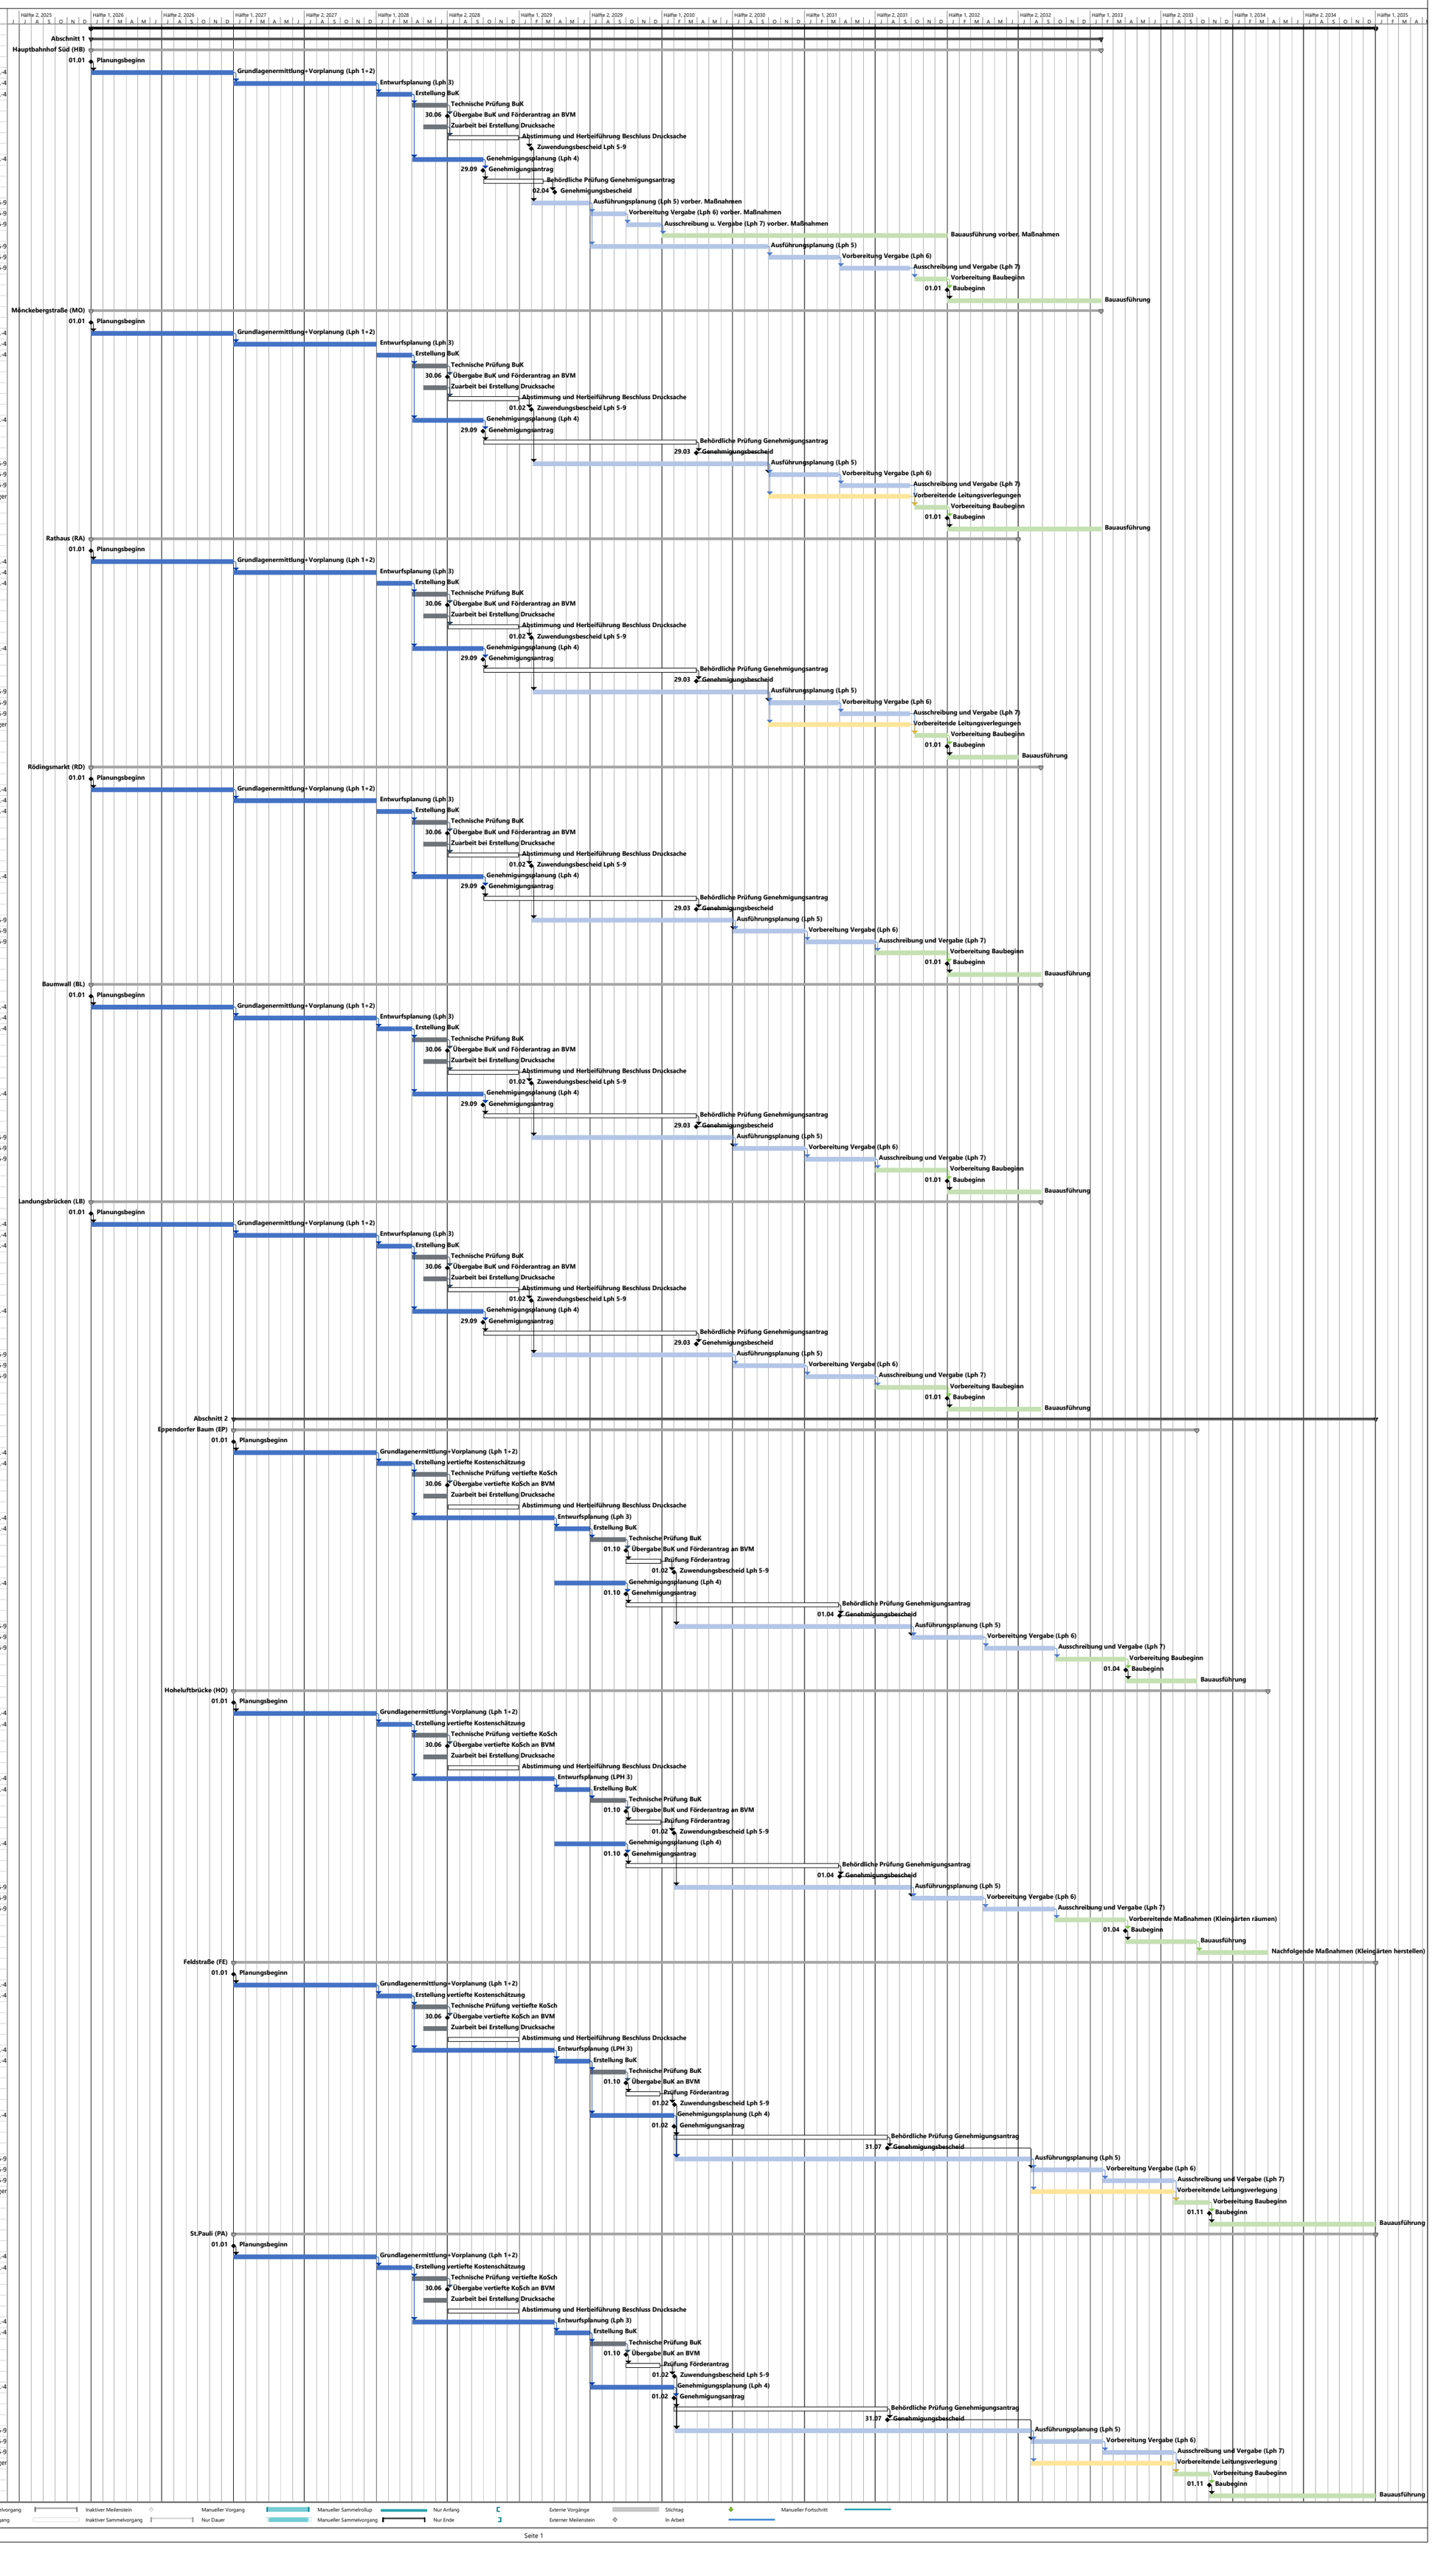

Datum: 29.04.2025
bearbeitet: A.Heecks, TB3

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
